

9/24-49

New Construction of Village Khola Dungri Motor Road from km 6.00

Dimmer Sumalta motor road.

S.No.	Material Received From hill side cutting $\frac{1}{2} \times (2225 \times 5.95 \times 3.00)$	19858.12	Cum
	40 % for swell factor	7943.25	Cum
	Total	27801.37	Cum

Disposal and Use of Material

1	R.R stone Masonary laid in 1:5/1:6	1950.00	Cum
2	R.R stone Masonary laid in Dry	6267.00	Cum
3	Hand packed stone filling	2900.00	Cum
4	Construction of wire crate	3600.00	Cum
5	Construction of parapet	1750.00	Cum
6	Construction of scupper	933.00	Cum
7	Construction of coolie walling	1335.00	Cum
8	Ganular Sub base /base/surface	3930.37	Cum
9	Total used	22698.37	Cum
10	Material Disposal by cartage in dumping yard	5103.00	Cum

Location and Quantity of Dabries Disposal

S.No.	Location of dumping yard	Size of Dumping yard	Type of Land	Capacity of dumping yard (cum)
1	9/9 - 9/10	21x9x9	Civil Land	1701.00 cum
2	9/17 - 9/18	21x9x9	Civil Land	1701.00 cum
3	1/12 - 1/13	21x9x9	Civil Land	1701.00 cum
			Total	

Summary of debris disposal

S.No.	Total Debris	Material disposed by cartage	reused material for road construction	Total disposal in dumping zone	Balance debris
1	27801.37	5103.00	22698.37 cum	5103.00	NIL

J.E.


A.E.

E.E.

वन क्षेत्राधिकारी
नन्दप्रयाग रेंज
बद्रीनाथ वन प्रभाग गौरीश्वर

प्रभागीय वन अधिकारी
बद्रीनाथ वन प्रभाग
गौरीश्वर

नोट:- जलपट्ट पानी के बिस्तरानुसार क्षेत्रफल प्रमाण के अनुसार प्रथम योजना में डिमांड
 समुच्चय मोठमारी के बिस्तर 0.00 से ग्राम कोलांडुंगी तक मोठमारी के नल बिस्तर
 है 0.805 है 0 सिविल ग्राफिक्स एवं मल डिस्पोजल है 0.056 है 0 कुल
 0.861 है 0 सिविल ग्राफिक्स का लो 0 नि 0 वि 0 का दूना सारा प्रस्ताव।
 लो 0 - 2.225 किता 0।

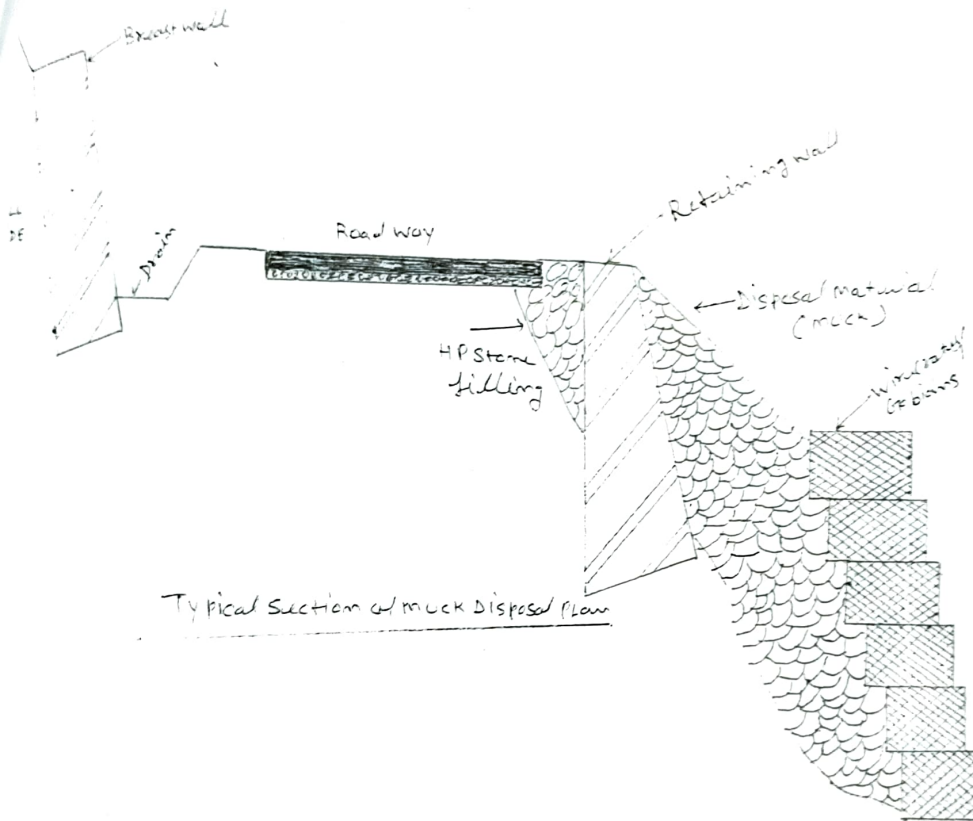

A
 JB

सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
 गौघर

अधिकारी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो 0 नि 0 वि 0
 गौघर

कार्य का नाम - डिमल-सुतलया मोठारग के कि सी 6.00 से ग्राम कौलाडुंगी तक मोठारग का ख-विन
 MUCK-Dumping point



Km 1.00
 9-10



Km 1.00
 17-18



Km 2.00
 12-13

A
 JB.

पहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० वि०

अभिमान अभियन्ता
 वन क्षेत्राधिकार निर्माण खण्ड लो० वि०
 नन्दप्रकाश
 बद्रिनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर

भागीय वनाधिकारी
 बद्रिनाथ वन प्रभाग
 गोपेश्वर

कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण कार्य हेतु



Co-ordinates of Alternate Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 16' 27.62" E	30° 13' 52.21" N
2	79° 16' 20.59" E	30° 13' 55.31" N
3	79° 16' 14.37" E	30° 13' 56.77" N
4	79° 16' 4.38" E	30° 13' 57.62" N
5	79° 16' 14.35" E	30° 13' 58.42" N
6	79° 16' 24.59" E	30° 13' 57.81" N
7	79° 16' 34.42" E	30° 13' 58.55" N
8	79° 16' 36.67" E	30° 14' 4.66" N
9	79° 16' 28.45" E	30° 14' 5.01" N
10	79° 16' 23.44" E	30° 14' 9.12" N
11	79° 16' 28.33" E	30° 14' 14.9" N
12	79° 16' 36.97" E	30° 14' 13.58" N

Co-ordinates of Proposed Road		
Id	Longitude	Latitude
1	79° 16' 27.62" E	30° 13' 52.21" N
2	79° 16' 18.96" E	30° 13' 54.83" N
3	79° 16' 12.68" E	30° 13' 56.5" N
4	79° 16' 3.29" E	30° 13' 58.92" N
5	79° 16' 11.89" E	30° 14' 1.75" N
6	79° 16' 18.22" E	30° 14' 0.71" N
7	79° 16' 22.86" E	30° 14' 3.75" N
8	79° 16' 21.28" E	30° 14' 10.69" N
9	79° 16' 25.85" E	30° 14' 15.37" N
10	79° 16' 33.19" E	30° 14' 15.99" N
11	79° 16' 37.13" E	30° 14' 13.73" N



Stia

अध्यासि अभियन्ता

निर्माण खण्ड लो०नि०वि०

गौचर

Prepared by: ITGC, PCCF Office, Dehradun

परियोजना का नाम:-

जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत राज्य योजना में डिम्बर-सुमल्टा मोटर मार्ग के कि०मी० 6 से ग्राम कोलाडुंग्री तक मोटर मार्ग के नवनिर्माण हेतु 0.805 है० सिविल भूमि एवं मक डिस्पोजल हेतु 0.056 है० कुल 0.861 है० सिविल भूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

प्रमाणित किया जाता है कि प्रस्तावित परियोजना के निर्माण में, अधिशासी अभियन्ता, निर्माण खण्ड, लो०नि०वि० गौचर के द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा संतोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गई।


वन सहायिका
वन सहायिका
न. १. १ रेंज
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


प्रमाणित वन अधिकारी
बदीनाथ वन प्रभाग
गोपेश्वर वन अधिकारी
