

Name Of Work- Construction for Patal
Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki
Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road.
(Length 9.300 Km)

Muck Disposal Plan

संजय वर्मा

5-8-21

सहायक अभियन्ता

ओ० ए० ए० नि० वि०

देरीनाथ (पिपरीरागढ़)

5-8-21

बी० के० सिन्हा

5-8-2021

अभिजातो अभियन्ता

अल्पाई ब्रह्म, लोह निर्माण विभाग

देरीनाथ (पिपरीरागढ़)

Summary of Muck Disposal Plan

Name of Work -

Construction for Patal Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road.
(Length 9.300 Km)

- 1 - The Material received from Hill Side cutting
- 2- The use of received muck in various items of road construction work.
- 3- The Remaining muck for Dumping.
- 4- Number of site needed for disposal of muck.
- 5- Carrying capacity of site with latitude & longitude
- 6- Land required For muck Disposal (Naap Land)

संजय वर्मा

5-8-21

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

बी० के० सिन्हा

5-8-21

अधिरासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
बेरीनाग, (पिथौरागढ़)

Construction for Patal Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road. (Length 9.300 Km)

Calculation For Quantity of Muck Disposal

	Particulars	No	No	Length (M)	Width (M)	A.V. Depth/height (M)	Qty (Cum)	Unit
(A)	Muck obtained from Hill side cutting	1	x 1/2	9300.00	6.00	3.50	97650.00	cum.
(B)	Muck used in Construction work					Total (A)	97650.00	cum.
1	Retaining Wall	1	x 1	300.00	(1.93+0.60)/2	4.00	1518.00	cum.
2	Breast wall	1	x 1	250.00	(0.90+0.60)/2	1.80	337.50	cum.
3	Construction of Culvert							
i	Kharanja Bolder Stone	1	x 63	7.00	3.50	0.20	308.70	cum.
ii	Abutment	2	x 63	7.00	(1.50+0.60)/2	1.80	1666.98	cum.
iii	HP Stone filling in Culvert	2	x 63	7.00	(1.50+0.60)/2	2.50	2315.25	cum.
4	HP Stone filling in Retaining wall	1	x 1/2	300.00	1.50	3.00	675.00	cum.
5	W.B.M (G1,G2,G3,)	1	x 1	9300.00	4.05	0.25	9416.25	cum.
6	Construction of Subgrade	1	x 1	9300.00	6.00	0.35	19530.00	cum.
7	Construction of Shoulder	1	x 2	9300.00	1.50	0.25	6975.00	cum.
8	Construction of retaining wall by Stone filled in Wirecrates for Dumping yards	8	x 230	3.00	1.50	1.50	12420.00	cum.
						Total (B)	53307.18	cum.
	<u>Balance Quantity</u> this is the total quantity of muck to be disposed what has been obtained from Hill side cutting. This is equal to 57.54% of the total muck obtained from hill side cutting					(A-B)	44342.82	cum.
	Quantity of muck to be disposed in dumping yards taking into consideration of swelling by 25%					$1.25 \times (A-B) = 1.25 (44342.82)$	55428.53	

S.no.	Total Muck obtained from Hill side cutting (for 9.300 KM)	Muck to be disposed by cartage in to dumping yards	Material used for road construction	
1	97650.00	55428.53	53307.18	

प्रजाजोशी

संजय वर्मा

बी.के.सिंह

5-8-21

5-8-2021

5-8-2021

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
देरीनाग

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
देरीनाग (निधीकरण)

अधिसारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
देरीनाग (निधीकरण)

Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneswar, Dau Nanishita, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)

Location of Dumping Yard	Size of Dumping Yard 2/3 X L X B X H			Type of Land	Capacity of dumping Yard	Name of Land owner and village	Land in Hectare	Land/Area Being used for dumping (sqm.)	Longitude	Latitude
	L	B	H							
KM 0 HM 6-8	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'35.971" N	80°6'21.535" E
KM 1 HM 2-4	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'39.923" N	80°6'11.581" E
KM 4 HM 0-2	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'41.978" N	80°5'8.859" E
KM 5 HM 8-10	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'45.761" N	80°5'48.777" E
KM 6 HM 3-10	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'57.062" N	80°5'46.686" E
KM 9 HM 2-4	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'49.917" N	80°6'35.800" E
KM 7 HM 8-10	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'57.495" N	80°6'24.957" E
KM 8 HM 4-6	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'55.937" N	80°5'14.304" E
KM 8 HM 5-10	23	60	6	Nap	5520.00	Attached	0.1380	1380	29°41'55.411" N	80°5'2.030" E
KM 9 HM 2-4	24	60	6	Nap	5760.00	Attached	0.144	1440	29°41'13.488" N	80°5'0.805" E
				Total	55440.00		1.386	13860.00		

Note- The Muck obtained from hill side cutting is disposed in valley side of the road. The cross section area of the deposited muck acquires more or less a shape of concave parabola. Therefore a factor of 2/3 has been applied for the purpose of calculation of concave parabolic area.

पूजा जीर्णी
5-8-2021
कनिष्ठ अभियन्ता
अरुणार्द्र खण्ड
वेरीनाग

सुजय वर्मा
5-8-2021
सहायक अभियन्ता
अरुणार्द्र खण्ड
वेरीनाग

वीरेंद्र सिंह
5-8-2021
अधिसारी अभियन्ता
अरुणार्द्र खण्ड
वेरीनाग

प्रपत्र -

Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)

Detail of Measurement									
S.No.	Description	N0			Length	Width	H/D	Quantity	Unit
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification								
1	KM 0 HM 6-8	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
2	KM 1 HM 2-4	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
3	KM 4 HM 0-2	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
4	KM 5 HM 8-10	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
5	KM 6 HM 8-10	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
6	KM 9 HM 2-4	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
7	KM 7 HM 8-10	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
8	KM 8 HM 4-6	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
9	KM 8 HM 8-10	1	x	1	23.00	1.50	0.50	17.25	cum.
10	KM 9 HM 2-4	1	x	1	24.00	1.50	0.50	18.00	cum.
							Total	173.25	cum.

संजय वर्मा

5-8-2021

सहायक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०
वेरीनाग, (पिथौरागढ़)

जी० के० सिन्हा

5-8-2021

आध्यापक अभियन्ता
अस्थायी खण्ड लो० नि० वि०
वेरीनाग, (पिथौरागढ़)

5-8-2021

प्रपत्र - 40.20

Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)

Detail of Measurement

S.No.	Description	N0	Length	Width	H/D	Quantity	Unit
1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 10 gauge BWG						
1	KM 0 HM 6-8	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
2	KM 1 HM 2-4	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
3	KM 4 HM 0-2	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
4	KM 5 HM 8-10	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
5	KM 6 HM 8-10	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
6	KM 9 HM 2-4	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
7	KM 7 HM 8-10	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
8	KM 8 HM 4-6	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
9	KM 8 HM 8-10	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
10	KM 9 HM 2-4	1 x 32	3.00	1.50	1.50	216.00	cum.
					Total	2160.00	cum.

संजय वर्मा

5-8-2021

सहायक अभियन्ता
परचणई खण्ड लो० नि० वि०
देरीनाग, (पिथौरागढ़)

वी० के० सिन्हा

5-8-2021

अधीक्षारी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो० नि० वि०
देरीनाग, (पिथौरागढ़)

5-8-2021

प्रपत्र - 40.60

Detail of Vegetation Plantation area in muck disposal work

Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula, Nanishitia, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)

S.no.	Chainage of area	Length	Width	Land (Hectare)	Area (sqm.)	Longitude	Latitude
1	KM 0 HM 6-8	23	60	0.1380	1380	29°41'35.971" N	80°6'21.535" E
2	KM 1 HM 2-4	23	60	0.1380	1380	29°41'39.923" N	80°6'11.581" E
3	KM 4 HM 0-2	23	60	0.1380	1380	29°41'41.978" N	80°5'8.859" E
4	KM 5 HM 8-10	23	60	0.1380	1380	29°41'45.761" N	80°5'48.777" E
5	KM 6 HM 8-10	23	60	0.1380	1380	29°41'57.062" N	80°5'46.686" E
6	KM 9 HM 2-4	23	60	0.1380	1380	29°41'49.917" N	80°6'35.800" E
7	KM 7 HM 8-10	23	60	0.1380	1380	29°41'57.495" N	80°6'24.957" E
8	KM 8 HM 4-6	23	60	0.1380	1380	29°41'55.937" N	80°5'14.304" E
9	KM 8 HM 8-10	23	60	0.1380	1380	29°41'55.411" N	80°5'2.030" E
10	KM 9 HM 2-4	24	60	0.1440	1440	29°41'13.488" N	80°5'0.805" E
				1.3860	13860.00		

प्रजाजोशी

कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खाण्ड
वेरीनाग
5-8-2021

संजय वर्मा

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खाण्ड
वेरीनाग
5-8-2021

वी. के. सिन्हा

अधिसूची अभियन्ता
अस्थाई खाण्ड
वेरीनाग
लो. नि. वि.
(पिथौरागढ़)
5-8-2021

BILL OF QUANTITY

परियोजना का विवरण -

Construction for Patal Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road.

(Length 9.300 Km)

S.NO.	ITEMS	QTY	UNIT	RATE	AMOUNT
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	173.25 ४६	cum	396.60	68710.95 ४६
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG	2160.00	cum	1887.60	4077216.00
				Total	41,45,926.95 ४६

संजय वर्मा

5-8-2021

नी.के. सिन्हा

5-8-2021

आदेशाती अभियंता
अस्थाई सड़क लो. नि. वि.
देहरादून, (पिथौरागढ़)

5-8-2021

अस्थाई सड़क लो. नि. वि.
देहरादून, (पिथौरागढ़)

Certificate of Muck Disposal Plan


Name of Work –

Construction for Patal Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road. (Length 9.300 Km)

The proposed estimate has been prepared for disposal of muck for the construction of Patal Bhuvaneswar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna Motor Road (length 9.300 km). Joint Inspection of site selection of land for muck disposal has been carried on 05.06.2021. Ten places have been identified with consent of the people for private land. All these places are located near the proposed road. Toe walls made of stones in wire crates has been proposed parallel to the road to retain the dumped muck. Farmers have given No Objection Certificate for allowing their land for making dumping yards for muck disposal.


An Estimate of Rs. 46.43 Lacs has been prepared for disposing of muck obtained during the construction of Road. These work will be carried out as proposed in the instant estimate. Due considerations has been given for the construction of muck disposal plan so far environmental protection is concerned.

पूजा जोशी

 5-8-2021


कनिष्ठ अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
बेरीनाग

संजय वर्मा

 5-8-2021

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड नि० वि०
बेरीनाग (पिपरागढ़)


बी०के० सिन्हा

 5-8-21

अधिशासी, अभियन्ता
अस्थाई खण्ड
बेरीनाग (पिपरागढ़)

Name of Work :- Construction of Patal Bhuvaneswar,
Daula, Nanishilla, Simayal, Bhul ki Adhyali
Chamachaur & Chaukhura Motor Road. (length-9.300km)

TYPICAL PLAN FOR MUCK DISPOSED

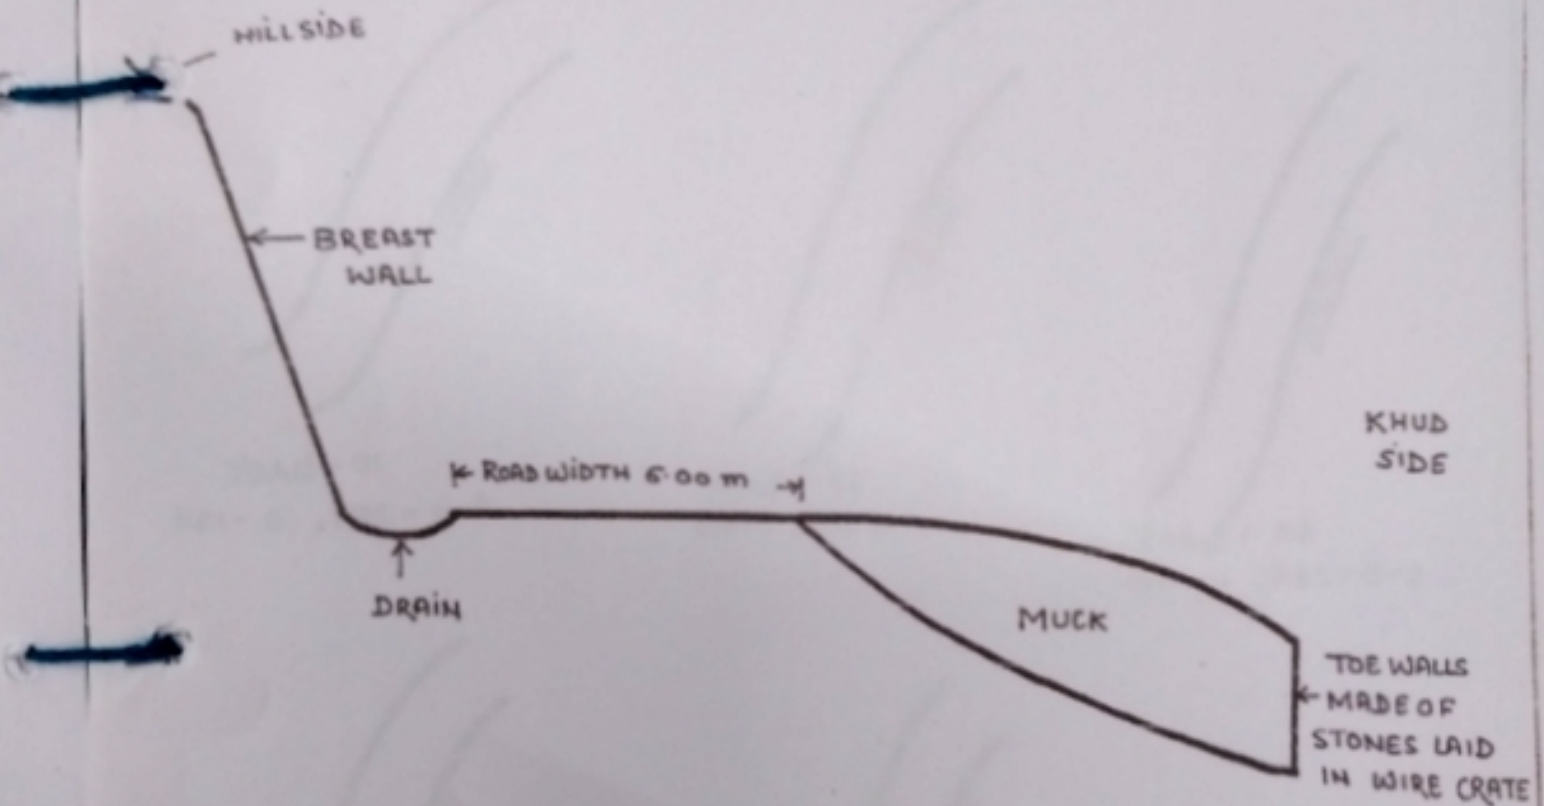

Chauhan
JE

संजय वर्मा

Chauhan 5-8-21
अधीनस्थ अधिकारी
राज्य सड़क निगम
जयपुर (राजस्थान)

वी. के. सिन्हा

Chauhan 5-8-21
अधीनस्थ अधिकारी
अस्थाई सड़क लो० नि० वि०
देरीनाग, (पिथौरागढ़)

SUMMARY OF ESTIMATED COST

Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)		
S.No.	Description of work	
1	Name of Project - Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula, Nanishitla, Simayal, Bhul ki Adhyali, Chamachaur & Chaukhuna motor Road (Length 9.300 Km)	41,45,926.95 41,45,629.50 21
	S.G.S.T. 6%	248755.61 21 248737.77
	C.G.S.T. 6%	248755.61 21 248737.77
	Total	4643438.17 21 4643105.04
	Say	46.43,

रंजय वर्मा

Assistant Engineer
Temporary Division
P.W.D. Berinag (रागढ़)
5-8-2021

वी.के. सिन्हा

Executive Engineer
Temporary Division
P.W.D. Berinag
5-8-2021

Name of Work :- Construction of Patal Bhuvaneshwar, Daula,
Narishilla, Simayal, Bhul ki Adhyali,
Chamachaur & Chaukhuna Motor Road.
Length - 9.300 Km.

TYPICAL DRAWING OF MUCK DISPOSAL YARD



Yard-01
Km-0, hec-6-8



Yard-02
Km-1, hec-2-4



Yard-03
Km-4, hec-0-2



Yard-04
Km-5, hec-8-10



Yard-05
Km-6, hec-8-10

संलग्न चर्चा
अ. 5-8-2-2।

सहायक अभियन्ता
अस्पाई खण्ड लो० नि० वि०
वेरीनाग, (पिथौरागढ़)


अ. 5-8-2-2।

ली० के० सिन्हा

अविशारी अभियन्ता
अस्पाई खण्ड लो० नि० वि०

वेरीनाग, (पिथौरागढ़)

N

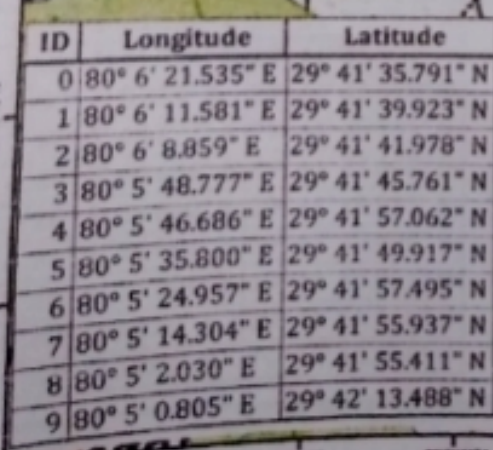


- Dumping_Zone
- Existing_Road
- Proposed_Alignment

NO. 445E	NO. 445E	NO. 445E	NO. 445E	NO. 445E
सिजपुर्नाम	सिजपुर्नाम	सिजपुर्नाम	सिजपुर्नाम	सिजपुर्नाम
25-8-21	25-8-21	25-8-21	25-8-21	25-8-21
सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता	सहायक अभियन्ता
ज० म० लो० नि० वि०	ज० म० लो० नि० वि०	ज० म० लो० नि० वि०	ज० म० लो० नि० वि०	ज० म० लो० नि० वि०
बेरीनाथ (विद्योरागड)	बेरीनाथ (विद्योरागड)	बेरीनाथ (विद्योरागड)	बेरीनाथ (विद्योरागड)	बेरीनाथ (विद्योरागड)

2019

Patal Bhuwaneswar Daula Nanishetla Shimayal bhul ki
Adhiyali Chamachaur To Chaukuna Motor Road
(Distt.Pithoragarh Dumping Area) (Length 9.300 KM)

1:16,000



End Point
80° 5' 0.374" E
29° 42' 13.950" N

ID	Longitude	Latitude
0	80° 6' 21.535" E	29° 41' 35.791" N
1	80° 6' 11.581" E	29° 41' 39.923" N
2	80° 6' 8.859" E	29° 41' 41.978" N
3	80° 5' 48.777" E	29° 41' 45.761" N
4	80° 5' 46.686" E	29° 41' 57.062" N
5	80° 5' 35.800" E	29° 41' 49.917" N
6	80° 5' 24.957" E	29° 41' 57.495" N
7	80° 5' 14.304" E	29° 41' 55.937" N
8	80° 5' 2.030" E	29° 41' 55.411" N
9	80° 5' 0.805" E	29° 42' 13.488" N

Legend

- Dumping Zone
- Existing Road
- Proposed Alignment

Start Point
80° 6' 15.165" E
29° 40' 57.208" N

अभय प्रताप सिंह

28-8-2021

उपनिर्देशक
विभाग (पिथौरागढ़)

विनय कुमार
भारतीय
पुर्वांगीकृत विभागाध्यक्ष
विभाग (पिथौरागढ़)

25-9-2021

हिमालय ज्योती
26-8-21
25-8-21

संजय शर्मा
26-8-21
राज्य सरकार
पिथौरागढ़

5-9-21
पिथौरागढ़
विभाग (पिथौरागढ़)

~~पाताल मुने श्वर पैला नाकी शीतला सिमायल भूल की अहयाली-चाभा-चोड़~~

-पोरुनुगा मेट्टर मार्ग लम्बाई 9.300 किमी

अक्षिपत मुनि पर भक्त्या निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का मन्त्राल
अनामति प्रमाण-पत्र

ये निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/भक्त विस्थापित हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि सही भूमि अधिनियम की जाते है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय तहसील पर अपनी भूमि सहाय देने को तैयार हूँ।

नाम ① प्रिलोक सिंह ५० शेर सिंह

पाठ्य मन्त्रार्थः

② ज्ञान सिंह ए० श्रीराम सिंह

③ एयाव सिंह S/o भोम सिंह

कास संवर्धन

पर प्रस्तावित मक डिस्ट्रिक्शन हेतु

काशतकार श्री तिलोक सिंह, दान सिंह, ह्यात सिंह पुत्र श्री बोक सिंह, भीम सिंह, भीक सिंह

ग्राम सन्तार गौ व

पदटवारी वृत्ता भुबनेश्वर

जिला _____

पिथीरागढ़ से ज्ञान भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क्र०सं०	खाता / खसरा नम्बर	गुंमि (है)
1	07	0.138 है.
2	06	0.138 है.
3	06	0.138 है.

दीपचन्द्र पाण्डे

ਸਟੇਸ਼ਨ ਚਲਾਓ ਪਾਠਕ

साधुसुखसिद्धिनिबन्धना

असहयोगी असंख्योद्भवः

येरीमाहूरीचाय (चिन्हीचाय)

10/6/2015

वर्गसेत्राधिकारी

४. वेदीन्यायः

$$16 \overline{) 715}$$

राजस्व उप निरीक्षक १००

क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक

जनपद-पिथौरागढ़

सुशील कुमार

नोट- 1.मलया निस्तारण स्थल पर वृक्षारोपण का प्रवर्धन एवं मलया निस्तारण स्थान को संवर्धित प्रभागीय समन्विकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

2. मलबा निस्तारण स्वर्णों का अगर वास्तविक मित्र भी लगायें जायें तो श्रेयकर होगा।

3. अगर पूर्ण उत्तराधिकार होने वाले मलका का उपयोग परिवर्तन रचना पर ही होता है तो भी पूर्ण उत्तराधिकार अंकलन देना होगा।

Final
4-4-8

इन्द्रसिंहनारायण

15-7-15

रबीग सिंह बिष्ट

20-7-15

PG 20-7-2015

गाताल मुन्नेश्वर दोलाना नीग्रिलो रिमागल मुलकी उरहाली चामाचोई

पोरुना मोहर मार्ग लखार्द 9.300 बि.मी.

व्यक्तिगत भूमि पर मलबा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का मासल
अनापत्ति प्रमाण-पत्र

को निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसी प्रयोजन हेतु यदि मेरी
भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दलों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को
तैयार हूँ।

नाम ① खडक सिंह, ② गोविंद सिंह
पत्नी रिमागल
③ गिरिश लाल

कास सेवशन पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
काशतकार श्री ① खडक सिंह ② गोविंद सिंह पुत्र श्री ③ लक्ष्म सिंह ④ मोहन सिंह
③ देव लाल पत्नी रिमागल पट्टवारी मूल भुवनेश्वर जिला
पिछौरागढ़ जो ग्राम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क्र.सं०	खाला/खसरा नम्बर	भूमि (है०)
1	18	0.138 है.
2	16	0.138 है.
3	04	0.138 है.

दीपचन्द्र पाण्डे
10-6-15
सहायक निरीक्षक
असल जमाद जोडि
वेरीनाग

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
जनपद-पिछौरागढ़

नोट- 1. मलबा निस्तारण स्थल पर वृक्षारोपण का प्रकलन एवं मलबा निस्तारण प्लान को संबंधित
प्रमाणीय वनधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
2. मलबा निस्तारण स्थानों का अगर वास्तविक चित्र भी लगाये जायें तो श्रेयकर होगा।
3. अगर पूर्ण उत्सर्जित होने वाले मलबा का उपयोग परियोजना स्थल पर ही होगा है तो भी पूर्ण
आकलन देना होगा।

सुशील कुमार
30/7/15
निरीक्षक
पिछौरागढ़

इन्द्र सिंह बोरा
15-7-15
निरीक्षक
पिछौरागढ़

प्रमाणपत्र पाण्डे
12-6-2015
16-7-15
वनक्षेत्राधिकारी
वेरीनाग

हेमन्त बर्मा
20/7/15
निरीक्षक
पिछौरागढ़
रहीम सिंह बिष्ट
20/7/2015

घाताल भुक्तेश्वर दोला नानी शीतला दिगायल भूल की अहपाली चामा चौड

चौरनुना मोटर मार्ग लम्बाई 9.300 किमी

व्यक्तिगत भूमि पर मलबा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का मासुल
अनुपस्थित प्रमाण-पत्र

के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी
भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को
तैयार हूँ।

नाम ① जिलोक सिंह S/o गणेश सिंह

ग्राम नानी शीतला

② दिवान सिंह S/o गणेश सिंह

③ हीरा सिंह S/o बसन्त सिंह

कास सेवक

पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु

कासतकार श्री जिलोक सिंह, दिवान सिंह, हीरा सिंह पुत्र श्री गणेश सिंह, गणेश सिंह, बसन्त सिंह

ग्राम नानी शीतला

पट्टवारी वृत्त

भुवनेश्वर

जिला

पिथौरागढ़ के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है-

क्र.सं.	खाला / खसरा नम्बर	भूमि (है.)
1	19	0.138 8.
2	07	0.138 8.
3	20	0.138 8.

दीप चन्द पारडे

18-6-15
राजस्थान अभिदेता
अस्थायी ज.प. ल.प. वि.प. वि.
वेरीनाग (पिथौरागढ़)

कामेश्वरी

ग्राम पचास भुवनेश्वर

कि.सं. 131612013
वेरीनाग (पिथौरागढ़)

राजस्थान उप निरीक्षक एड

क्षेत्र राजस्थान उप निरीक्षक सुशील कुमार

जनपद-पिथौरागढ़

13/7/15

पिथौरागढ़

नोट- 1. मलबा निस्तारण स्थल पर वृक्षारोपण का प्रकलन एवं मलबा निस्तारण प्लान को संकेतित
प्रमाणीय वनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।

2. मलबा निस्तारण स्थानों का अगर वास्तविक चित्र भी लगाये जायें तो श्रेयकर होगा।

3. अगर पूर्ण उत्सर्जित होने वाले मलबा का उपयोग परियोजना स्थल पर ही होना है तो भी पूर्ण
आकलन देना होगा।

सु. सिंह बोर

15/7/15
पिथौरागढ़

हेमन्त वर्मा

जिलाधिकारी
वेरीनाग

16/7/15

महेश चन्द पाण्डे

16/7/15
जनसेवाधिकारी
वेरीनाग

केदार सिंह

सरपंच

वन पंचायत

नानी शीतला प्रोवा

13/7/15

पिथौरागढ़

पिथौरागढ़

पाताल मुक्तेश्वर दोला मानी इतिहासिमायल मूल की उदयाली चामाचौड़
 -चौदुना मोटर मार्ग लम्बाई 9.300 किमी

अतिरिक्त भूमि पर मलबा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का मसल
 अनापत्ति प्रमाण-पत्र

के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि बेसी
 भूमि अर्जित की जाती है तो कुछ कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दफ्तों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को
 तैयार हूँ।

नाम गंगा सिंह
 ग्राम चामाचौड़

कास सेवक गंगा सिंह पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु
 कासतकार श्री गंगा सिंह पुत्र श्री बन्नी सिंह
 ग्राम चामाचौड़ पटवारी कृत हुंमरी मन्त जिला
 पिथौरागढ़ के नाम भूमि विवरण निम्नप्रकार है-

क्र.सं.	खाला/खसरा नम्बर	भूमि (है.)
1	05	0. 144 8.

दीप चन्द पाण्डे

सहायक निरीक्षक
 जल संयंत्र, पिथौरागढ़
 वेरीनाग

हेमन्त देवी
 राज ईपायक-पामा (मनी)
 वेरीनाग (पिथौरागढ़)
 13/6/15

राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
 जनपद-पिथौरागढ़

सुशील कुमार

नोट- 1. मलबा निस्तारण स्थल पर मृदाशोधन एवं मलबा निस्तारण प्लान को संबंधित
 प्रभागीय दनाधिकारी द्वारा स्वीकृत कराया जाना आवश्यक होगा।
 2. मलबा निस्तारण स्थानों का अगर वास्तविक चित्र भी लगाये जायें तो श्रेयकर होगा।
 3. अगर पूर्ण उत्सर्जित होने वाले मलबा का उपयोग परियोजना स्थल पर ही होना है तो भी पूर्ण
 आकलन देना होगा।

इन्द्र सिंह बौर
 15/7/15

हेमन्त देवी

हेमन्त देवी
 राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
 जनपद-पिथौरागढ़
 20/7/15

सुशील कुमार
 राजस्व उप निरीक्षक
 क्षेत्र राजस्व उप निरीक्षक
 जनपद-पिथौरागढ़
 20/7/15

विकास अधिकारी
 वेरीनाग

विकास अधिकारी
 वेरीनाग

विकास अधिकारी
 वेरीनाग
 20/7/15
