

2.19

(45)

MUCK DISPOSAL PLAN

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of **Karnatak Khola To Railapali To Sarkar ki Aali To Vikash Bhawan Motor Road under State Sector** .Muck Disposal Annexure-I
2. Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure-II


सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोडा।



अधिशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोडा।



परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण का कार्य लम्बाई 3.00 कि०मी०

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।




सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।


अधिशारी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०,
अल्मोड़ा।

ANNEXURE-I

48

2.19C

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण का कार्य लम्बाई 3.00 कि०मी०

Sl. No.	Material Received from hill side cutting 1/2(3000x5.95x2.00)	17850.00	cum.
	40% for swell factor	7140.00	cum.
	Total -	24990.00	cum.
Disposal and use of material			
1	Retaining walls- 1x3x450(1.27+0.60)/2x2.3	2903.18	cum.
2	Breast walls- 1x3x250(0.90+0.60)/2x1.80	1012.50	cum.
3	H.P. filling - 1x3x1/2x450x1x3	2025.00	cum.
4	Const. of Scupper - 1x3*8x8x37.09	7121.28	cum.
5	Soling work - 1x3x1000x4.05x0.12	145.80	cum.
6	Const. of pucca drain- 1x3.8x450x0.60x0.60	615.60	cum.
7	wirecreat - 1x3x30x6.75	607.50	cum.
	Total used	14430.86	cum.
	Material disposal by carrage in dumping yard	10559.15	cum.

Location and Quantity of Dabris Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (cum)
Km. 1 (Hm.0-2)	50X19X4.5	Nap Land	4750.00
Km. 2 (Hm.0-2)	50X10.20X5.5	Nap Land	2805.00
Km. 3 (Hm.0-2)	50X11.4X5.5	Nap Land	3135.00
	Total -		10690.00

Location and Quantity of Dabris Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabris
1	24990.00	10559.15	14430.86	10559.15	-

J..E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

ANNEXURE-IIDetails of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

S.No.	Chanage	Name of Land Owner & Village	Land in Hac.	Land in Sqm.	Land area being used to dumping yard (Sqm.)	Longitude	Latitude
1	Km. 1 (Hm.0-2)	Govt. Land	0.0950	950.00	950.00	79°39'35.26"E	79°39'37.68"E
2	Km. 2 (Hm.0-2)	Nap Land	0.0570	570.00	570.00	29°36'26.65"N	79°39'35.26"E
3	Km. 3 (Hm.0-2)	Govt. Land	0.0600	600.00	600.00	29°36'16.52"N	79°39'23.39"E
		Total -	0.212	2120.0	2120.0		
					0.327 Hec.		

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- जनपद अल्मोड़ा के विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण का कार्य लम्बाई 3.00 कि०मी०

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल- 0.203 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल x 2000 पौध) - 406 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.203 है०	97.00	19.69
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.203 है०	584.00	118.55
3	कुली दीवार बन्दी (फनिसंग)	0.203 है०	26460.00	5371.38
4	गद्दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	406 गद्दा	7.33	2975.98
5	डी०ए०पी० खाद की लागत (50 ग्राम प्रति गद्दा)	20.30 किग्रा०	19.00	385.70
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	0.203 है०	485.00	98.46
7	पौधों का मूल्य	406 पौध	5.89	2391.34
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	वानरपतिक/स्टोन चैकडैम	0.203 है०	7750.00	1573.25
	वाटर हावेस्टिंग टैंक			
	अन्य कार्य	406 पौध	808.00	328048.00
	योग प्रथम चरण -			340982.35

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.203 है०		
2	गद्दा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	406 गद्दा	1.15	466.90
3	पौध दुलान कार्य	406 पौध	6.39	2594.34
4	पौधारोपण व थैलाबन्दी	406 पौध	2.06	836.36
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	406 पौध	0.76	308.56
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	406 पौध	1.15	466.90
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	406 पौध	1.15	466.90
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.203 है०	4768.00	725.93
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.203 है०	0.21	0.04
	घास-पूस हटाना	0.203 है०	350.00	71.05
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.203 है०	225.00	45.68
	प्रचार प्रसार	0.203 है०	400.00	81.20
	प्रोत्साहन	0.203 है०	200.00	40.60
10	अन्य कार्य	406 पौध	150.00	60900.00
	योग द्वितीय चरण -			67004.46
	योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -			407986.80

51

2.1912

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0

1	पौध की लागत	406	पौध	5.50	2233.00
2	पौध ढुलान कार्य	406	पौध	6.00	2436.00
3	पुनः गढ़दे खोदना एवं रोपण कार्य	406	पौध	3.20	1299.20
4	गढ़दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	406	पौध	1.31	531.86
5	पौधों की शीतकालीन मल्लिंग	406	पौध	1.11	450.66
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.203	है0	468.00	1140.05
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.203	है0	310.00	62.93
योग तृतीय चरण -					8153.70

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु0)	योग
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह		600.00	18000.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		1000.00	1000.00
योग चतुर्थ चरण -				19000.00

पंचम चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह		600.00	18000.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य		1000.00	1000.00
योग पंचम चरण -				19000.00

षष्ठम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.203	है0	3000.00	7308.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.203	है0	1000.00	203.00
योग षष्ठम चरण -					7511.00

सप्तम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.203	है0	3000.00	7308.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.203	है0	1000.00	203.00
योग सप्तम चरण -					7511.00

अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.203	है0	3000.00	7308.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.203	है0	1000.00	203.00
योग अष्टम चरण -					7511.00

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.203	है0	3000.00	7308.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.203	है0	1000.00	1000.00
योग नवम चरण -					8308.00

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.203	है0	3000.00	7308.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.203	है0	1000.00	1000.00

योग दशम चरण -			8308.00
कुल धनराशि		प्रथम चरण	340982.35
		द्वितीय चरण	67004.46
		तृतीय चरण	8153.70
		चतुर्थ चरण	19000.00
		पंचम चरण	19000.00
		षष्ठम चरण	7511.00
		सप्तम चरण	7511.00
		अष्टम चरण	7511.00
		नवम चरण	8308.00
		दशम चरण	8308.00
		कुल योग-	493289.50
		या	493289.00

ABP
JR

(दीपक कुमार पन्त)
उप वन क्षेत्र अधिकारी,
अनुभाग- नरमोडा
वन क्षेत्र- अल्मोड़ा

(S. Mun)
वन क्षेत्र अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

Mahat
प्रभाग वन अधिकारी,
अल्मोड़ा वन प्रभाग, अल्मोड़ा

60
उप वन क्षेत्र अधिकारी
अल्मोड़ा वन क्षेत्र अल्मोड़ा

अनापत्ति प्रमाण पत्र

53

2.19.11

जनपद अल्मोड़ा में विधानसभा क्षेत्र अल्मोड़ा के अन्तर्गत कर्नाटक खोला से रैलापाली एवं सरकार की आली को जोड़ते हुए विकास भवन तक सड़क निर्माण कार्य लम्बाई 3.00 के निर्माण हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

भवदीय

नाम-(देवेन्द्र प्रसाद कर्नाटक)

ग्राम-मोहल्ला कर्नाटक, खोला अल्मोड़ा

किलोमीटर पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री देवेन्द्र प्रसाद कर्नाटक पुत्र श्री स्व. देवकी नन्दन कर्नाटक ग्राम कर्नाटक खोला राजस्व उपनिरीक्षक क्षेत्र बरामाडल अल्मोड़ा जिला अल्मोड़ा के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है।

क्रम सं०	खाता	खसरा नं०	भूमि का क्षेत्रफल
1.	7612	1374 फ.	0.0230 हे.
2.	7751	1374 फ.	0.0240 हे.
3.	10750	1374 फ.	0.0100 हे.
1	369	7612	0.023 हे.
2	369	7751	0.024 हे.
3	369	10750	0.010 हे.
	योग		0.057 हे.

Blawet
राजस्व उपनिरीक्षक
अ.प्र. सड़क
बड़ौला, जिला-अल्मोड़ा

महानगर अभियन्ता,

जननीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा,

अविशाली अभियन्ता;

जननीय खण्ड, लो० नि० वि०
अल्मोड़ा,

राजस्व उपनिरीक्षक
अल्मोड़ा

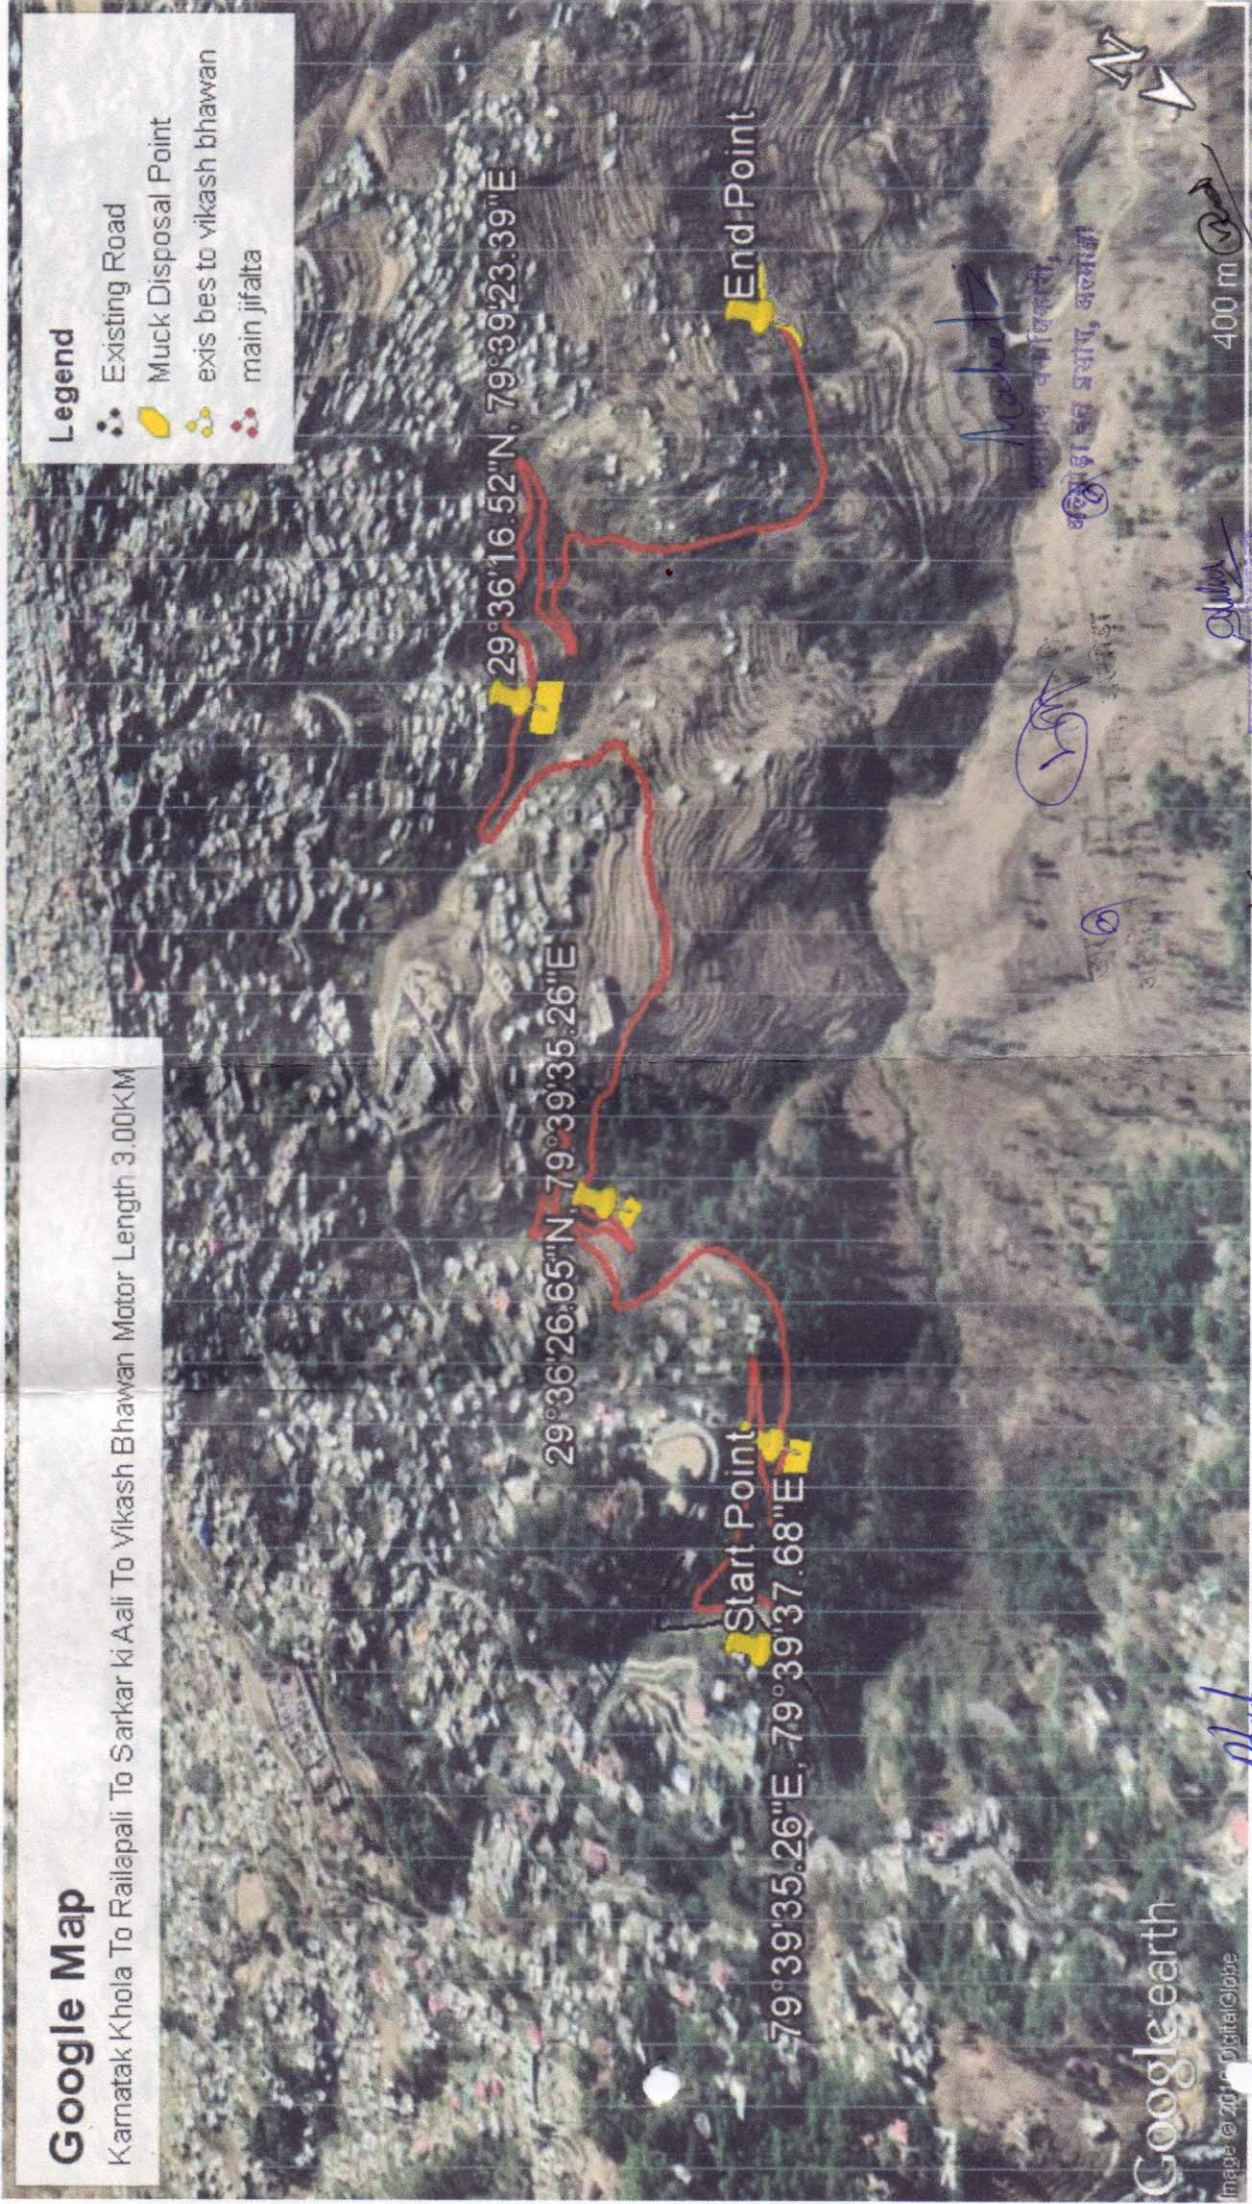
54

Google Map

Karnatak Khola To Railapali To Sarkar ki Aali To Vikash Bhawan Motor Length 3.00KM

Legend

- Existing Road
- Muck Disposal Point
- axis bes to vikash bhawan
- main jirfalta



(दीपक कुमार पन्त)
हप वन क्षेत्र अधिकारी,
अनुभाग - मन्मोहा (मन्मोहा)

AFR

सहायक प्रभियन्ता,
सर्वेक्षण विभाग, लो. नि. वि.
मन्मोहा

प्रभियन्ता,
मन्मोहा, लो. नि. वि.
मन्मोहा.
