

## प्रपत्र-49

परियोजना का नाम : जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## मलवे निस्तारण हेतु लाइन डायग्राम

निस्तारित बिन्दु

|                         |                           |                           |                          |                           |                         |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Km. -1, X/S - 0/2 - 0/4 | Km. -2, X/S - 1/14 - 1/16 | Km. -2, X/S - 1/24 - 1/26 | Km. -3, X/S - 2/8 - 2/12 | Km. -3, X/S - 2/18 - 2/19 | Km. -4, X/S - 3/1 - 3/5 |
|-------------------------|---------------------------|---------------------------|--------------------------|---------------------------|-------------------------|

## Location &amp; Quantity of dabrries Disposal

| Location of Dumping Yard                       | Type of Land | Size Of Dumping Yard ( cum ) | Capacity of dumping yard (Cum) | Remark ( J.P.S. Reading )        | Area Of Dumping Yard in ( Sqm. ) | Area Of Dumping Yard in ( Hect ) |
|------------------------------------------------|--------------|------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------------------|
| Dumping Yard- (1)<br>Km. -1, X/S - 0/2 - 0/4   | Forest Land  | 50 X 20 X (2+4)/2            | 3000.00 Cum                    | 78°46'01.83"E<br>30°24'47.84"N   | 50 X 20 = 1000 Sqm               | 0.100 hect.                      |
| Dumping Yard- (2)<br>Km. -2, X/S - 1/14 - 1/16 | Nap Land     | 60 X 25 X (2+6)/2            | 6000.00 Cum                    | 78°46'21.749"E<br>30°24'47.675"N | 60 X 25 = 1500 Sqm               | 0.1500 hect.                     |
| Dumping Yard- (3)<br>Km. -2, X/S - 1/24 - 1/26 | Nap Land     | 60 X 10 X (4+6)/2            | 3000.00 Cum                    | 78°46'31.12"E<br>30°24'50.67" N  | 60 X 10 = 600 Sqm                | 0.0600 hect.                     |
| Dumping Yard- (4)<br>Km. -2, X/S - 2/8 - 2/12  | Nap Land     | 100 X 15 X (3+5)/2           | 6000.000 Cum                   | 78°46'19.37"E<br>30°25'01.10" N  | 100 X 15 = 1500 Sqm              | 0.1500 hect.                     |
| Dumping Yard- (5)<br>Km. -3, X/S - 2/18-2/19   | Nap Land     | 25 X 12 X (4+6)/2            | 1500.00 Cum                    | 78°46'19.37"E                    | 25 X 12 = 300.00 Sqm             | 0.0300 hect.                     |
| Dumping Yard- (6)<br>Km. -2, X/S - 3/1 - 3/5   | Nap Land     | 100 X 15 X(4+6)/2            | 7500.00 Cum                    | 78°46'18.05"E<br>30°25'1.10"N    | 100 X 15 = 1500 Sqm              | 0.1500 hect.                     |
| Total Capacity of dumping yard (Cum)           |              |                              | 27000.00 Cum                   | Total Area                       | 64000.00 Sqm.                    | 0.640 hect.                      |

डम्पिंग यार्ड स्थल से प्रभावित कुल भूमि - 0.640 हे०

प्रमाणित किया जाता है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु मलवे के निस्तारण के लिए 0.100 हे० वन भूमि तथा 0.540 हे० नाप भूमि अधिग्रहित की गयी है, जिस हेतु भूमिधरों द्वारा अनापत्ति प्रमाण-पत्र प्रदान किया गया है। भविष्य में यदि प्रयोक्ता एजेन्सी को मलवे के निस्तारण के लिए अधिक नाप भूमि आवश्यकता होगी तो भूमि अधिग्रहित करने हेतु भूमिधरों द्वारा सहमति प्रदान की गयी है।

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिवाई खण्ड-1, नई टिहरी

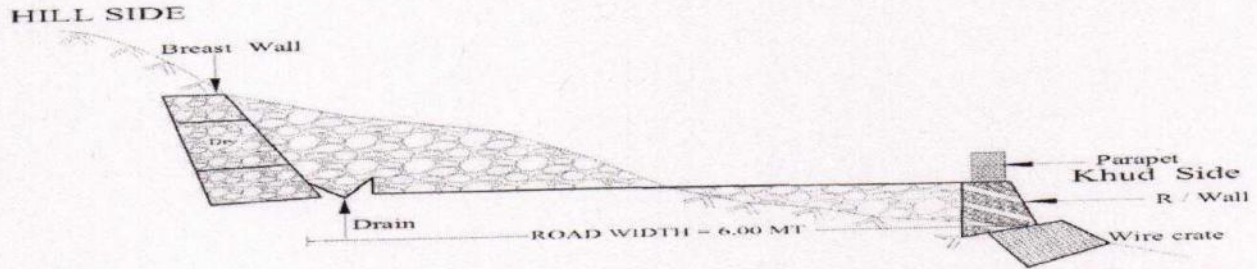
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिवाई खण्ड-1, नई टिहरी

अधिसूची अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिवाई खण्ड-1, नई टिहरी

## प्रपत्र-49.1

परियोजना का नाम : - जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## परियोजना से उत्पादित मलवा हेतु निस्तारण योजना



|                                     |                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |          |     |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|-----|
| 1                                   | Material received form hill side cutting .                                                                                                                                    | $1/2 \times [3400 \times 6.00 \times 3.00 \text{ (avg.)}] = 30600.00 \text{ Cum}$                  | 30600.00 | Cum |
| 2                                   | 40% Swell Factor = $(30600.00 \text{ Cum}) \times 40\% = 12240.00$                                                                                                            |                                                                                                    | 12240.00 | Cum |
|                                     |                                                                                                                                                                               | Total Qty. =                                                                                       | 42840.00 | Cum |
| <b>Disposal and use of Material</b> |                                                                                                                                                                               |                                                                                                    |          |     |
| 3                                   | R.R. Stone Masonry in Retaining wall / Banded wall and Abutment of Bridge & Culvert.                                                                                          | $1000 \times (1.90+0.60)/2 \times 4.00 = 4000.00 \text{ cum}$                                      | 5000.00  | Cum |
| 4                                   | R.R. Stone Masonry laid dry in Breast Wall / Banded wall .                                                                                                                    | $1000 \times (1.00+0.60)/2 \times 2.50 = 1056.00 \text{ cum}$                                      | 2000.00  | Cum |
| 5                                   | Hand Packed Stone Filling in R/w & Abutment.                                                                                                                                  | $1/2 \times 1000 \times 1.00 \times 2.00 = 750 \text{ cum}$                                        | 1000.00  | Cum |
| 6                                   | Construction of Wire Create for Protection work and Damping zone Site.                                                                                                        | $200 \text{ nos} \times (3.00 \times 1.50 \times 1.25) = 1125.00 \text{ cum}$                      | 1125.00  | Cum |
| 7                                   | Construction of Parapet                                                                                                                                                       | $100 \text{ nos} \times (2.00 \times 0.45 \times 0.60) = 54.00 \text{ cum}$                        | 54.00    | Cum |
| 8                                   | Construction Of Scupper With Cath Pit.                                                                                                                                        | $25 \text{ nos} \times 6.00 \text{ m. Each} \times 9.00 \text{ cum / meter} = 1350.00 \text{ cum}$ | 1350.00  | Cum |
| 9                                   | Granular sub-base/base/surface                                                                                                                                                | $3400 \times 4.00 \times 0.25 = 3400 \text{ cum}$                                                  | 3400.00  | Cum |
| 10                                  | W.B.M.-III                                                                                                                                                                    | $3400 \times 3.75 \times 0.075 = 956.25 \text{ cum}$                                               | 956.25   | Cum |
| 11                                  | Material Used For, Hill Side Drain, Filling and Grade Maintaining, Super elevation , Job Pillar, Back Pillars, Reference Pillars & Edge Stone, and Construction of Cause Way. |                                                                                                    | 1000.00  | Cum |
|                                     |                                                                                                                                                                               | Total Used                                                                                         | 15885.25 | Cum |
| 12                                  | Material Disposal By Cartage = $(49980.00 - 13690.17)$                                                                                                                        |                                                                                                    | 26954.75 | Cum |

## SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

| S.N. | Total Dabries ( cum ) | Reused Material for Road Construction ( cum ) | Material Disposal By Cartage in Dumping Zone ( cum ) |
|------|-----------------------|-----------------------------------------------|------------------------------------------------------|
| 1    | 42840.00              | 15885.25                                      | 26954.75                                             |

कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

अधिरासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

## प्रपत्र-49.2

परियोजना का नाम : —

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

परियोजना से उत्पादित मलवा हेतु निस्तारण योजना



### Location And Quantity of Dabries Disposal

| S.N. | Type Of Land | Cross Section Of Dumping Yard | Length | Width | Area (Sq.m.) | Area of Dumping Yard (hect.) | Capacity Of Dumping Yard ( Cum.) |
|------|--------------|-------------------------------|--------|-------|--------------|------------------------------|----------------------------------|
| 1-   | Forest Land  | X/S - 0/2 - 2/4               | 50.00  | 20.00 | 1000.00      | 0.1000 hect.                 | 3000.00 Cum                      |
| 2-   | Nap Land     | X/S - 1/14- 1/16              | 60.00  | 25.00 | 1500.00      | 0.1500 hect.                 | 6000.00 Cum                      |
| 3-   | Nap Land     | X/S - 1/24 - 1/26             | 60.00  | 10.00 | 600.00       | 0.0600 hect.                 | 3000.00 Cum                      |
| 4-   | Nap Land     | X/S - 2/8 - 2/12              | 100.00 | 15.00 | 1500.00      | 0.1500 hect.                 | 6000.00 Cum                      |
| 5-   | Nap Land     | X/S - 2/18 - 2/19             | 25.00  | 12.00 | 300.00       | 0.0300 hect.                 | 1500.00 Cum                      |
| 6-   | Nap Land     | X/S - 3/1 - 3/5               | 100.00 | 15.00 | 1500.00      | 0.1500 hect.                 | 7500.00 Cum                      |
|      |              |                               |        | Total | 6400.00      | 0.6400 hect.                 | 27000.00 Cum                     |

### Summary of Dabries Disposal

| S.N. | Total Dabries (cum) | Reused Material for Road Construction (cum) | Material Disposal By Cartage in Dumping Zone (cum) | Capacity Of Dumping Yards (Cum) | Balance Dabries (cum) |
|------|---------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------|---------------------------------|-----------------------|
| 1-   | 42840.00            | 15885.25                                    | 26954.75                                           | 27000.00                        | -45.25                |

कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

**प्रपत्र-49.3**

परियोजना का नाम : - जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

**मक डिस्पोजल के स्थान पर वृक्षारोपण कार्य करना**

वृक्षारोपण हेतु क्षेत्रफल = 0.640 हे०

वृक्षारोपण दर प्रति हे० ( 2000 पौध )

| क्र०सं०        | कार्य का नाम                                                                                                                                                                                                             | मात्रा | इकाई  | दर                 | प्रति | धनराशि (रु०) |
|----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------|--------------------|-------|--------------|
| 1              | 2                                                                                                                                                                                                                        | 3      | 4     | 5                  | 6     | 7            |
| 1              | सर्वे एवं सीमांकन                                                                                                                                                                                                        | 1      | हे०   | 78.65              | हे०   | 78.65        |
| 2              | क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)                                                                                                                                                                                         | 1      | हे०   | 2626.80            | हे०   | 2626.80      |
| 3              | अग्रिम दीवालबन्दी (फन्सिंग) 95 घ०मी० प्रति हे०                                                                                                                                                                           | 1      | हे०   | 65000.00           | हे०   | 65000.00     |
| 4              | मृदा जल संरक्षण एवं संग्रहण हेतु कच्चे चाल खालों का निर्माण                                                                                                                                                              | 20     | सं०   | 1638.34            | सं०   | 32766.80     |
| 5              | गड़डा खुदान (0.30×0.30×0.45)                                                                                                                                                                                             | 2000   | गढ़दे | 5.50               | गढ़दा | 11000.00     |
| 6              | निरीक्षण बटिया बनाना                                                                                                                                                                                                     | 1      | हे०   | 655.60             | हे०   | 655.60       |
| 7              | पौधों की कीमत (प्रथम वर्ष) 75 प्रतिशत                                                                                                                                                                                    | 1500   | पौध   | 5.06               | पौध   | 7590.00      |
| 8              | अन्य व्यय जैसे यन्त्र, सयन्त्र औजार तेज करना एवं अन्य कार्यों पर व्यय                                                                                                                                                    | 0.5    | हे०   | 1085.00            | हे०   | 542.50       |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |        |       | योग :- प्रथम चरण   |       | 120260.35    |
| द्वितीय चरण :- |                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                    |       |              |
| 1              | गड़डा भरान (0.30×0.30×0.45)                                                                                                                                                                                              | 2000   | गढ़दे | 0.99               | गढ़दा | 1980.00      |
| 2              | पौधों की कीमत (द्वितीय वर्ष) कुल व्यय का 25 प्रतिशत                                                                                                                                                                      | 500    | पौध   | 5.61               | पौध   | 2805.00      |
| 3              | पौध ढुलान कार्य                                                                                                                                                                                                          | 2000   | पौध   | 3.63               | पौध   | 7260.00      |
| 4              | पौधरोपण व थावलाबन्दी                                                                                                                                                                                                     | 2000   | पौध   | 1.98               | पौध   | 3960.00      |
| 5              | निराई-गुडाई व मल्लिंग (दो बार)                                                                                                                                                                                           | 2000   | गढ़दे | 2.64               | गढ़दा | 5280.00      |
| 6              | खाद व दवा पर व्यय                                                                                                                                                                                                        | 2000   | गढ़दे | 0.66               | गढ़दा | 1320.00      |
| 7              | रोपण वर्ष में वृक्षारोपण की देख-रेख व रखरखाव पर व्यय                                                                                                                                                                     | 1      | हे०   | 3353.90            | हे०   | 3353.90      |
| 8              | 8.1. वृक्षारोपण क्षेत्रों के अन्तर्गत सूखे घास-फूस एवं ज्वलनशील                                                                                                                                                          | 1      | हे०   | 284.90             | हे०   | 284.90       |
|                | 8.2. सुरक्षा दीवाल/घेरवाड़ के बाहर 4 मी० की पट्टी साफ करना                                                                                                                                                               | 1      | हे०   | 284.90             | हे०   | 284.90       |
|                | 8.3. वृक्षारोपण से लाभान्वित होने वाले ग्रामीणों को अग्नि सुरक्षा जागरूकता हेतु प्रशिक्षण तथा अग्नि सुरुक्षा में उल्लेखनीय कार्य हेतु व्यक्तियों/समितियों को प्रोत्साहन देना                                             |        |       |                    |       |              |
|                | अ- प्रशिक्षण                                                                                                                                                                                                             | 1      | हे०   | 1500.00            | हे०   | 1500.00      |
|                | ब- प्रोत्साहन                                                                                                                                                                                                            | 1      | हे०   | 500.00             | हे०   | 500.00       |
| 9              | अन्य व्यय साईन बोर्ड, पौध ढुलान हेतु टोकरी, सुतली, बोरी आदि क्रय वृक्षारोपण के समय वर्षा से बचने हेतु पॉलीथीन सीट क्रय वर्ष में दो, तीन बार फोटोग्राफी फील्ड स्तरीय कार्यों को प्रचार-प्रसार एवं डेक्यूमेंटेशन आदि कार्य | 0.50   | हे०   | 1085.00            | हे०   | 542.50       |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |        |       | योग :- द्वितीय चरण |       | 29071.20     |
| तृतीय चरण :-   |                                                                                                                                                                                                                          |        |       |                    |       |              |
| 1              | रोपण वर्ष के उपरान्त द्वितीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह                                                                                                                                                         | 1      | हे०   | 10000.00           | हे०   | 10000.00     |
| 2              | अग्नि सुरक्षा कार्य                                                                                                                                                                                                      | 1      | हे०   | 3000.00            | हे०   | 3000.00      |
|                |                                                                                                                                                                                                                          |        |       | योग :- तृतीय चरण   |       | 13000.00     |

012

**चतुर्थ चरण :-**

|   |                                                                |   |     |                          |     |                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-----|--------------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त तृतीय वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00                 | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                            | 1 | हे० | 3000.00                  | हे० | 3000.00         |
|   |                                                                |   |     | <b>योग :- चतुर्थ चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**पंचम चरण :-**

|   |                                                                 |   |     |                        |     |                 |
|---|-----------------------------------------------------------------|---|-----|------------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त चतुर्थ वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00               | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                             | 1 | हे० | 3000.00                | हे० | 3000.00         |
|   |                                                                 |   |     | <b>योग :- पंचम चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**षष्ठम चरण :-**

|   |                                                               |   |     |                         |     |                 |
|---|---------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त पंचम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00                | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                           | 1 | हे० | 3000.00                 | हे० | 3000.00         |
|   |                                                               |   |     | <b>योग :- षष्ठम चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**सप्तम चरण :-**

|   |                                                                |   |     |                         |     |                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त षष्ठम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00                | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                            | 1 | हे० | 3000.00                 | हे० | 3000.00         |
|   |                                                                |   |     | <b>योग :- सप्तम चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**अष्टम चरण :-**

|   |                                                                |   |     |                         |     |                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-----|-------------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त सप्तम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00                | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                            | 1 | हे० | 3000.00                 | हे० | 3000.00         |
|   |                                                                |   |     | <b>योग :- अष्टम चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**नवम चरण :-**

|   |                                                                |   |     |                       |     |                 |
|---|----------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------|-----|-----------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त अष्टम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00              | हे० | 10000.00        |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                            | 1 | हे० | 3000.00               | हे० | 3000.00         |
|   |                                                                |   |     | <b>योग :- नवम चरण</b> |     | <b>13000.00</b> |

**दशम चरण :-**

|   |                                                              |   |     |                                         |     |                    |
|---|--------------------------------------------------------------|---|-----|-----------------------------------------|-----|--------------------|
| 1 | रोपण वर्ष के उपरान्त नवम वर्ष रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह | 1 | हे० | 10000.00                                | हे० | 10000.00           |
| 2 | अग्नि सुरक्षा कार्य                                          | 1 | हे० | 3000.00                                 | हे० | 3000.00            |
|   |                                                              |   |     | <b>योग :- दशम चरण</b>                   |     | <b>13000.00</b>    |
|   |                                                              |   |     | <b>कुल योग (प्रथम चरण से दशम चरण):-</b> |     | <b>253331.55</b>   |
|   |                                                              |   |     | <b>योग रू० :-</b>                       |     | <b>2,53,332.00</b> |

वृक्षारोपण हेतु आगणित कुल व्यय प्रति हे०

= 2,53,332.00

मक डिस्पोजल के स्थान पर वृक्षारोपण कार्य हेतु भूमि का क्षेत्र

= 0.640 हे०

मक डिस्पोजल के स्थान पर वृक्षारोपण कार्य हेतु अपेक्षित धनराशि

0.640 हे० X 2,53,332.00

**कुल योग रू० :- 1,62,132.00**

कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

**प्रतिहस्ताक्षरित**

कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

अधिकांसी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

वन क्षेत्र अधिकारी

वन क्षेत्र अधिकारी

प्रभागीय वनाधिकारी

## प्रपत्र-49.4

## मलवा निस्तारण उपचार योजना का प्राक्कलन

परियोजना का नाम-जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) का नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

डम्पिंग स्थल - 1न० वन भूमि एवं 05 न० नाप भूमि ग्राम सभा हड़ियाणा तल्ला

| S.N. | Item of Work                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | No | Length | Width | Height | Quantity | Unit | Rate /Cum                              | Amount     |
|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|--------|-------|--------|----------|------|----------------------------------------|------------|
| 1    | Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks cu.m including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge (                                                                                                                                                                                                   |    |        |       |        |          |      | Mord SOR 2017-18, 1-11-1               |            |
|      | Dumping Zone -1 At X/S 0/2 - 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 54.00    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 2 At X/S 1/14 - 1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 18.00    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 3 At X/S 1/24 - 1/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 36.00    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 4 At X/S 2/12 - 2/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 36.00    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 5 At X/S 2/21 - 2/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 18.00    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 6 At X/S 3/1 - 3/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 | 3.00   | 1.50  | 0.40   | 27.00    | cum  |                                        |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |       | Total  | 189.00   | cum  | 290.10                                 | 54828.90   |
| 2    | Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia G.I. Wire conforming to IS: 280 & IS: 4826 in 100mm x 100mm mesh (woven diagonally) including 10% extra for laps and joints laid with stone boulders weighting not less than 25 Kg each as per drawing and technical specification of MORD and as directed by Engineer in charge. ( For Construction of Dumping Yard.) |    |        |       |        |          |      | Miscellaneous Items SOR 2017-18, 1-7-2 |            |
|      | Dumping Zone -1 At X/S 0/2 - 0/4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 30 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 168.75   | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 2 At X/S 1/14 - 1/16                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 56.25    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 3 At X/S 1/24 - 1/28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 112.50   | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 4 At X/S 2/12 - 2/18                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 20 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 112.50   | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 5 At X/S 2/21 - 2/22                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 56.25    | cum  |                                        |            |
|      | Dumping Zone- 6 At X/S 3/1 - 3/5                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | 15 | 3.00   | 1.50  | 1.25   | 84.38    | cum  |                                        |            |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |       | Total  | 590.63   | cum  | 1663.60                                | 982572.07  |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |       |        |          |      | Total Rs.                              | 1037400.97 |
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |        |       |        |          |      | Say Rs.                                | 1037401.00 |

अभिषेक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी

अभिषेक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिचाई खण्ड-1, नई टिहरी


## प्रपत्र-49.6


परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


### मार्ग निर्माण के मलवे के निस्तारण का प्रमाण पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि० मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य से उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कही भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा एवं वन सम्पदा पर्यावरण एवं वन्य जीव जन्तुओं को किसी प्रकार की क्षति न पंहुचे वहां उस मलवे को किसी सुरक्षित स्थान पर एकत्रित किया जायेगा।

मार्ग पर मलवे के निस्तारण स्थल कास सेक्शन -0/2 से 0/4 (डम्पिंग यार्ड-1), कास सेक्शन - 1/14 से 1/16 (डम्पिंग यार्ड-2), कास सेक्शन - 1/24 से 1/26 (डम्पिंग यार्ड-3), कास सेक्शन - 2/8 से 2/12 (डम्पिंग यार्ड-4), कास सेक्शन -2/18 से 2/19 (डम्पिंग यार्ड-5) एवं कास सेक्शन -3/1 से 3/5 (डम्पिंग यार्ड-6) नाप भूमि में स्थित है।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

  
अधिसासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

  
वन दरोगा  
भिलंगना राजि घनसाली

  
वन नक्षेत्राधिकारी  
भिलंगना राजि घनसाली  
टि० व० प्र० नई टिहरी

प्रभागीय वनाधिकारी  
टिहरी वन प्रभाग नई टिहरी

## प्रपत्र-49.7

परियोजना का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली - अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


### मक डम्पिंग प्लान प्रमाण -पत्र

**Muck Disposal** हेतु भूमि के चयन का विवरण:- प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत मक डम्पिंग हेतु 5 नं० स्थल का चयन किया जा चुका है जिसमें काश्तकारों से सहमति प्राप्त कर ली गयी है। तथा अन्य मक डम्पिंग स्थलों हेतु काश्तकारों से सहमति प्राप्त करने की प्रक्रिया चल रही है। नाप भूमि में चयनित मक डम्पिंग स्थलों का विवरण निम्न प्रकार से है।

| S.N | Km | X/s         | Area in Hect | L. X B. X H.             | Capicity (cum) | Dump.Yard |
|-----|----|-------------|--------------|--------------------------|----------------|-----------|
| 1   | 1  | 0/2 - 0/4   | 0.100 Hect.  | 50.00 X 20.00 X (2+4)/2  | 3000.00 Cu.m.  | D.Yard-1  |
| 2   | 2  | 1/14 - 1/16 | 0.150 Hect.  | 60.00 X 25.00 X (2+6)/2  | 6000.00 Cu.m.  | D.Yard-2  |
| 3   | 2  | 1/24 - 1/26 | 0.060 Hect.  | 60.00 X 10.00 X (4+6)/2  | 3000.00 Cu.m   | D. Yard-3 |
| 4   | 3  | 2/8 - 2/12  | 0.150 Hect.  | 100.00 X 15.00 X (3+5)/2 | 6000.00 Cu.m   | D. Yard-4 |
| 5   | 3  | 2/18 - 2/19 | 0.030 Hect.. | 25.00 X 12.00 X (4+6)/2  | 1500.00 Cu.m   | D. Yard-5 |
| 6   | 4  | 3/1 - 3/5   | 0.150 Hect.. | 100.00 X 15.00 X (4+6)/2 | 7500.00 Cu.m   | D. Yard-6 |
|     |    | Total       | 0.640 Hect.  | -                        | 27200.00 cu.m. | 6 Nos.    |

उक्त मक डम्पिंग स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर बायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान किया गया है। कृषकों द्वारा अपनी भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु अनापत्ति भी प्रदान की गयी है।

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग जोनो के निर्माण कार्य हेतु रू० 10,37,401.00 तथा मक डिस्पोजल के स्थान पर वृक्षारोपण कार्य हेतु रू० 1,62,132.00 कुल रू० 11,99,533.00 का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित, जल स्रोतों एवं पहाड़ी ढलानो में नहीं डाला जायेगा।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

  
सहायक अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

  
अधिरासी अभियन्ता  
पी०एम०जी०एस०वाई०  
सिंचाई खण्ड-1 नई टिहरी

## प्रपत्र-49.7

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाणDamping Zone - 2

G.P.S. Reading - 78° 46' 21.74"E

30° 24' 47.67"N

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 1/14-1/16 कि०मी०-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु भू-स्वामी /काश्तकार/कब्जेदार, ग्राम सभा-हड़ियाणा तल्ला, पो० ओ० - खोली हड़ियाणा, पट्टी -हिन्दाव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र -चांजी, तहसील - घनसाली, ब्लाक - भिलगना, जिला - टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है -

| खाता सं०          | भू-स्वामी /काश्तकार /कब्जेदार का नाम                                                                                                                    | अर्जित खसरा न० | कुल भूमि (हे०) | मक डिस्पोजल हेतु अर्जित भूमि (हे०) | भू-स्वामी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान  |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------|------------------------------------|------------------------------------------|
| 72                | शूरवीर सिंह, बलबीर सिंह, रणवीर सिंह पुत्र नारायण सिंह, शूरवीर सिंह, विक्रम सिंह, रणवीर सिंह, कुलवीर सिंह पुत्र नाथू सिंह, बीरबल सिंह पुत्र इन्द्र सिंह। | 3242<br>3243   | 0.140<br>0.040 | 0.1175<br>0.0325                   | शूरवीर सिंह<br>रणवीर सिंह<br>नारायण सिंह |
| अर्जित भूमि (हे०) |                                                                                                                                                         |                | 0.180          | 0.1500                             | हे०                                      |

काश्तकार/कब्जेदार

अमीन अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

Assistant Engineer  
P.M.G.S.Y., I.D.-I  
Tehri

प्रकाश घमोली  
राजस्व उप निरीक्षक  
चांजी

तहसीलदार

# व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाण

## Damping Zone - 3


G.P.S. Reading - 78° 46'31.12"E

30° 24'50.67"N

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

1/24-1/26

क्रास सेक्शन 1/24-1/28 कि०मी०-2 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु भू-स्वामी /काश्तकार/कब्जेदार, ग्राम सभा- हड़ियाणा तल्ला, पो० ओ० - खोली हड़ियाणा, पट्टी -हिन्दाव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र -चांजी, तहसील - घनसाली, ब्लाक - भिलगना, जिला - टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है -

| खाता सं० | भू-स्वामी /काश्तकार /कब्जेदार का नाम                                                                                                                                         | अर्जित खसरा न०                       | कुल भूमि (हे०)                            | मक डिस्पोजल हेतु अर्जित भूमि (हे०)        | भू-स्वामी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान                                               |
|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|-------------------------------------------|-------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 67       | विक्रम प्रसाद पुत्र वाम देव, सर्वेश्वरी देवी पत्नि वाम देव, नीलकंठ पुत्र सत्यानन्द, शक्तिधर, शंकरदत्त, राजेन्द्र पुत्र रामकृष्ण, वालमुकन्द, विनोद प्रसाद पुत्र गजाधर प्रसाद। | 3168<br>3167<br>3169<br>3170<br>3171 | 0.010<br>0.021<br>0.021<br>0.016<br>0.016 | 0.010<br>0.021<br>0.011<br>0.006<br>0.012 |  |
|          |                                                                                                                                                                              | अर्जित भूमि (हे०)                    | 0.084                                     | 0.0600                                    |                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                      |                                           |                                           |                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                      |                                           |                                           |                                                                                       |
|          |                                                                                                                                                                              |                                      |                                           |                                           |                                                                                       |

काश्तकार/कब्जेदार

अमीन अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

राजस्व उप निरीक्षक

प्रकाश धर्माली

राजस्व उपनिरीक्षक

चोरी

तहसील... टिहरी गढ़वाल

Assistant Engineer  
P.M.G.S.Y., I.D.-I  
New Tehn

तहसीलदार

तहसीलदार  
घनसाली  
टिहरी गढ़वाल

# व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाण



## Damping Zone - 4

G.P.S. Reading - 78° 46'19.37"E

30° 25'1.10"N

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 2/10-2/12-2/18 कि०मी०-3 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु भू-स्वामी /काश्तकार/कब्जेदार, ग्राम सभा- हड़ियाणा तल्ला, पो० ओ० - खोली हड़ियाणा, पट्टी -हिन्दाव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र -चांजी, तहसील - घनसाली, ब्लाक - भिलगना, जिला - टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है -

| खात<br>I<br>सं० | भू-स्वामी /काश्तकार /कब्जेदार का नाम                                                                                                                                     | अर्जित खसरा<br>न० | कुल भूमि<br>(हे०) | मक<br>डिस्पोजल<br>हेतु अर्जित<br>भूमि (हे०) | भू-स्वामी के हस्ताक्षर/<br>अंगूठे का निशान                                            |
|-----------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|---------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 52              | मुकेश, सुरेश पुत्र ज्योतिशरण, कौशल्या, देवी पत्नी ज्योति शरण, महीशरण पुत्र शिवशरण, उपेन्द्र दत्त भुवनेश्वर, बरफ प्रसाद, राजेन्द्र प्रसाद, दर्शनलाल पुत्र परिश्वर प्रसाद। | 2099              | 0.045             | 0.0150                                      |  |
| 16              | गोविन्द राम, जनार्दन पुत्र सतूरानन्द, चित्रमोहन पुत्र विशालमणी, बजमोहन पुत्र तुंगेश्वर।                                                                                  | 2098<br>2108      | 0.069<br>0.090    | 0.0650<br>0.0700                            |  |
|                 |                                                                                                                                                                          | योग               | 0.204             | 0.1500                                      | हे०                                                                                   |

काश्तकार/कब्जेदार

अमीन अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

Assistant Engineer  
P.M.G.S.Y., I.D.-I  
New Tehri

जय प्रकाश घनसाली  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र - चांजी

तहसील - चांजी, टिहरी गढ़वाल

तहसीलदार  
घनसाली  
टिहरी गढ़वाल

## व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाण

### Damping Zone - 5


G.P.S. Reading - 78°46'17.97"E

30°25'5.19"N

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

21/9-2/19

क्रास सेक्शन 2/21-2/22 कि०मी० -3 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु भू-स्वामी/ काश्तकार/कब्जेदार, ग्राम सभा- हड़ियाणा तल्ला, पो० ओ० - खोली हड़ियाणा, पट्टी -हिन्दाव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र -चांजी, तहसील - घनसाली, ब्लाक - भिलगना, जिला - टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है -

| खाता सं०          | भू-स्वामी /काश्तकार /कब्जेदार का नाम                                                                                                                 | अर्जित खाता सं०-             | कुल भूमि (हे०)                   | मक डिस्पोजल हेतु अर्जित भूमि (हे०) | भू-स्वामी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान                                               |
|-------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|----------------------------------|------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|
| 57                | महीधर प्रसाद, चण्डी प्रसाद, प्रेमलाल, सुभासचन्द पुत्र हृदयाराम, ज्योति प्रसाद, ओमप्रकाश पुत्र जगताराम, भुवनेश्वर प्रसाद, बालमुकुन्द पुत्र इन्द्रमणी। | 1931<br>1932<br>1933<br>1934 | 0.006<br>0.008<br>0.010<br>0.011 | 0.001<br>0.008<br>0.010<br>0.011   |  |
|                   |                                                                                                                                                      |                              |                                  |                                    |                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                      |                              |                                  |                                    |                                                                                       |
|                   |                                                                                                                                                      |                              |                                  |                                    |                                                                                       |
| अर्जित भूमि (हे०) |                                                                                                                                                      |                              | 0.035                            | 0.0300                             | हे०                                                                                   |

काश्तकार/कब्जेदार

अमीन अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

Assistant Engineer  
P.M.G.S.Y., I.D.-I  
New Tehn

तहसीलदार

# व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी का अनापत्ति प्रमाण



## Damping Zone - 6

G.P.S. Reading - 78° 46'18.05"E

30° 25'11.48"N

जनपद टिहरी गढ़वाल में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत घनसाली से पँवाली-अखोड़ी मोटर मार्ग कि०मी० 14 (हुलानाखाल) से हड़ियाणा तल्ला मोटर मार्ग (लम्बाई 3.400 कि०मी०) के नव निर्माण कार्य हेतु जो भूमि निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित की गई है उसे प्रयोजन हेतु यदि मेरी भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

क्रास सेक्शन 3/1-3/5 कि०मी०-4 पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु भू-स्वामी/काश्तकार/ कब्जेदार, ग्राम सभा- हड़ियाणा तल्ला, पो० ओ० - खोली हड़ियाणा, पट्टी -हिन्दाव, राजस्व उप निरीक्षक क्षेत्र -चांजी, तहसील - घनसाली, ब्लाक - भिलगना, जिला - टिहरी गढ़वाल के नाम भूमि विवरण निम्न प्रकार है -

| क्रम सं० | भू-स्वामी / काश्तकार / कब्जेदार का नाम                                                                                                                                                                                                                             | अर्जित खाता सं०-     | कुल भूमि (हे०)          | मक डिस्पोजल हेतु अर्जित भूमि (हे०) | भू-स्वामी के हस्ताक्षर/ अंगूठे का निशान                                                                |
|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|-------------------------|------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 48       | भूवनेश्वरी पत्नी नत्थी लाल पुत्र गोवर्धन।                                                                                                                                                                                                                          | 1885<br>1884<br>1879 | 0.008<br>0.028<br>0.051 | 0.0060<br>0.0260<br>0.0440         |                                                                                                        |
| 63       | राम प्रसाद, विशम्बर प्रसाद, सत्य प्रसाद, चण्डी प्रसाद, लक्ष्मी प्रसाद पुत्र कृपाल दत्त, गिरीश प्रसाद, हरीश प्रसाद, जगदीश प्रसाद पुत्र उर्वीदत्त, मायाराम, नागेन्द्र दत्त पुत्र अमरू भूवनेश्वरी पत्नी नत्थी लाल, बेलीराम मंत्री प्रसाद, ललिता प्रसाद पुत्र गोवर्धन। | 1891<br>1892         | 0.016<br>0.015          | 0.0160<br>0.0120                   | बिजे-5 प्रसाद<br> |
| 4        | उर्वीदत्त पुत्र अमरू दा०<br>खा० - उर्वीदत्त पुत्र अमरू के बजाय नारायण दत्त पुत्र उर्वीदत्त के नाम दर्ज।                                                                                                                                                            | 1878<br>1893         | 0.031<br>0.050          | 0.0310<br>0.0150                   | अमरू<br>          |
|          |                                                                                                                                                                                                                                                                    | अर्जित भूमि (हे०)    | 0.199                   | 0.1500                             | हे०                                                                                                    |

काश्तकार/ कब्जेदार

अमीन अभियन्ता

कनिष्ठ अभियन्ता

**Assistant Engineer**  
P.M.G.S.Y. I.D.

राजस्व उप निरीक्षक

टिहरी गढ़वाल  
तहसीलदार  
घनसाली
