

डिजिटल मानचित्र – जनपद चम्पावत में मा0 मुख्यमंत्री धोषणा के अर्न्तगत बिरमोला से रायल मोटर मार्ग के निर्माण हेतु



Legend

- Dumping Zone
- Proposed Road
- Existing Road

प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०

जन श्रेय नमस्कार

जन प्रशासकीय वनाधिकारी
चम्पावत

चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Name of Work:- Construction of Birmola-Rayal motor road .

Material received due to hill side cutting
(3825x0.5x7.0x2.0)

26775.00

Say

26775.00

Use of Material

S No	Item for which material is to be used	Quantity (Cum./Nos.)	Index at which the material will be consumed per unit	Quantity of material consumed (Cum.)
1	2	3	4	5
1	Stone masonry in cement sand mortar	3196.00	1.15	3675.40
2	Stone masonry in lai dry	3196.00	1.15	3675.40
3	Hand packed stone filling	2000.00	1.00	2000.00
4	Construction of wire crates	1825.00	1.00	1825.00
5	Granular-sub-base (GSB)	1700.00	1.00	1700.00
6	Construction of parapets	335.00	1.00	335.00
7	Construction of road side drain	525.00	1.00	525.00
8	Construction of R.C.C. scuppers	1450.00	1.00	1450.00
9	Concreting works	110.00	0.96	105.60
Material to be stored for carrying out stage-II works				
10	GSB (grading-I) works	5180.00	1.21	6267.80
11	GSB (grading-II) works			
12	G3 (grading to be done using granulator at site)			
13	Super elevation and patri	150.00	1.00	150.00
Total material consumed in cum				21709.20
Say in cum				21710.00
	Balance material left for disposal	26775.00	-21710.00	
		5065.00		
	Add 40% for swell factor	2026.00		

Total

7091.00

Location and quantity of debris disposal

सहायक अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि

अधिकासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड, लोनिवि

चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी

कल्याण नगर

वन प्रशासक वनाधिकारी

चम्पावत

प्रान्तीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Name of Work:- Construction of Birmola-Rayal motor road .

Material received due to hill side cutting
(3825x0.5x7.0x2.0) 26775.00

Say 26775.00

Use of Material

S No	Item for which material is to be used	Quantity (Cum./Nos.)	Index at which the material will be consumed per unit	Quantity of material consumed (Cum.)
1	2	3	4	5
1	Stone masonry in cement sand mortar	3196.00	1.15	3675.40
2	Stone masonry in lai dry	3196.00	1.15	3675.40
3	Hand packed stone filling	2000.00	1.00	2000.00
4	Construction of wire crates	1825.00	1.00	1825.00
5	Granular-sub-base (GSB)	1700.00	1.00	1700.00
6	Construction of parapets	335.00	1.00	335.00
7	Construction of road side drain	525.00	1.00	525.00
8	Construction of R.C.C. scuppers	1450.00	1.00	1450.00
9	Concreting works	110.00	0.96	105.60
Material to be stored for carrying out stage-II works				
10	GSB (grading-I) works	5180.00	1.21	6267.80
11	GSB (grading-II) works			
12	G3 (grading to be done using granulator at site)			
13	Super elevation and patri	150.00	1.00	150.00
Total material consumed in cum				21709.20
Say in cum				21710.00
	Balance material left for disposal	26775.00	-21710.00	
		5065.00		
	Add 40% for swell factor	2026.00		

Total 7091.00

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअनि०वि०
चम्पावत

अधिकासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लोअनि०वि०
चम्पावत

वन क्षेत्र अधिकारी
कल्याण नगर

वन प्रभारी वनाधिकारी
चम्पावत

Location and quantity of debris disposal

प्रान्तीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Summary of Debris Disposal

S.No.	Total Debris Cum.	Material disposal by cartage	Re-used material for road const.	Total disposal in dumping zone	Balance debris
1	2	3	4	5	6
1	26775.00	7091.00	19684.00	7091.00	Nil

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (प्रत्यक्ष ग.)

वन क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत राशि

वन प्रशासकीय वनाधिकारी
चम्पावत

प्रशासकीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

Ch.	Size of Dumping site	Type of land	Capacity of the site (Cum)
0.400	55.00x6.50x6.00	Civil Land	2145.00
1.100	45.00x5.00x5.50	Civil Land	1237.50
2.100	50.00x5.80x5.40	Civil Land	1566.00
3.200	65.00x5.50x6.00	Civil Land	2145.00
		Total	7093.50

सहायक अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशाली अभियन्ता
प्रांतीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत



वन क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत

प्रमाणाय वनाधिकारी
चम्पावत

प्रमाणाय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

कार्य का नाम— जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अन्तर्गत बिरमोला-रॉयल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

MUCK DISPOSAL PLAN AND CROSS SECTION

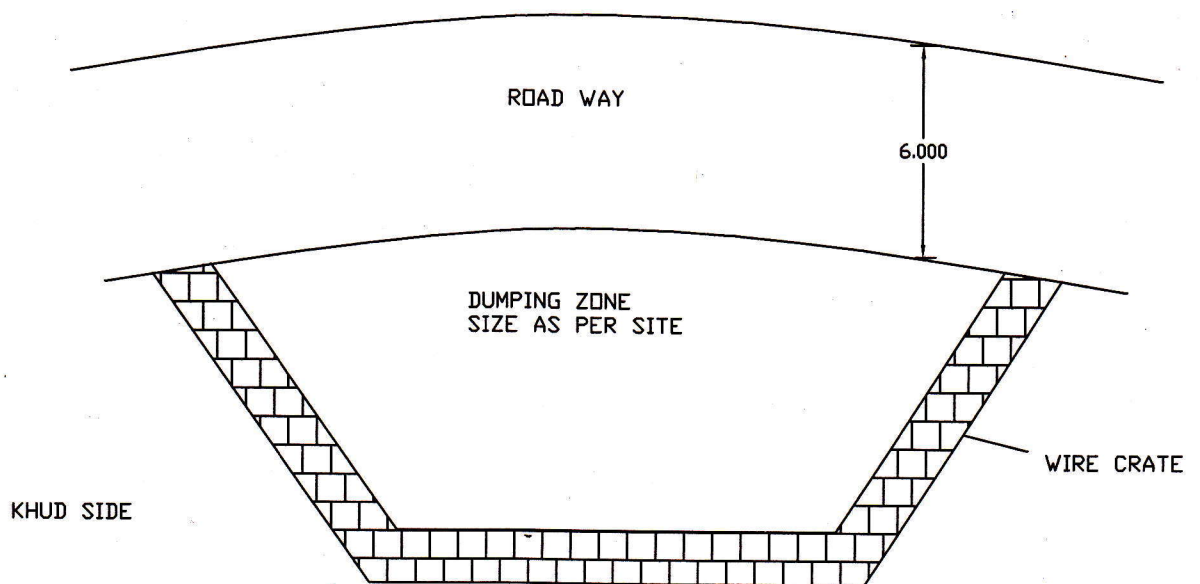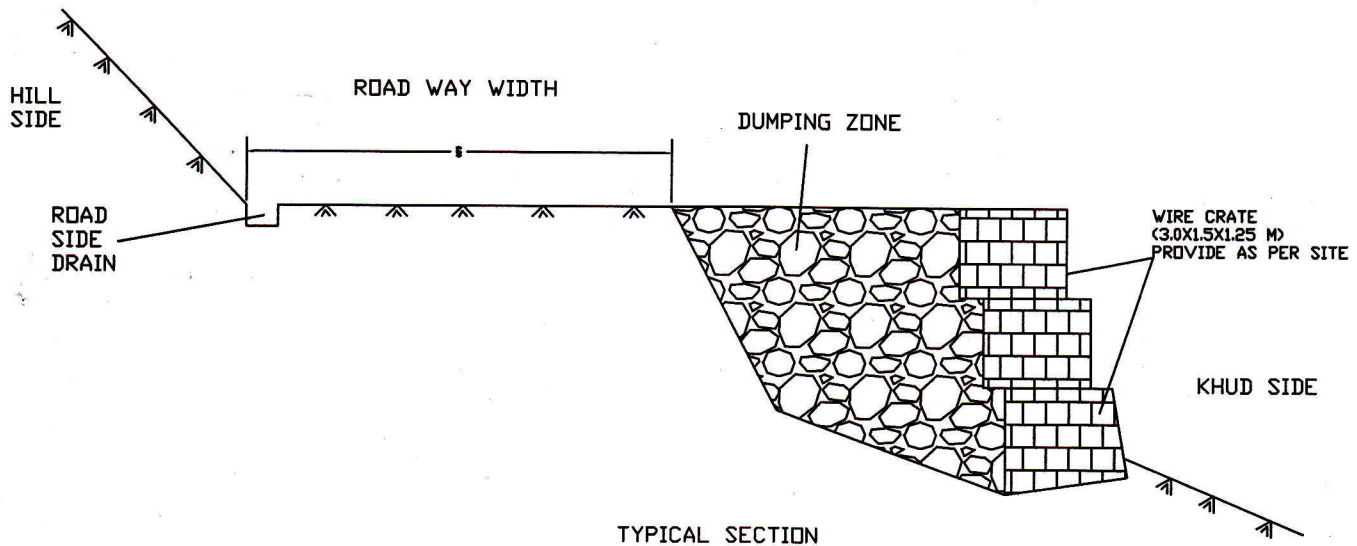

सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशोषी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (प्र.पं. १)

प्रमाणित वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग, चम्पावत

वन प्रशासक वनाधिकारी
चम्पावत

परियोजना विवरण :- जनपद चम्पावत के विधानसभा क्षेत्र चम्पावत के अर्न्तगत विरमोला- रायल मोटर मार्ग का नव निर्माण।

प्रमाण-पत्र

मलवा निस्तारण व्यय वहन प्रमाण पत्र

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यो में जो भी व्यय होगा उसे प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।


सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत


अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (पृष्ठ २)


वन क्षेत्र अधिकारी
चम्पावत


वन प्रशासकीय वनाधिकारी
चम्पावत
