

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधशासी अभियन्ता लो०नि०वि०, बड़कोट (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के 12 महीने की तारीख को निष्पादित किया गया है।

1- यह सहगति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृति सर्किल दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हरतान्तरण ग्राम विकास विभाग के नाम किया जायेगा।

3- यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने पाधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हरताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की
ओर से हस्ताक्षर

नाम:-ई० वी०डी भट्ट
पदनाम:-अधशासी
अभियन्ता, लो०नि०वि०
बड़कोट

साक्षी
राजस्व उपनिरीक्षक

तहसीलदार

साक्षी

उपनिरीक्षक

विभागाधिकारी

पुरोला

विभागाधिकारी

क्र० सं०	नाम भूमिधर	पिवा का नाम	हस्ताक्षर
1-	इलमसिंह सा०	अतारसिंह सा० सरनौल	इलमसिंह
2-	धामसिंह सा०	दीरसिंह सा० सरनौल	धामसिंह
3-			
4-	केदारसिंह सा०	गजसिंह सा० सर	केदारसिंह
5-	बूढ़ी पालसिंह सा०	जीवासिंह सा० डिग्री	बूढ़ी पालसिंह
6-	सोवेंद्रसिंह सा०	विजेंद्रसिंह सर	सोवेंद्रसिंह
7-	इवलसिंह सा०	मोपालसिंह सा०	इवलसिंह
8-	रुलजी देवी सा०	सोवेंद्रसिंह सर	रुलजी देवी
9-			
10-			
11-			
12-	सतीशदास सा०	लांगडीदास लेवडी	सतीशदास
13-			
14-	जुवली देवी सा०	इवलसिंह सा०	जुवली देवी
15-			
16-			
17-			
18-			
19-			
20-	सोवेंद्रसिंह सा०	की रमेशसिंह सा०	सोवेंद्रसिंह

"समझौता ज्ञापन"

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधशासी अभियन्ता
लो0नि0वि0, बड़कोट (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में समस्त नापभूमिधर जिनकी भूमि गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु उपयोग में लायी जानी है।

के बीच

आज वर्ष 2015 के 12 महीने की तारीख को निष्पादित किया गया है।

1- यह सहगति हो गई है कि कार्यदायी संस्था मार्ग निर्माण का समस्त कार्य निष्पादित करेगी।

2- यह सहमति हो गई है कि अपनी वह भूमिधर जिनकी भूमि मार्ग निर्माण/मक डिस्पोजल हेतु लायी जानी है। उनको वर्तमान स्वीकृति सर्किल दरो पर प्रतिकर के रूप में भुगतान किया जायेगा। तथा भूमि का हरतान्तरण ग्राम विकास विभाग के नाम किया जायेगा।

3- यदि कोई विवाद होता है, तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा, जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

उसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने पाधिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लिखित तारीख, माह और वर्ष के हरताक्षर किये और अपनी मोहर लगाई है।

कार्यदायी संस्था की
ओर से हस्ताक्षर

नाम:- ई0 वी0डी भट्ट
पदनाम:- अधशासी
अभियन्ता, लो0नि0वि0
बड़कोट

साक्षी
राजस्व उपनिरीक्षक

साक्षी
उपनिरीक्षक
प्रबन्धन अधिकारी
पुरोषा
विभाग उत्तरकाशी

क्र0 सं0	नाम भूमिधर	पिता का नाम	हस्ताक्षर
1-	गजवीर सिंह	रज0	गजवीर सिंह
2-	गजवीर सिंह	रज0	गजवीर सिंह
3-	देवेन्द्र सिंह	सुरत सिंह	देवेन्द्र सिंह
4-	जयवीर सिंह	बचन सिंह	जयवीर सिंह
5-	जगवीर सिंह	सुरत सिंह	जगवीर सिंह
6-	गजेन्द्र सिंह	सुरत सिंह	गजेन्द्र सिंह
7-			
8-			
9-			
10-			
11-			
12-			
13-			
14-			
15-			
16-			
17-			
18-			
19-			
20-			


परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मक डम्पिंग प्लान प्रमाण-पत्र


प्रस्तुत प्राकलन ग्राम गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक सम्पर्क मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में कृषकों की सिविल सोयम भूमि में चैनेज सं. जो की लगभग जिसमे


100x17.30x15, 100x15.20x15, 100x19.60x15, 100x14.70x15, 100x20.10x15, 100x24.50x18मी 0 के डम्पिंग जोन प्रस्तावित है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड्ड साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण नाप भूमि मे गठित किया गया है

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नही डाला जायेगा।



कनिष्ठा अभियन्ता
लो0नि0वि0, बड़कोट


सहायक अभियन्ता
लो0नि0वि0, बड़कोट


अधिशास्त्री अभियन्ता
लो0नि0वि0, बड़कोट


सब-प्रभारी वनाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)


सब-प्रभारी वनाधिकारी
बड़कोट


प्रभारी वनाधिकारी
बड़कोट (उत्तरकाशी)

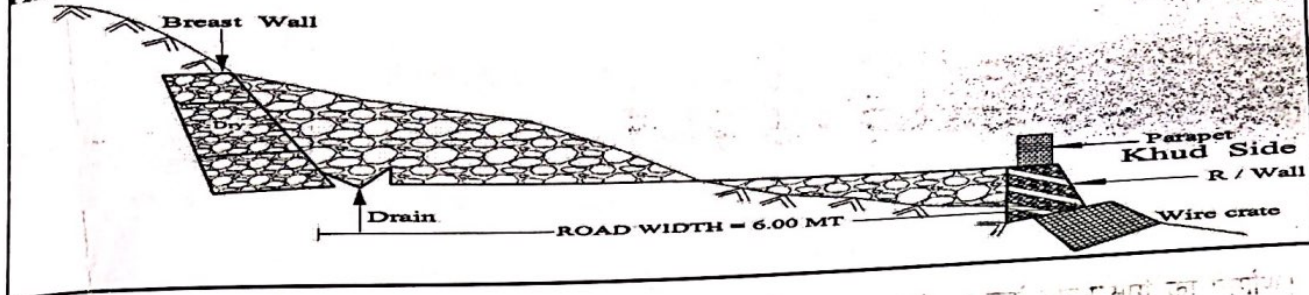
परियोजना का नाम

:-

जनपद उत्तरकाशी में गंगाली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

167

HILL SIDE



1	Material received form hill side cutting Material received form hill side cutting		213750.00	Cum
	1x1/2x6x3.75x9500		42750.00	Cum
	Add 20% For Swell Factor for Soil.		256500.00	cum
	Total			
Disposal and use of Material				
2	R.R. Stone Masonry Laid in 1:5	1x1x4750x(0.5+2.5/2)x3	21375.00	Cum
3	R.R. Stone Masonry Laid in Dry	1x1x4750x(0.5+2.5/2)x3	21375.00	Cum
4	Hand Packed Stone Filling	1x1x9500x0.6	5700.00	Cum
5	Construction of Wire Create	1x1x952x6.75	6426.00	Cum
6	Making of Edge Stone	1x1x9500x0.016	152.00	Cum
7	Construction of Parapet	1x1x300x1.08	324.00	Cum
8	Construction Of Scupper	1x2x150x16.8	5040.00	Cum
9	Granular sub-base/base/surface	1x1x9500x4.05x0.25	9618.75	Cum
10	Material Used For Filling And Grade Maintaining, Job Pillar, Back Pillars, Reference Pillars		12998.67	Cum
	Total Used		83009.42	Cum
11	Material Disposal By Cartage		173490.58	Cum

SUMMARY OF DABRIES DISPOSAL

S.No	Total Dabries	Material Disposal By Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabries
1	256500.00	173490.58	83009.42	173490.58	0.00

B.R.

A.E

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

Location & Quantity of dabrries Disposal

Location of Dumping Yard	Size Of Dumping Yard	Type Of Land	Capacity of dumping yard (Cum)	Name Of Land Owner & Village	Land In Hect	Land Area Being Used For Duping Yard (Sqm)	Latitude	Longitude
	100x17.30x15	Nap Land	25950	ATTCHED	0.173	1730.00	30°55'16.84"N	78°12'34.23"E
	100x15.20x15	Nap Land	22800		0.152	1520.00	30°55'42.74"N	78°12'11.36"E
	100x19.60x15	Nap Land	29400		0.196	1960.00	30°55'57.14"N	78°12'14.45"E
	100x14.70x15	Nap Land	22050		0.147	1470.00	30°56'32.75"N	78°13'16.35"E
	100x20.10x15	Nap Land	30150		0.201	2010.00	30°56'50.62"N	78°12'59.74"E
	100x24.50x18	Nap Land	44100		0.245	2450.00	30°57'5.26"N	78°12'57.97"E
		Total	174450		1.114	11140.00		

A. E

अधिसासी अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लोअर गंगा
बडकोट (उत्तरकाशी)

परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

S/No	Item of Work	No	Length	Width	Height	Quantity	Unit
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge						
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	Cum
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	Cum
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	Cum
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	cum
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	Cum
		1x1	100.00	1.50	0.30	45.00	cum
						270.00	Cum
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)						
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
		1x33	3.00	1.50	1.50	222.75	Cum
						1336.50	Cum
						173490.58	Cum
3	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.						


कनिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट


सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट


अधिसासी अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट

110

परियोजना का नाम :-	जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।
--------------------	--

No	Reference to MORD Specification	Item of Work	Qty	Unit	Rate	Amount
		HILL SIDE CUTTING				
1	97511 16-1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge	270.00	Cum	275.20	74304
2	97519 16-9-1-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	1336.50	Cum	1355.35	1811425
3	97564 16-28-1	Cartage Of Muck from Hill Side Cutting.	173490.58	Cum	69.00	1197085
				Total		13856579
				Say		138.56 lacs

कनिष्ठ अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट

सहायक अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट

अधिसासी अभियन्ता
लो०नि०वि०, बड़कोट
निर्माण खण्ड, लो०नि०वि०
बड़कोट (उत्तरकाशी)


परियोजना का नाम :- जनपद उत्तरकाशी में गंगराली पुल (सरनौल) से सरबडियार तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मलवा निस्तारण योजना व मानचित्र

परियोजना से उत्पादित मलवे के वैज्ञानिक विधि से उचित निस्तारण की योजना मय मानचित्र व उपचार योजना के प्राक्कलन सहित संलग्न की जा रही है।

क्र०सं०	कार्य मद	संख्या	दर/इकाई	कुल धनराशि(लाख में)
1	घास एवं झाड़ी प्रजातियों का रोपण/बीज रोपण, गड्ढे खुदान, भरान व अन्य कार्य, उचित प्रजातियों का रोपण	संलग्न	संलग्न	4.24 6.21
2	वनस्पतिक चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	138.56
3	क्रेट वायर चैकडैम का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
4	आर.आर. ड्राई का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
5	दीवाल/अन्य अभियांत्रिक संरचनाओं का निर्माण	संलग्न	संलग्न	
	योग-			142.90 144.77

ह०/-
प्रभागीय वनाधिकारी


वन सहायक अधिकारी
रवाई वन राजि
बड़कोट (उत्तरकाशी)

वन प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट


प्रभागीय वनाधिकारी
अपर यमुना वन प्रभाग
बड़कोट (उत्तरकाशी)
ह०/-
प्रयोक्ता एजेन्सी
निर्माण खण्ड, सी० ए०
बड़कोट (उत्तरकाशी)
