


MUCK DISPOSAL PLAN

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यो में जो भी व्यय होगा उसे लोक निर्माण विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



सहायक अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।



अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा।

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जलना से टी0आर0सी0 तोली तक मोटर मार्ग का निर्माण।

वृक्षारोपण स्थल का नाम:- मक डिस्पोजल हेतु चिन्हित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल।

वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल- 0.150 है०

रोपित किये जाने वाले पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000 पौध) - 300 पौध

प्रथम चरण

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	ईकाई दर (रु०)	योग
1	सर्वे एवं सीमांकन	0.150 है०	97.00	14.55
2	क्षेत्र की सफाई (झाड़ी कटान आदि)	0.150 है०	584.00	87.60
3	कुली दीवार बन्दी (फनिसंग)	0.150 है०	26460.00	3969.00
4	गद्दा खुदान (0.30x0.30x0.45)	300 गद्दा	7.33	2199.00
5	डी0ए0पी0 खाद की लागत (50 ग्राम प्रति गद्दा)	15.00 किग्रा०	19.00	285.00
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	0.150 है०	485.00	72.75
7	पौधों का मूल्य	300 पौध	5.89	1767.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार पर मानते हुए			
	वानरपतिक/स्टोन चैकडैम	0.150 है०	7750.00	1162.50
	वाटर हावेस्टिंग टैंक			
	अन्य कार्य	0.150 है०	400.00	60.00
योग प्रथम चरण -				9617.40

द्वितीय चरण

1	झाड़ी कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	0.150 है०		
2	गद्दा भरान कार्य (0.30x0.30x0.45)	300 गद्दा	1.15	345.00
3	पौध दुलान कार्य	300 पौध	6.39	1917.00
4	पौधारोपण व थैलाबन्दी	300 पौध	2.06	618.00
5	पौधों की प्रथम निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	300 पौध	0.76	228.00
6	पौधों की द्वितीय निराई गुड़ाई व मल्लिंग कार्य	300 पौध	1.15	345.00
7	पौध की कीमत द्वितीय वर्ष	300 पौध	1.15	345.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	0.150 है०	4768.00	536.40
9	रासायनिक दवा प्रति वर्ष	0.150 है०	0.21	0.03
	घास-पूस हटाना	0.150 है०	350.00	52.50
	सुरक्षा पट्टी बनाना	0.150 है०	225.00	33.75
	प्रचार प्रसार	0.150 है०	400.00	60.00
	प्रोत्साहन	0.150 है०	200.00	30.00
10	अन्य कार्य	0.150 है०	700.00	105.00
योग द्वितीय चरण -				4615.68
योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण -				14233.08

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

तृतीय चरण 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है०

1	पौध की लागत	300	पौध	5.50	1650.00
2	पौध ढुलान कार्य	300	पौध	6.00	1800.00
3	पुनः गढ़दे खोदना एवं रोपण कार्य	300	पौध	3.20	960.00
4	गढ़दों में गोबर खाद डालना लागत सहित	300	पौध	1.31	393.00
5	पौधों की शीतकालीन मल्टिंग	300	पौध	1.11	333.00
6	वनीकरण चौकीदार (12 माह)	0.150	है०	468.00	842.40
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.150	है०	310.00	46.50
योग तृतीय चरण -					6024.90

चतुर्थ चरण (रख रखाव कार्य)

क्र.सं.	कार्य का नाम	ईकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.150 है०	468.00	842.40
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.150 है०	310.00	46.50
	योग चतुर्थ चरण -			888.90

पंचम चरण (रख रखाव कार्य)

1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक 12 माह	0.150	है०	468.00	842.40
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	0.150	है०	310.00	46.50
	योग पंचम चरण -				888.90

षष्ठम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.150	है०	468.00	842.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.150	है०	310.00	46.50
	योग षष्ठम चरण –				888.90

सप्तम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.150	है०	468.00	842.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.150	है०	310.00	46.50
	योग सप्तम चरण –				888.90

अष्टम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.150 है०	468.00	842.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.150 है०	310.00	46.50
	योग अष्टम चरण -			888.90

नवम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.150 है०	468.00	842.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.150 है०	310.00	46.50
	योग नवम चरण –			888.90

दशम चरण

1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	0.150 है०	468.00	842.40
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	0.150 है०	310.00	46.50
	योग दशम चरण –			888.90

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

2.19(d)

कुल धनराशि	प्रथम चरण	9617.40
	द्वितीय चरण	4615.68
	तृतीय चरण	6024.90
	चतुर्थ चरण	888.90
	पंचम चरण	888.90
	षष्ठम चरण	888.90
	सप्तम चरण	888.90
	अष्टम चरण	888.90
	नवम चरण	888.90
	दशम चरण	888.90
	कुल योग-	26480.28
	या	26480.00

प्रतिहस्ताक्षरित

प्रभ न्याय कर्ता अधिकारी,
सिविल एवं सीएम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा.

सहायक वन संरक्षक
सिविल एवं सीएम वन प्रभाग,
अल्मोड़ा.

J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

आदेश अधिकारी,
कार्यप्रवर्धन वन क्षेत्र,
अल्मोड़ा.

MUCK DISPOSAL EXCERSISE INDEX

1. Construction of **Jalna to T.R.C. Toli Motor Road under State Sector** Muck Disposal Annexure-I
2. Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Annexure-II



J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.



A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.



E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

ANNEXURE-I

Name of Work:-Construction of Jalna-TRC Toli Motor Road Length-3.00KM

Sl. No.	Material Received from hill side cutting 1/2(2000x3x3)	13500.00	cum.
	40% for swell factor	5400.00	cum.
	Total -	18900.00	cum.
Disposal and use of material			
1	Retaining walls- 1x3x350(1.93+0.60)2x4	5313.00	cum.
2	Breast walls- 1x3x250(0.90+0.60)/2x1.80	1012.50	cum.
3	H.P. filling - 1x3x1/2x350x1x4	2100.00	cum.
4	Const. of Scupper - 1x3x8x37.09	890.16	cum.
5	Soling work - 1x3x1000x4.05x0.12	1458.00	cum.
6	Const. of pucca drain- 1x3x450x0.60x0.60	486.00	cum.
7	wirecreat - 1x3x10x6.75	202.50	cum.
	Total used	11462.16	cum.
	Material disposal by carriage in dumping yard	7437.84	cum.

Location and Quantity of Dabris Disposal

Location of dumping yard	Size of Dumping Yard	Type of Land	Capacity of Dumping Yard (cum)
Km. 1 (Hm.8-10)	40x20x3.5	Nap Land	3850.00
Km. 3 (Hm.2-4)	25x20x3	Nap Land	3600.00
		Total -	7450.00

Location and Quantity of Dabris Disposal

S.No.	Total Dabries	Material Disposal by Cartage	Reused Material for Road Construction	Total Disposal in Dumping Zone	Balance Dabris
1	18900.00	7437.84	11462.16	7437.84	-


सहायक अभियन्ता,
ग्रामीय खण्ड, ए.ओ. नि. वि.
P.D., P.W.D.,
Almora.

अभियन्ता,
ग्रामीय खण्ड, ए.ओ. नि. वि.
असोडा P.D., P.W.D.,
Almora.

2.19(G)

ANNEXURE-II**Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail**

S.No.	Chanage	Name of Land Owner & Village	Land in Hac.	Land in Sqm.	Land area being used to dumping yard (Sqm.)	Longitude	Latitude
1	Km. 1 (Hm.8-10)	Uttarakhand Govt.	0.100	1000.00	1000.00	29°33'6.94"	79°43'36.38"
2	Km. 3 (Hm. 2-4)	Uttarakhand Govt.	0.050	500.00	500.00	29°33'18.88"	79°43'35.21"
		Total -	0.150	1500.0	1500.0		
					0.150 Hec.		


J.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.



A.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.


E.E.
P.D., P.W.D.,
Almora.

कार्य का नाम; राज्य योजना के अन्तर्गत जलना से टी. आर. सी. बोली तक ओवर ग्रॉस का निर्माण 2019(H)



Km-1 (Hm-8-10)

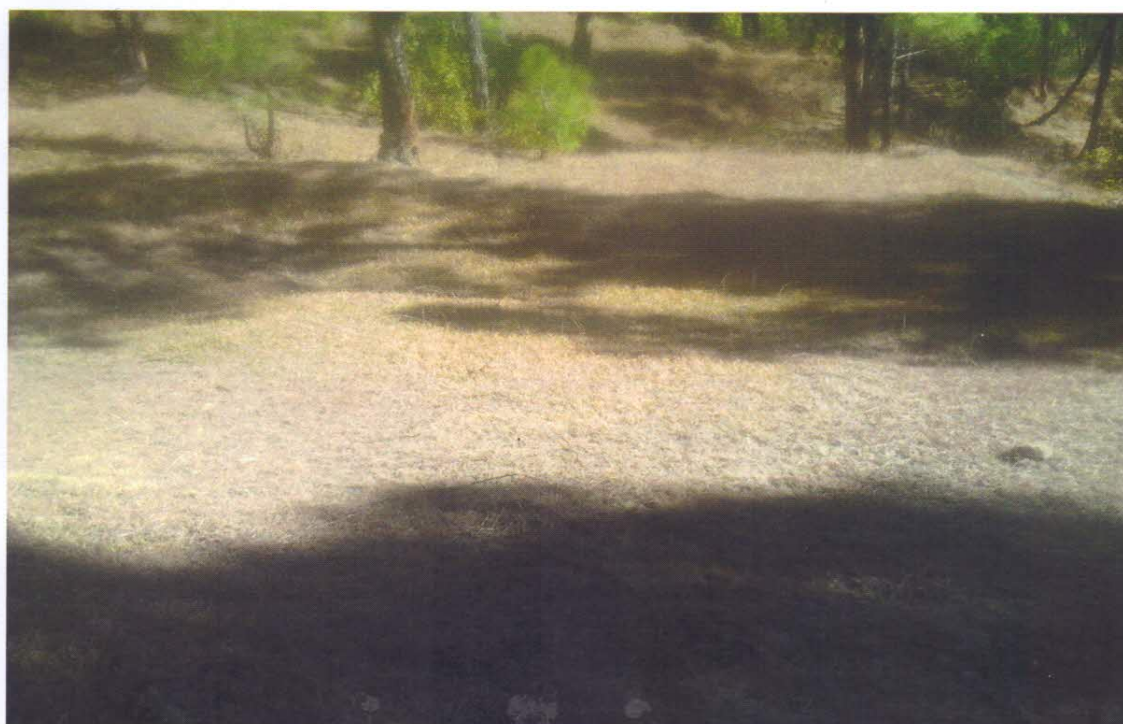

Km-3 (Hm-2-4)

JB

AE

प्रविष्टासी अभियन्ता;
प्रांतीय राड, लो. नि. वि.
स. स. मोडा.


स. स. मोडा

प्रतिहस्ताक्षरित

2019(I)

Muck Disposal Map

Name of work-Jaina To TRC toll MR Lenth 3.00KM

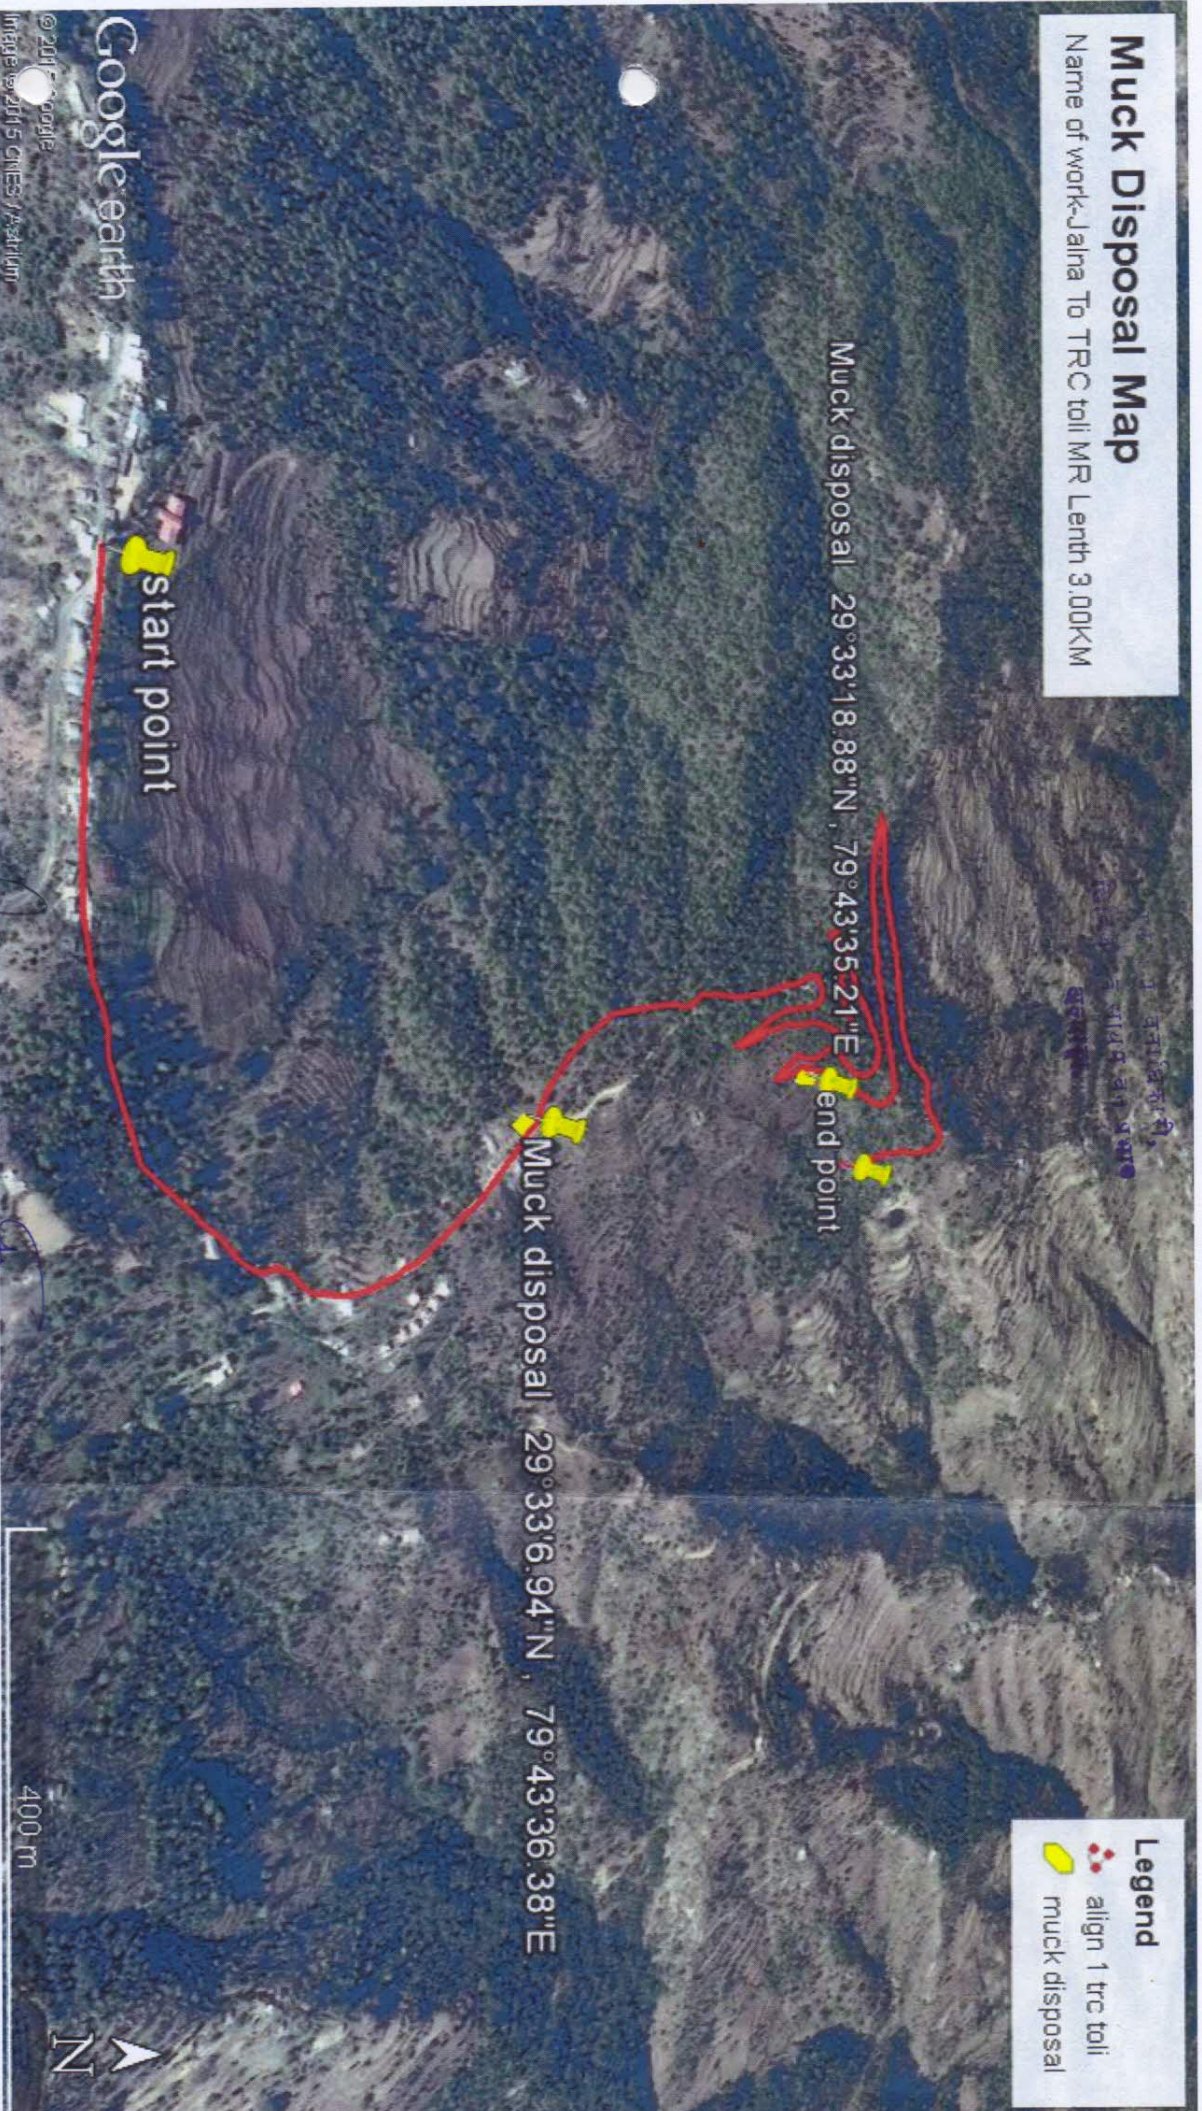

[Signature]

[Signature]

Ab

आविशासी अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो. नि. वि.
अमोडा.

[Signature]

उप जिलाधिकारी
बैती (अमोडा)

अनापत्ति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि उपरोक्त प्रस्तावित मोटर मार्ग के मलवा निस्तारण हेतु लो०नि०वि० द्वारा चयनित की गई राज्य सरकार की भूमि को दिये जाने में राजस्व विभाग को कोई आपत्ति नहीं है। जिसका विवरण निम्न प्रकार है।

ग्राम-तल्ली तोली, पट्टी-उच्यूर, तहसील व जिला-अल्मोड़ा

क्रम सं०	खाता	भूमि की श्रेणी	खेत सं०	कुल क्षेत्र	याचित क्षेत्र
1	126	9(3)ड० / ब०का०आ०	11823 म०	0.190 है०	0.100 है०
		योग		67.058 है०	0.100 है०

ग्राम-मल्ली तोली, पट्टी-उच्यूर, तहसील व जिला-अल्मोड़ा

क्रम सं०	खाता	भूमि की श्रेणी	खेत सं०	कुल क्षेत्र	याचित क्षेत्र
1	2	9(3)ड० / ब०का०आ०	88 म०	0.148 है०	0.050 है०
		योग		8.711 है०	0.050 है०


जिला अधिकारी
जिलाधिकारी
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी सदस्य,
अल्मोड़ा

उप जिलाधिकारी
उप-जिलाधिकारी
जैती (अल्मोड़ा)


राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र-५०१
तहसील/जिला-अल्मोड़ा

राजस्व उपनिरीक्षक
क्षेत्र - लमगड़ा
उप तहसील-लमगड़ा
जिला-अल्मोड़ा


नायब तहसीलदार
लमगड़ा
