

प्रपत्र-49

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


मलवा निस्तारण योजना

प्रपत्र-49.1

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौड़मुन्या किमी 0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी 0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र


मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम विकास विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


वन क्षेत्राधिकारी




प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-49.2


परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी 0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग किमी 0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

:: प्रतिवेदन ::

प्रस्तुत प्राक्कलन रायआगर चौडमुन्या किमी 0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु दिनांक 30.5.2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया, निरीक्षण के समय मार्ग पॉच स्थल सिविल सोयम पॉच स्थल कृषकों की नाप भूमि में चयन किया गया है, जिसके कोडिनेट पोइन्ट कमशः

1- N29°43'54.817 E80°03'32.730 2- N29°43'42.156 E80°03'21.409 3- N29°43'35.058 E80°03'30.728 4- N29°43'33.373 E80°04'0.660 5- N29°43'27.686 E80°4'9.844 6- N29°43'26.954 E80°03'42.982 7- N29°43'23.479 E80°3'41.707 8- N29°43'12.456 E80°3' 54.753 9- N29°42'57.735 E80°04'17.612 10- N29°42'42.310 E80°04'23.387 है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समानान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है, तथा साइड में पत्थर की कुली वॉल बनाये जाने का प्रावधान किया गया है।


अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रु० 18.93... लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे।


कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


अधिसूची अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


वनक्षेत्राधिकारी
पिथौरागढ़



प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-49.3

Name of Work;- Conts. Of Raiagar Chaurmunya km 2 to Bhul ki Adhayali M/R (Km 10.700)

Name of block:- Berinag(Distt.-Pithoragarh)

Summary of Results

- 1- The material recived from side cutting ...141.780..6.6...cum sheet attached on page no. 105 (Muck Disposal estimate)
- 2- The use of recived muck in various item is ...76.19.61.. cum sheet attached on page no. 105 (Muck Disposal estimate)
- 3- The Remaning muck for Dumping 85584.05 cum sheet attached on page no. 105 (Muck Disposal estimate)
- 4- Number of sites needed for the Dumping of muck (number of 10) on page no. 108 (Muck Disposal estimate)
- 5- Cerrying capacity of sites with proper dimensions is on page no. 108 (Muck Disposal estimate)
- 6- Land ownership report nap land page no. 9/ (Muck Disposal estimate)
- 7- Treatment part on page no. 109 (Muck Disposal estimate)

[Signature]

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[Signature]

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[Signature]

Executive Engineer
Rural Works Department
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

[Signature]
वन वनाधिकारी
बरीनाग

[Signature]


प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-49.4

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंग प्लान/प्रमाण-पत्र


प्रमाणित किया जाता है कि जनपद पिथौरागढ़ में प्रधान मन्त्री ग्रामीण सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग (10.700कि०मी०) नव निर्माण में उत्पादित मलवे को उचित प्रक्रियानुसार सुरक्षित स्थान पर डम्पिंग किया जायेगा। मलवा कहीं भी वृक्ष आच्छादित क्षेत्र एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


अधीक्षक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी




प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-49.5

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी 0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी 0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि-

- 1- स्वीकृत मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार ही मक डिस्पोजल का कार्य कराया जायेगा।
- 2- प्रस्तावित डम्पिंग साइट नदी/स्ट्रीम/नाले से दूर स्थित है।



कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)




सहायक अभियन्ता
Asst. Engineer
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)



अधीक्षायी अभियन्ता
Executive Engineer
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0
डीडीहाट (पिथौरागढ़)



वनक्षेत्राधिकारी
वन क्षेत्राधिकारी



प्रभागीय वनाधिकारी

प्रपत्र-49.6

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


मक डिस्पोजल हेतु मानचित्र




जियारफरन्स मप - जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमन्त्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत राईआगर-चौड़मन्या कि०मी० 2 से भूलकी अध्याली मोटर मार्ग निर्माण हेतु

0 0.25 0.5 1 Km

Scale - 1:15,000



80°3'10"E 80°3'20"E 80°3'30"E 80°3'40"E 80°3'50"E 80°4'0"E 80°4'10"E 80°4'20"E 80°4'30"E 80°4'40"E

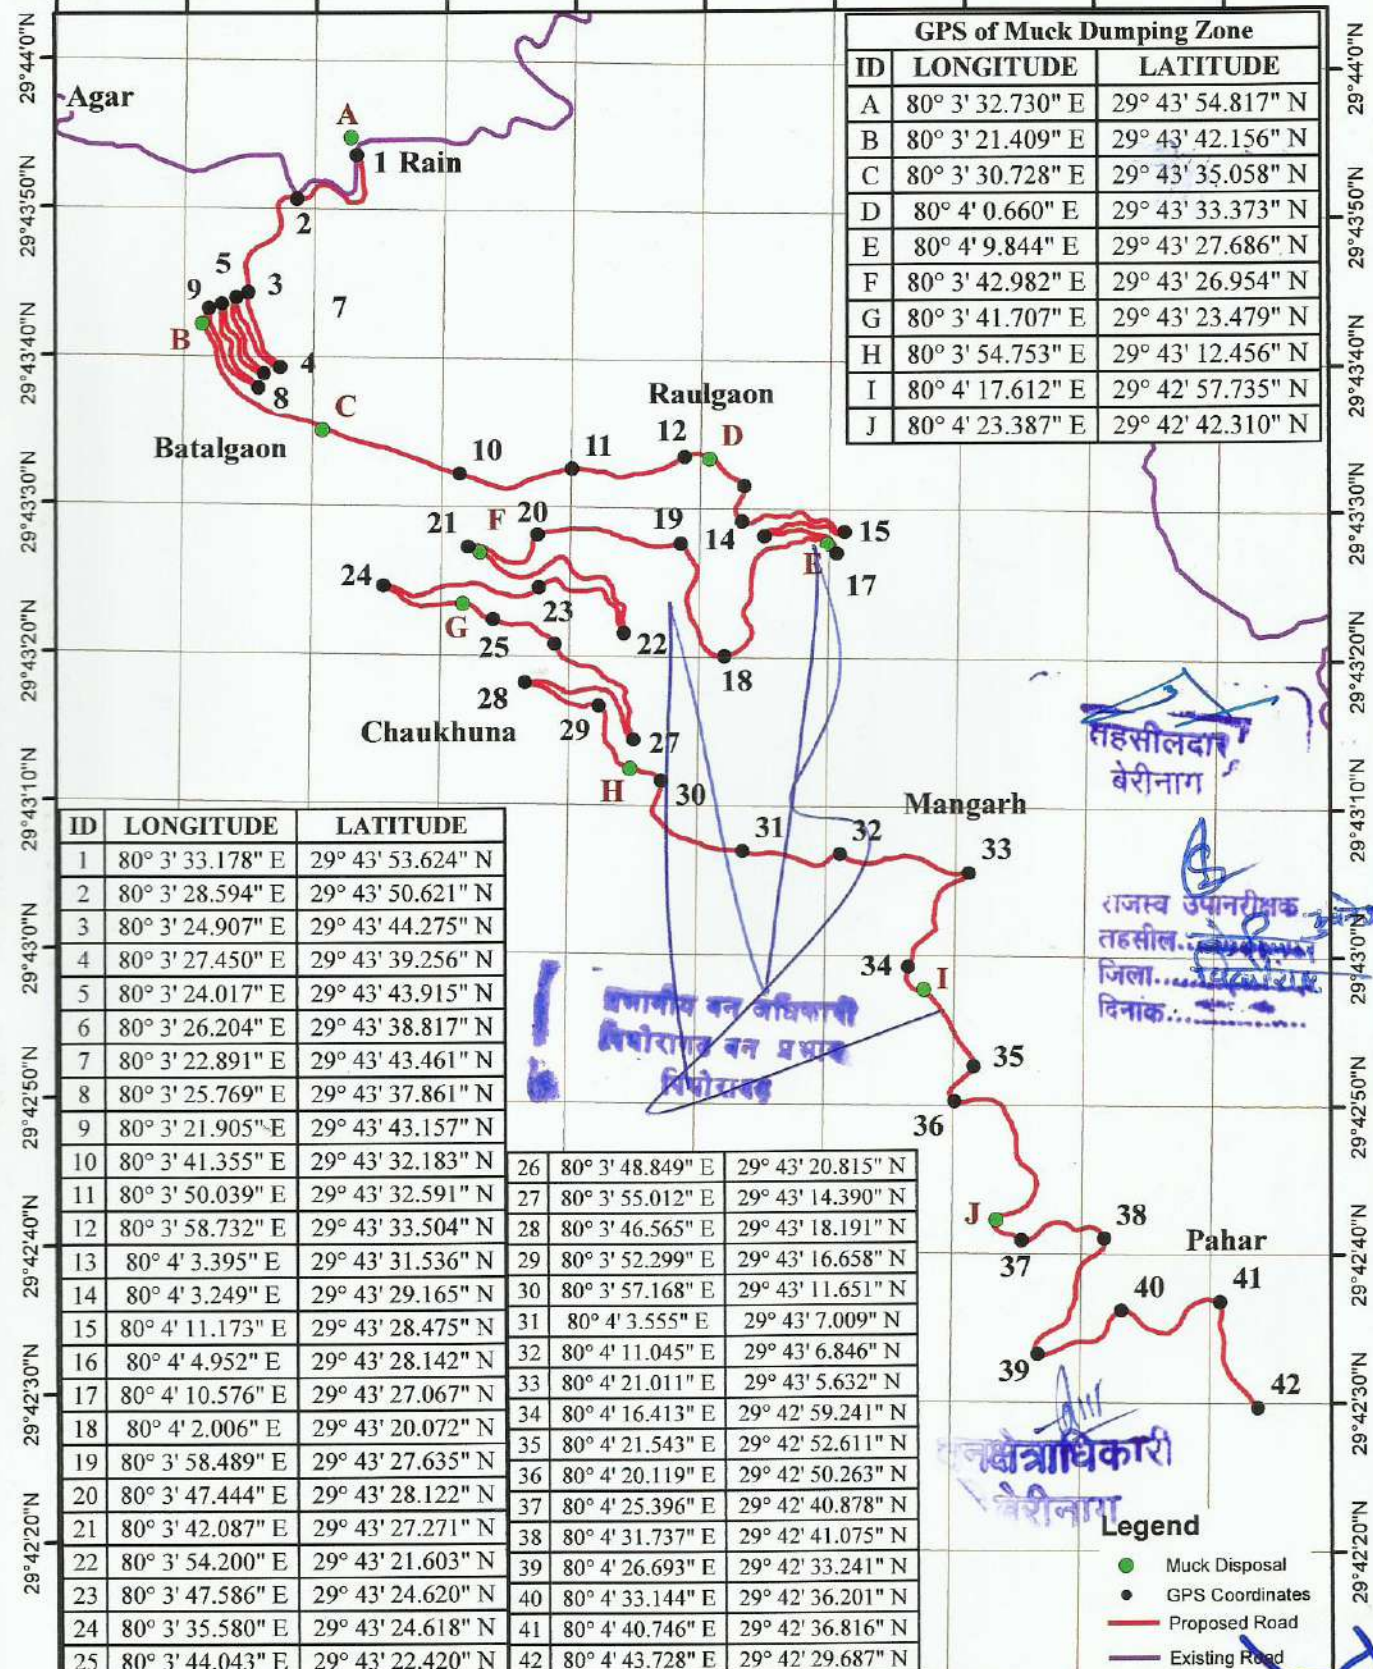

ID	LONGITUDE	LATITUDE
1	80° 3' 33.178" E	29° 43' 53.624" N
2	80° 3' 28.594" E	29° 43' 50.621" N
3	80° 3' 24.907" E	29° 43' 44.275" N
4	80° 3' 27.450" E	29° 43' 39.256" N
5	80° 3' 24.017" E	29° 43' 43.915" N
6	80° 3' 26.204" E	29° 43' 38.817" N
7	80° 3' 22.891" E	29° 43' 43.461" N
8	80° 3' 25.769" E	29° 43' 37.861" N
9	80° 3' 21.905" E	29° 43' 43.157" N
10	80° 3' 41.355" E	29° 43' 32.183" N
11	80° 3' 50.039" E	29° 43' 32.591" N
12	80° 3' 58.732" E	29° 43' 33.504" N
13	80° 4' 3.395" E	29° 43' 31.536" N
14	80° 4' 3.249" E	29° 43' 29.165" N
15	80° 4' 11.173" E	29° 43' 28.475" N
16	80° 4' 4.952" E	29° 43' 28.142" N
17	80° 4' 10.576" E	29° 43' 27.067" N
18	80° 4' 2.006" E	29° 43' 20.072" N
19	80° 3' 58.489" E	29° 43' 27.635" N
20	80° 3' 47.444" E	29° 43' 28.122" N
21	80° 3' 42.087" E	29° 43' 27.271" N
22	80° 3' 54.200" E	29° 43' 21.603" N
23	80° 3' 47.586" E	29° 43' 24.620" N
24	80° 3' 35.580" E	29° 43' 24.618" N
25	80° 3' 44.043" E	29° 43' 22.420" N

26	80° 3' 48.849" E	29° 43' 20.815" N
27	80° 3' 55.012" E	29° 43' 14.390" N
28	80° 3' 46.565" E	29° 43' 18.191" N
29	80° 3' 52.299" E	29° 43' 16.658" N
30	80° 3' 57.168" E	29° 43' 11.651" N
31	80° 4' 3.555" E	29° 43' 7.009" N
32	80° 4' 11.045" E	29° 43' 6.846" N
33	80° 4' 21.011" E	29° 43' 5.632" N
34	80° 4' 16.413" E	29° 42' 59.241" N
35	80° 4' 21.543" E	29° 42' 52.611" N
36	80° 4' 20.119" E	29° 42' 50.263" N
37	80° 4' 25.396" E	29° 42' 40.878" N
38	80° 4' 31.737" E	29° 42' 41.075" N
39	80° 4' 26.693" E	29° 42' 33.241" N
40	80° 4' 33.144" E	29° 42' 36.201" N
41	80° 4' 40.746" E	29° 42' 36.816" N
42	80° 4' 43.728" E	29° 42' 29.687" N

सि.एस.

Asst. Engineer

Executive Engineer Rural Works Department P.M.G.S.Y. D.D.

Name of Work : Construction of Raigar - Chaurmunya Km 2 to Bhool ki Adhayali (Stage - I) Motor road in K.M. 10.700 under PMGSY.

Block - Berinag

Dist.-Pithoragarh

Disposal and use of cutting material

S/No	Description of Work	Quantity	Unit
	Material recived from hill side cutting	141780.66	Cum
<u>Disposal and use of Material</u>			
1	Qty. of materials to be disposed along the road side add bulkage (40% of hill side cutting)	56712.26	Cum
2	filling on road	0.00	Cum
3	Construction of coolie walling	898.80	Cum
4	R.R. Stone Mesonary laid in 1:5	6164.83	Cum
5	R.R. Stone Mesonary laid in Dry	6315.35	Cum
6	Plume Masonary 40% Stone	0.00	Cum
7	Hand Packed Stone Filling	4072.36	Cum
8	Construction of Wire Create	2014.36	Cum
9	Construction of back & refence pillar (0.036+0.012) cum/no	18.65	Cum
	TOTAL	76196.61	Cum

Quantity of Muck to be disposedat dumping places= (Material Recevied - Material used) cum
 141780.66 - 76196.61
 Total = 65584.05

कनिष्ठ अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
 डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
 डीडीहाट (पिथौरागढ़)

अधिकांश अभियन्ता
 ग्रामीण निर्माण विभाग,
 पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
 डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Estimate for Muck Disposal									
Name of Work: Construction of Raiagar Chaurmunya km 2 to Bhul ki Adhayali M/R,(Stage-I)									
Name of Block:Berinag(Pithoragarh)					Length:10-700 KM				
Detail Of Measurment									
Sr.No.	Item Of Work	No.			Length	Width	Height	Quantity	Unit
1).	Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge								
1	Ahead 50 m Chainage 0.000	1	x	1	25.00	1.50	0.50	11.25	cum
2	Chainage1.300km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	11.25	cum
3	Chainage1.975km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
4	Chainage3.125km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
5	Chainage 4.300km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
6	Chainage4.950km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
7	Chainage6.125km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
8	Chainage7.200km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
9	Chainage 8.425km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
10	Chainage9.700km	1	x	1	25.00	1.50	0.50	18.75	cum
	TOTAL							172.50	cum
2).	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 8 Gauge GI wire conforming to IS:280 and IS:4826 in 150 mm x 150 mm mesh(wovendiagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25kg each as per drawing and technical specifications Clause 1301								
1	Ahead 50 m Chainage 0.000	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
2	Chainage1.300km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
3	Chainage1.975km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
4	Chainage3.125km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
5	Chainage 4.300km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
6	Chainage4.950km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
7	Chainage6.125km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
8	Chainage7.200km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
9	Chainage 8.425km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
10	Chainage9.700km	1	x	1	25.00	1.50	1.50	56.25	cum
	2nd	1	x	1	25.00	1.25	1.50	46.88	cum
	TOTAL							1031.25	cum
3).	Construction of Coolie-Wall for making dumping-yard along road side.	10.70	x	10	70.00	0.50	0.60	2247.00	cum

Estimate for Muck Disposal					
Name of Work: Construction of Raiagar Chaurmunya km 2 to Bhul ki Adhayali M/R,(Stage-I)					
Name of Block:Berinag(Pithoragarh)			Length:2.935 KM		
Bill Of Quantity					
Sr.No.	Item Of Work	Quantity	Unit	Rate (D.P.R.)	Amount
1).	Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge	172.50	Cum	288.00	49680.00
2).	Providing and laying of boulder apron laid in wire crates with 4 mm dia GI wire conforming to IS:280 and IS: 4826 in 100 mm x 100 mm mesh (woven diagonally) including 10 per cent extra for laps and joints laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each (crate size 3.00m * 1.50m* 1.25m) as directed by Engineer-in-charge and MORD Specification for Rural Roads 2014.	1031.25	Cum	2154.90	2222240.63
3).	Construction of Coolie Wall for making dumping-yard.	2247.00	Cum	1166.30	2620676.10
Total					4892596.73
				Say	48.93
					Lacks

प्रमाणित वन अधिकारी
विपरीगढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


अधिसारी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)
Rural Works Department
P.M.G.S.P. Didihat

Name of Work: Construction of Raiagar Chaurmunya km 2 to Bhul ki Adhayali M/R,(Stage-I)									
Name of Block:Berinag(Pithoragarh)						Length:10.700 KM			
Carrying Capacity Of Wire-Crate									
Sr.No.	Chainage of Wire-Crate	No.			Size of catchment-area of wire-crate				
	Ahead 50 m Chainage				Length(mt)	Width(mt)	Height(mt)	Quantity	Unit
1	0.000	1	x	0.5	30.00	20.00	2.70	810.00	cum
		1	x	1	30.00	20.00	8.00	4800.00	cum
2	Chainage1.300km	1	x	0.5	30.00	25.00	2.70	1012.50	cum
		1	x	1	30.00	25.00	8.00	6000.00	cum
3	Chainage1.975km	1	x	0.5	30.00	20.00	2.70	810.00	cum
		1	x	1	30.00	20.00	8.00	4800.00	cum
4	Chainage3.125km	1	x	0.5	35.00	25.00	2.70	1181.25	cum
		1	x	1	35.00	25.00	8.00	7000.00	cum
5	Chainage 4.300km	1	x	0.5	30.00	20.00	2.70	810.00	cum
		1	x	1	30.00	20.00	8.00	4800.00	cum
6	Chainage4.950km	1	x	0.5	35.00	25.00	2.70	1181.25	Cum
		1	x	1	35.00	25.00	8.00	7000.00	Cum
7	Chainage6.125km	1	x	0.5	30.00	22.00	2.70	891.00	Cum
		1	x	1	30.00	22.00	8.00	5280.00	Cum
8	Chainage7.200km	1	x	0.5	35.00	20.00	2.70	945.00	Cum
		1	x	1	35.00	20.00	8.00	5600.00	Cum
9	Chainage 8.425km	1	x	0.5	30.00	22.00	2.70	891.00	Cum
		1	x	1	30.00	22.00	8.00	5280.00	Cum
10	Chainage9.700km	1	x	0.5	30.00	24.00	2.70	972.00	Cum
		1	x	1	30.00	24.00	8.00	5760.00	Cum
		Total						65824.00	Cum

Carrying Capacity Of Wire-Crate = 65824.00 cum
Quantity of muck to be disposed at dumping places = - 65584.05
balance = 239.95 cum


कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०,पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०,पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)


अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०,पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट(पिथौरागढ़)
P.M.G.S.Y. District

प्रपत्र-49.7

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

प्रमाण पत्र


- 1- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में दरों का प्राविधान लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड के वर्तमान पैड्यूल पर आधारित है ।
- 2- प्रमाणित किया जाता है कि जिन मदों के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड में कोई पैड्यूल ऑफ रेट नहीं है उनके लिये जिन दरों का प्राविधान किया गया है वह वर्तमान बाजार भाव मजदूरी सामग्री एवं ढुलान पर आधारित है जिनका सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है ।
- 3- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में दरों का विष्लेषण लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड के मानक दर विष्लेषण पर आधारित है ।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में जो ब्लाक दर ली गयी हैं वे मेरी जानकारी में सही हैं ।



कनिष्ठ अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)





सहायक अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)



अधिसासी अभियन्ता
ग्रामीण निर्माण विभाग,
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

Typical Drawing Dumping Zone

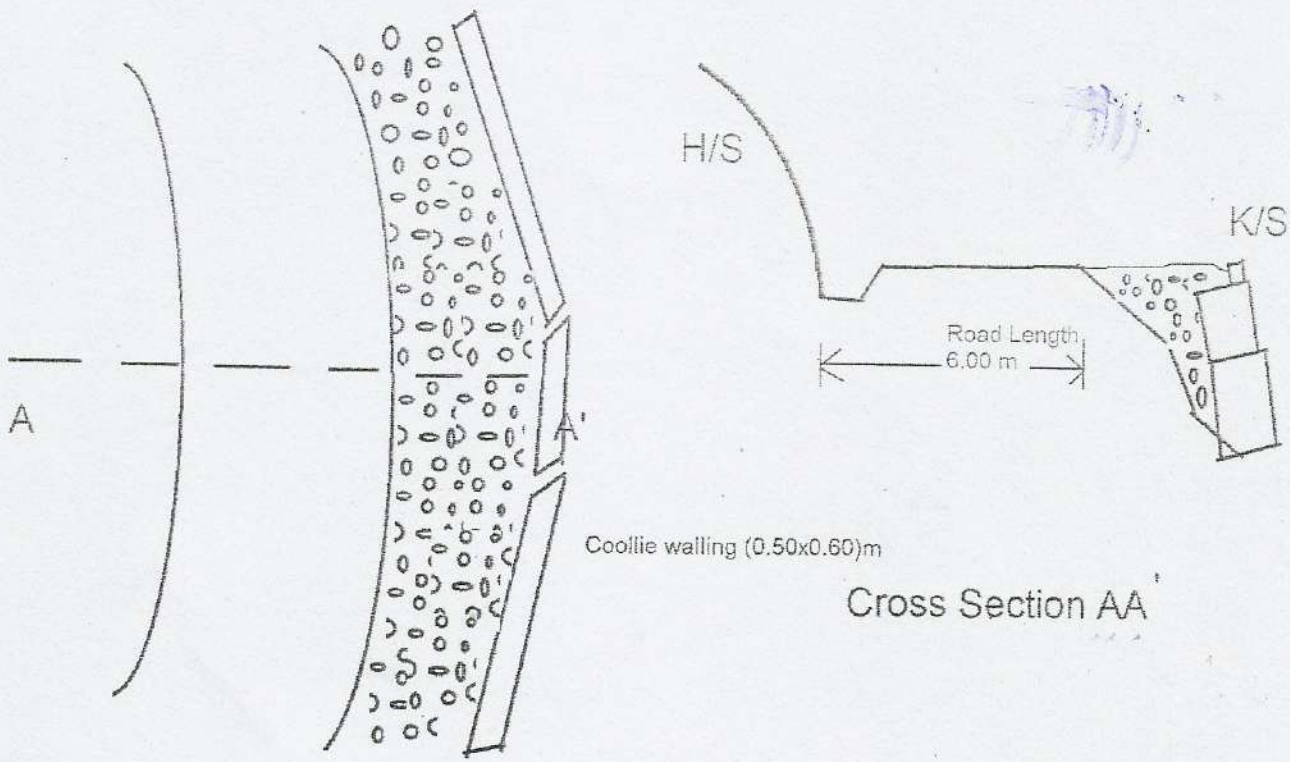


JE

Plan



AE
Asth. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y.
District


EE
Executive Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y. District


परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।




km 0/0 to ahead 50 m

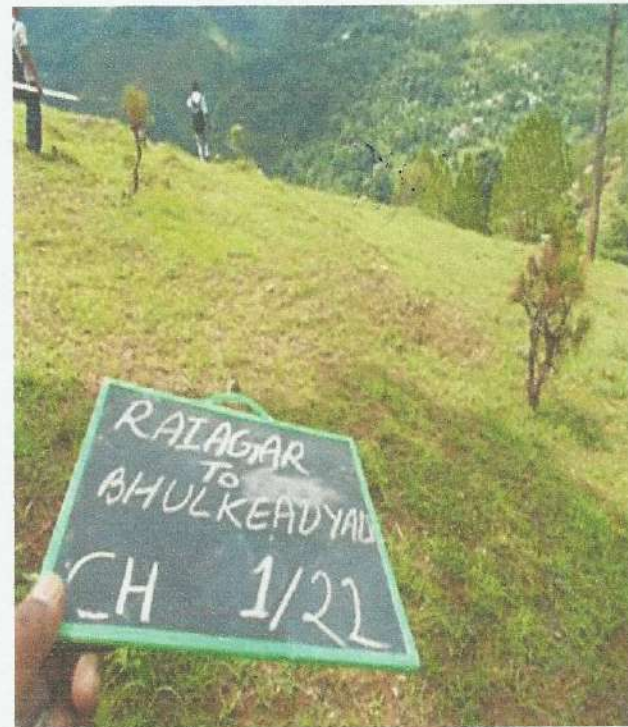

km 1.300

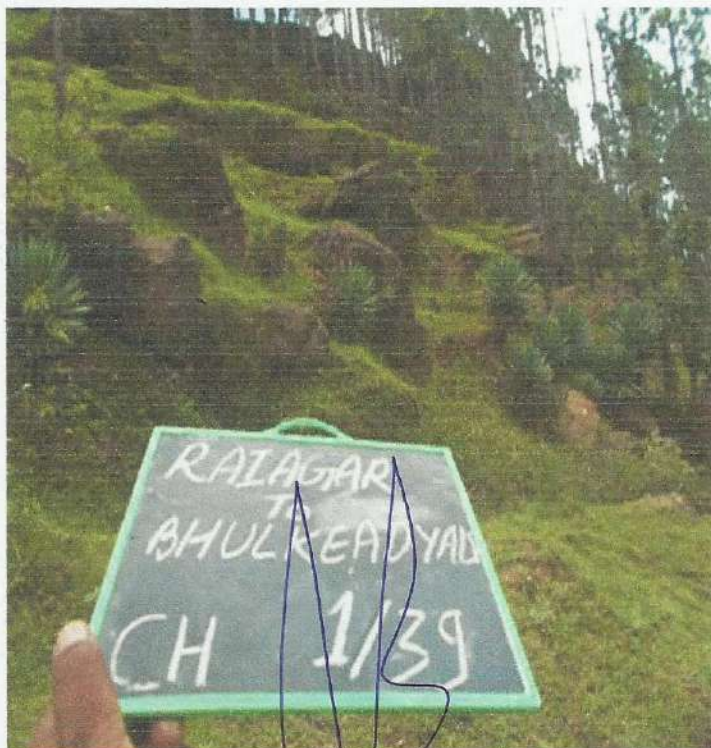

km 1.975 m

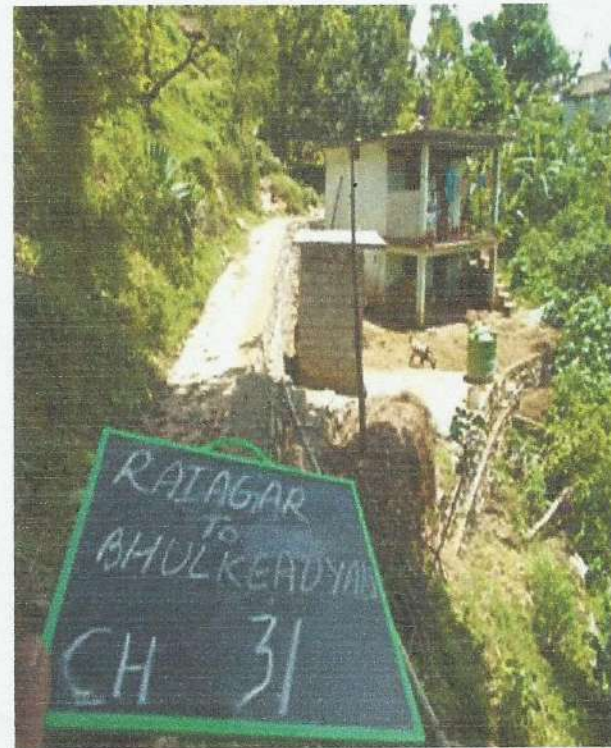


km 3.125


प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन प्रभाग
पिथौरागढ़

Executive Engineer
Rural Works Department
Pithoragarh


परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
 रायआगर चौडमुन्या किमी 0 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
 किमी 0 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

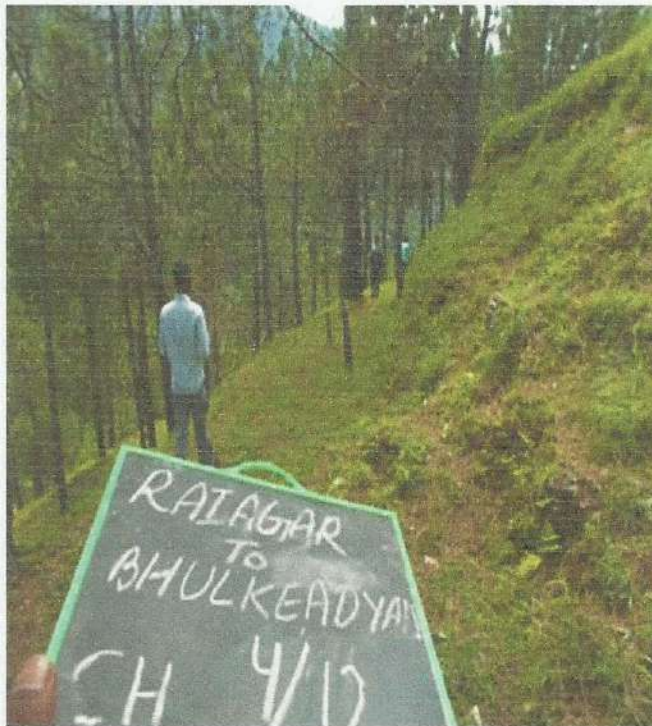


Km 4.300

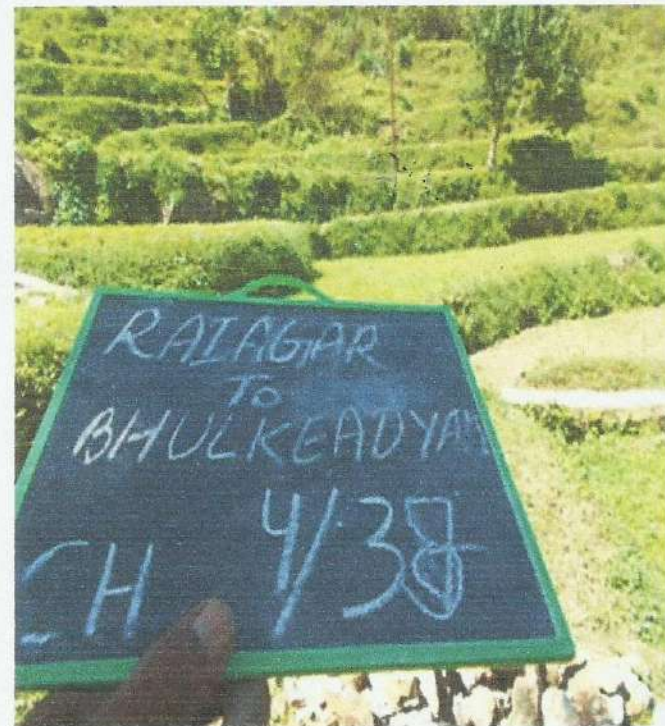

km 4.950

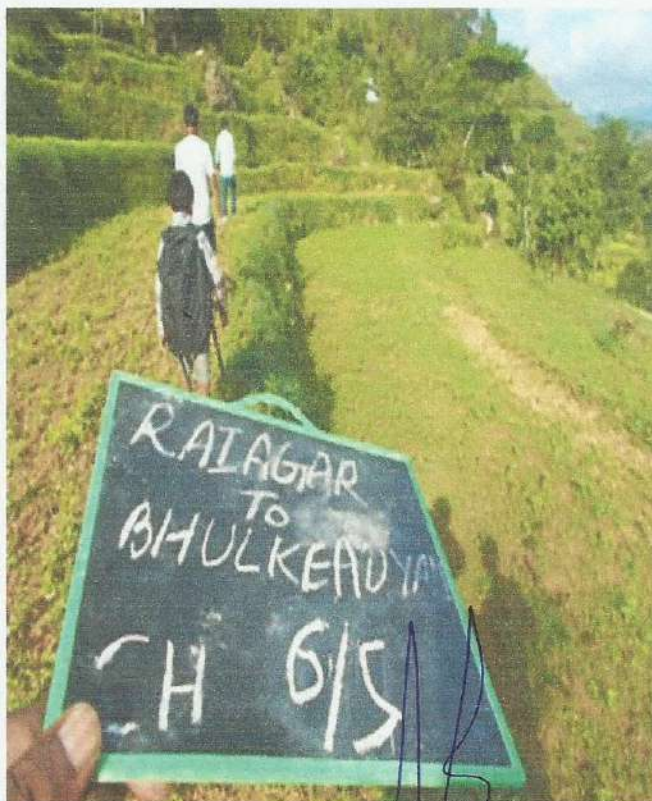

Km 6.125

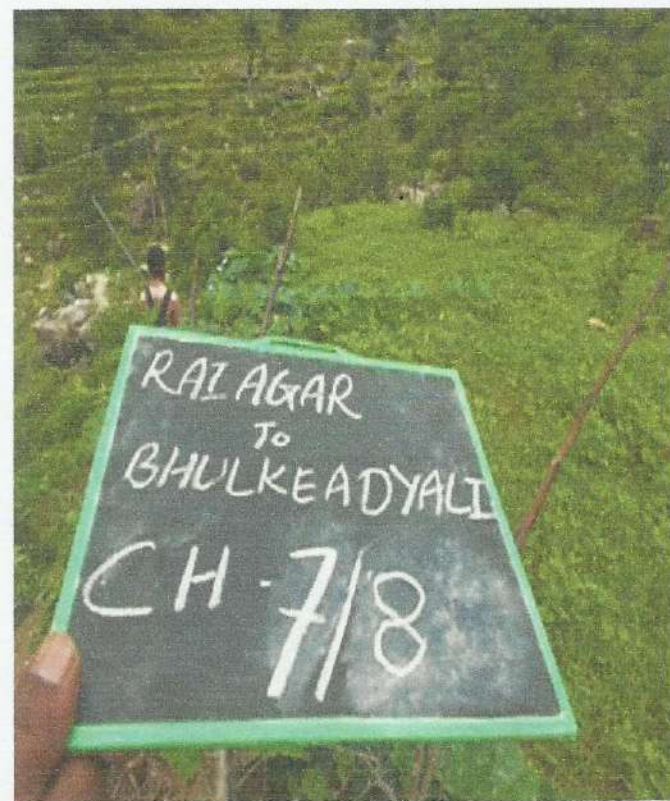

km 7.200


प्रमाणित वन अधिकारी
 पिथौरागढ़ वन प्रभाग
 पिथौरागढ़

[Signature]


[Signature]
 Asst Engineer

[Signature]
 Executive Engineer
 Rural Works Department

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,
रायआगर चौडमुन्या किमी० 2 से भूल की अध्याली मोटर मार्ग
किमी० 0.00 से 10.700 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

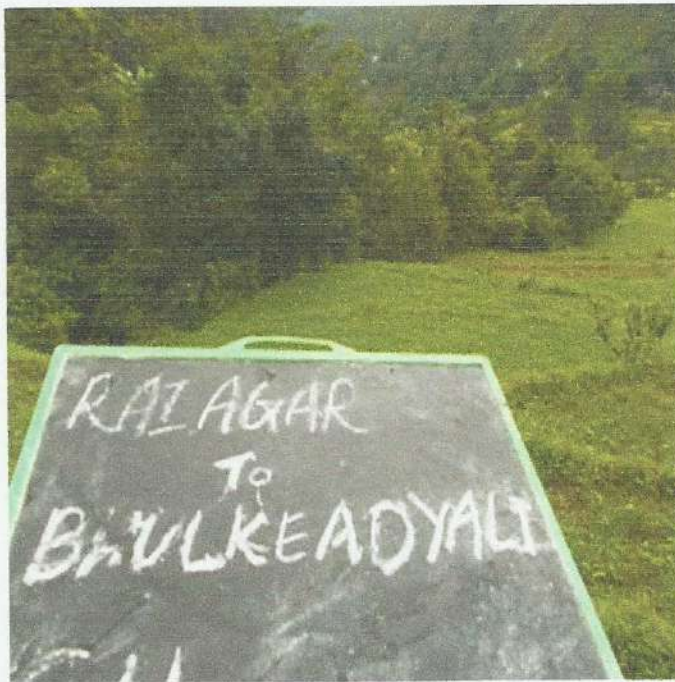

Km 8.425

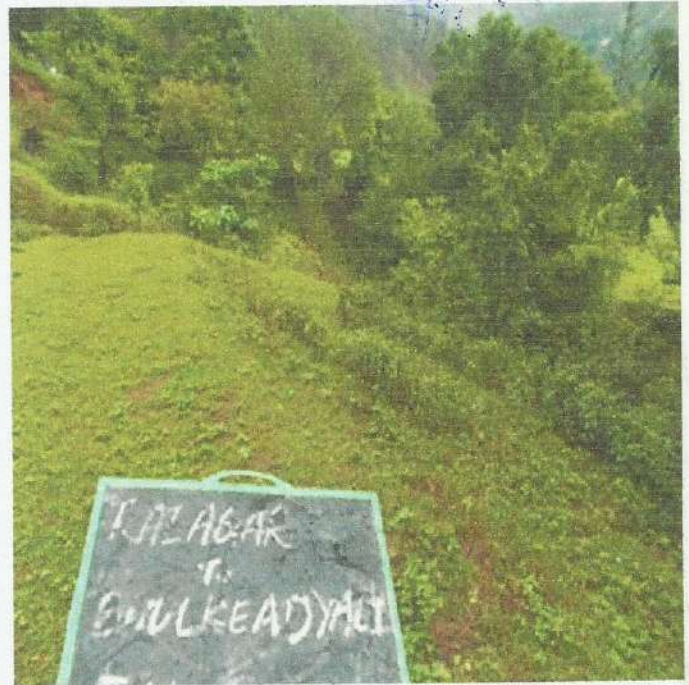

km 9.700

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Asst. Engineer
R.E.S. P.M.G.S.Y.
Dihlat

[Handwritten signature]
Executive Engineer
Rural Works Department
P.G.S.Y. Dihlat

प्रजातीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन विभाग
पिथौरागढ़
