

2.19

कार्य का नाम – मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460 / 2020 के अन्तर्गत जनपद  
पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव  
प्राथमिक विद्यालय ठठोली, सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य।  
(लम्बाई 5.00 कि०मी०)

## Muck Disposal Plan

अनिल कनौजिया

  
-1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० लो० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

बी०के०सिन्हा

  
1-6-2021  
अधिसासी अभियन्ता  
बस्पाई खण्ड, लो०नि०वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

2.19

## Summary of Muck Disposal Plan

कार्य का नाम – मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली, सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

- 1 - The Material received from Hill Side cutting
- 2- The use of received muck in various Item.
- 3- The Remaining muck for Dumping
- 4- Number of site needed for dumping of muck
- 5- Carrying capacity of site with latitude & longitude
- 6- Land required For muck Disposal ( Naap Land )
- 7- Treatment Plan on page no. ( Muck Disposal estimate )

अनिल कनौजिया

1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० लो० नि० वि०  
वेरीनाथ (पिथौरागढ़)

बी०के०सिन्हा

1-6-2021  
अधिकासा अभियन्ता  
जस्पाई खण्ड, लो०नि०वि०  
वेरीनाथ (पिथौरागढ़)

कार्य का नाम - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

| Location of Dumping Yard | Size of Dumping Yard |       |      | Type of Land | Capacity of dumping Yard | Name of Land owner and village | Land In Hectare | Land/Area Being used for dumping (sqm.) | Longitude       | Latitude        |
|--------------------------|----------------------|-------|------|--------------|--------------------------|--------------------------------|-----------------|-----------------------------------------|-----------------|-----------------|
|                          | L                    | B     | H    |              |                          |                                |                 |                                         |                 |                 |
| KM 1 HM 0-2              | 60.00                | 18.00 | 3.00 | Nap Land     | 3240.00                  | Attached                       | 0.1080          | 1080.00                                 | 80°0'32.511" E  | 29°44'29.720" N |
| KM 1 HM 6-8              | 42.00                | 15.00 | 3.00 | Nap Land     | 1890.00                  | Attached                       | 0.0630          | 630.00                                  | 80°0'14.015" E  | 29°44'35.599"N  |
| KM 3 HM 6-8              | 75.00                | 18.00 | 3.00 | Nap Land     | 4050.00                  | Attached                       | 0.1350          | 1350.00                                 | 80°0'2.443" E   | 29°44'26.709"N  |
| KM 4 HM 2-4              | 54.00                | 12.00 | 3.00 | Nap Land     | 1944.00                  | Attached                       | 0.0648          | 648.00                                  | 79°59'47.782" E | 29°44'6.271"N   |
| KM 5 HM 6-8              | 54.00                | 18.00 | 3.00 | Nap Land     | 2916.00                  | Attached                       | 0.0972          | 972.00                                  | 79°59'27.920" E | 29°43'59.504"N  |
|                          |                      |       |      | Total        | 14040.00                 |                                | 0.468           | 4680.00                                 |                 |                 |

स्वरज आर्या

कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

अनिल कनौजिया

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

वी० के० सिन्हा

अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

2.19  
प्रपत्र - 40.60

### Detail of Vegetation Plantation area in muck disposal work

कार्य का नाम - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

| S.no. | Chainage of area | Length | Width | Land (Hectare) | Area (sqm.) | Longitude       | Latitude        |
|-------|------------------|--------|-------|----------------|-------------|-----------------|-----------------|
| 1     | KM 1 HM 0-2      | 60.00  | 18.00 | 0.1080         | 1080.00     | 80°0'32.511" E  | 29°44'29.720" N |
| 2     | KM 1 HM 6-8      | 42.00  | 15.00 | 0.0630         | 630.00      | 80°0'14.015" E  | 29°44'35.599"N  |
| 3     | KM 3 HM 6-8      | 75.00  | 18.00 | 0.1350         | 1350.00     | 80°0'2.443" E   | 29°44'26.709"N  |
| 4     | KM 4 HM 2-4      | 54.00  | 12.00 | 0.0648         | 648.00      | 79°59'47.782" E | 29°44'6.271"N   |
| 5     | KM 5 HM 6-8      | 54.00  | 18.00 | 0.0972         | 972.00      | 79°59'27.920" E | 29°43'59.504"N  |
|       | Total            |        |       | 0.468          | 3708.00     |                 |                 |

स्वरज आर्या

कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग  
1-6-2021

अनिल कर्तोनिया

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग  
1-6-2021

वी०के० सिन्हा

अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग  
1-6-2021

2.19

| S.no. | Total Debries (for 5 KM) | Material to be Disposed by cartage | Material used for road construction | Total Disposal in Dumping zone | Balance Debries |
|-------|--------------------------|------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------------|-----------------|
| 1     | 50625.00                 | 14002.06                           | 36622.94                            | 14002.06                       | 0.00            |

सुरज आर्ष

1-6-2021  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थायी खाण्ड  
बेरीनाग

अनिल कनौजिया

1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अस्थायी खाण्ड  
बेरीनाग

वी.के. सिन्हा

1-6-2021  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थायी खाण्ड  
बेरीनाग

2.19  
प्रपत्र -

कार्य का नाम - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

| Detail of Measurement |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |       |        |       |              |               |             |
|-----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|-------|--------|-------|--------------|---------------|-------------|
| S.No.                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                                   | N0 |   |       | Length | Width | H/D          | Quantity      | Unit        |
| 1                     | Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specifiction |    |   |       |        |       |              |               |             |
|                       | KM 1 HM 0-2                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | x | 20.00 | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 45.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | x | 6.00  | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 27.00         | cum.        |
|                       | KM 1 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | x | 14.00 | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 31.50         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | x | 5.00  | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 22.50         | cum.        |
|                       | KM 3 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | x | 25.00 | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 56.25         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | x | 6.00  | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 27.00         | cum.        |
|                       | KM 4 HM 2-4                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | x | 18.00 | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 40.50         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | x | 4.00  | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 18.00         | cum.        |
|                       | KM 5 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1  | x | 18.00 | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 40.50         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               | 2  | x | 6.00  | 3.00   | 1.50  | 0.50         | 27.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                               |    |   |       |        |       | <b>Total</b> | <b>335.25</b> | <b>cum.</b> |

स्वरज आर्या

1-6-2021  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

अनिल कर्गोजिया

1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

वीरेंद्र सिंह

1-6-2021  
अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

2.19

प्रपत्र - 40.20

कार्य का नाम - मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठोली, सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

| Detail of Measurement |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |    |        |       |              |                |             |
|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---|----|--------|-------|--------------|----------------|-------------|
| S.No.                 | Description                                                                                                                                                                                                                                                  | N0 |   |    | Length | Width | H/D          | Quantity       | Unit        |
| 1                     | Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG |    |   |    |        |       |              |                |             |
|                       | KM 1 HM 0-2                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | x | 20 | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 270.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | x | 6  | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 162.00         | cum.        |
|                       | KM 1 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | x | 14 | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 189.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | x | 5  | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 135.00         | cum.        |
|                       | KM 3 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | x | 25 | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 337.50         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | x | 6  | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 162.00         | cum.        |
|                       | KM 4 HM 2-4                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | x | 18 | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 243.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | x | 4  | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 108.00         | cum.        |
|                       | KM 5 HM 6-8                                                                                                                                                                                                                                                  | 2  | x | 18 | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 243.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              | 4  | x | 6  | 3.00   | 1.50  | 1.50         | 162.00         | cum.        |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                              |    |   |    |        |       | <b>Total</b> | <b>2011.50</b> | <b>cum.</b> |

स्वरज आर्या

कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

अनिल कनौजिया

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

वी०के० सिन्हा

अधिसासी अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

2.19

## BILL OF QUANTITY

कार्य का नाम – मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

| S.NO. | ITEMS                                                                                                                                                                                                                                                                          | QTY     | UNIT | RATE    | AMOUNT     |
|-------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|------|---------|------------|
| 1     | Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification | 335.25  | cum  | 357.20  | 119751.30  |
| 2     | Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders. as per direction of Engineer-in- charge. (As per PWD Uttarakhand specifications) GI wire 8 gauge BWG                   | 2011.50 | cum  | 1797.50 | 3615671.25 |
|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                |         |      | Total   | 3735422.55 |

रमेश आर्या

कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

अनिल कर्नौजिया

सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

बी०के० सिन्हा

अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

2.19

**SUMMARY OF ESTIMATED COST**

| कार्य का नाम – मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) |                                                                                                                                                                                                                                                 |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| S.No.                                                                                                                                                                                                                                           | Description of work                                                                                                                                                                                                                             |            |
| 1                                                                                                                                                                                                                                               | कार्य का नाम – मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली,सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०) | 3735422.55 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | S.G.S.T. 6%                                                                                                                                                                                                                                     | 224125.35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | C.G.S.T. 6%                                                                                                                                                                                                                                     | 224125.35  |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Total                                                                                                                                                                                                                                           | 4183673.26 |
|                                                                                                                                                                                                                                                 | Say                                                                                                                                                                                                                                             | 41.84 LAKH |

**CHECKED & CORRECTED****अनिल कनौजिया**

1-6-2021  
 Assistant Engineer  
 Temporary Division  
 P.W.D. Berinag

Temporary Division  
 P.W.D. Berinag

**वी० के० सिन्हा**

1-6-2021  
 Executive Engineer  
 Temporary Division  
 P.W.D. Berinag

219

प्रपत्र - 40

कार्य का नाम - मा0 मुख्यमंत्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठोली,सरपौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
|-----|--------------------------------------------------------------|-----|---|-----|---------|------------------|-------|---------------------|---------------|
| 1   | Material received from Hill side cutting                     | 1   | x | 1/2 | 1000    | 6.00             | 2.7   | 8100.00             | cum.          |
|     | Add Swell factor for soil 25%                                |     |   |     |         |                  |       | 2025.00             | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total (for 1 KM)    | 10125.00 cum. |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total (for 5.00 KM) | 50625.00 cum. |
|     | Disposal and use of Material                                 |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
| 1   | Retaining/ breast wall/culvert                               |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
| i   | Retaining Wall                                               | 1   | x | 1   | 350.00  | (1.93+0.6)/2     | 4.00  | 1778.00             | cum.          |
| ii  | Breast wall                                                  | 1   | x | 1   | 275.00  | (0.9+0.6)/2      | 1.80  | 371.25              | cum.          |
| iii | Construction of culvert                                      | 2   | x | 4   | 7.00    | (1.10+0.60)/2    | 1.65  | 78.54               | cum.          |
| iv  | Causway                                                      | 1   | x | 4   | 12.00   | 6.00             | 0.20  | 57.60               | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 2285.39 cum.  |
| 2   | HP Stone filling                                             |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
| i   | Culvert                                                      | 2   | x | 4   | 7.00    | (1.00+0.60)/2    | 1.10  | 49.28               | cum.          |
| ii  | retaining wall                                               | 1   | x | 1/2 | 350     | 1.20             | 4.00  | 840.00              | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 889.28 cum.   |
| 3   | Construction of Wire create                                  |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
| i   | Wire crates for Dumping zone                                 | 1   | x | 60  | 3       | 1.50             | 1.50  | 405.00              | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 405.00 cum.   |
| 4   | WBM grading 1                                                | 1   | x | 1   | 1000.00 | 4.05             | 0.10  | 405.00              | cum.          |
| 5   | WBM grading 2                                                | 1   | x | 1   | 1000.00 | 3.75             | 0.075 | 281.25              | cum.          |
| 6   | WBM grading 3                                                | 1   | x | 1   | 1000.00 | 3.75             | 0.075 | 281.25              | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 967.50 cum.   |
| 7   | Construction of embankment with material obtain from roadway |     |   |     |         |                  |       |                     |               |
| i   | Super Elevation                                              | 0.5 | x | 15  | 30.00   | 6.00             | 0.35  | 472.50              | cum.          |
| ii  | Pattri Filling                                               | 1   | x | 2   | 1000.00 | 1.50             | 0.20  | 600.00              | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 1072.50 cum.  |
| 8   | Coolie Wall                                                  | 1   | x | 1   | 1000.00 | 0.60             | 0.40  | 240.00              | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Total               | 240.00 cum.   |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | G.Total             | 5859.67 cum.  |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  |       | Swelling Factor 25% | 1464.92 cum.  |
|     | Total Used (for 1 KM)                                        |     |   |     |         | Grand Total      |       | 7324.59             | cum.          |
|     | Total Used (for 5 KM)                                        |     |   |     |         | Grand Total (B)  |       | 36622.94            | cum.          |
|     |                                                              |     |   |     |         |                  | Say   | 72%                 |               |
|     | Muck to be disposed by cartage (Per KM)                      |     |   |     |         |                  |       | 2800.41             | cum.          |
|     | Muck to be disposed by cartage (for 5 KM)                    |     |   |     |         | (2800.41 x 5.00) |       | 14002.06            | cum.          |

अनिल कनौजिया

स्वरज आर्या

ज.६.१-६-२१

कनिष्ठ अभियन्ता

१-६-२०२१  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० लो० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

वी० के० सिन्हा

१-६-२०२१  
अधिसासो अभियन्ता  
बल्वाई बण्ड, पो० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

2.19

## Certificate of Muck Disposal Plan

कार्य का नाम – मा0 मुख्यमन्त्री घोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राममंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली, सस्पौडा के लिये मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

The proposed estimate has been prepared for disposal of muck for the construction of Ram mandir to siradi primary school thatholi , saspoda motor road ( length 5.00 km) joint Inspection of site selection of land for muck disposal has been caried on ..... Five places have been selected with consent of the people for private land All these places are located near the proposed road. Wire crate for muck disposal will be fixed parallel to the road as far as possible. Farmers have given No objection certificate for allowing their land for making dumping yard for muck disposal.

An Estimate of **Rs. 41.84 Lacs** has been prepared for disposing of muck obtained during the construction of Road . These work will be carried out as proposed in the estimate during the muck will not be disposed in forest covered with trees water resources/ bodies to avoid loss of environment construction of road.

स्वरज आर्या

1-6-21  
कनिष्ठ अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

अनिल कनौजिया

1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग


बी०के० सिन्हा

1-6-2021  
अधिशाली अभियन्ता  
अस्थाई खण्ड  
बेरीनाग

2.17

PROPOSED PLAN FOR MUCK DUMPING

कार्य का नाम - मा. मुख्यमंत्री होशियार संस्था 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत रामगढ़ से सिराही गांव प्रा. वि. ठोली संस्था के लिए गेट गार्ड का नव निर्माण कार्य, (लम्बाई 5.00 किमी)

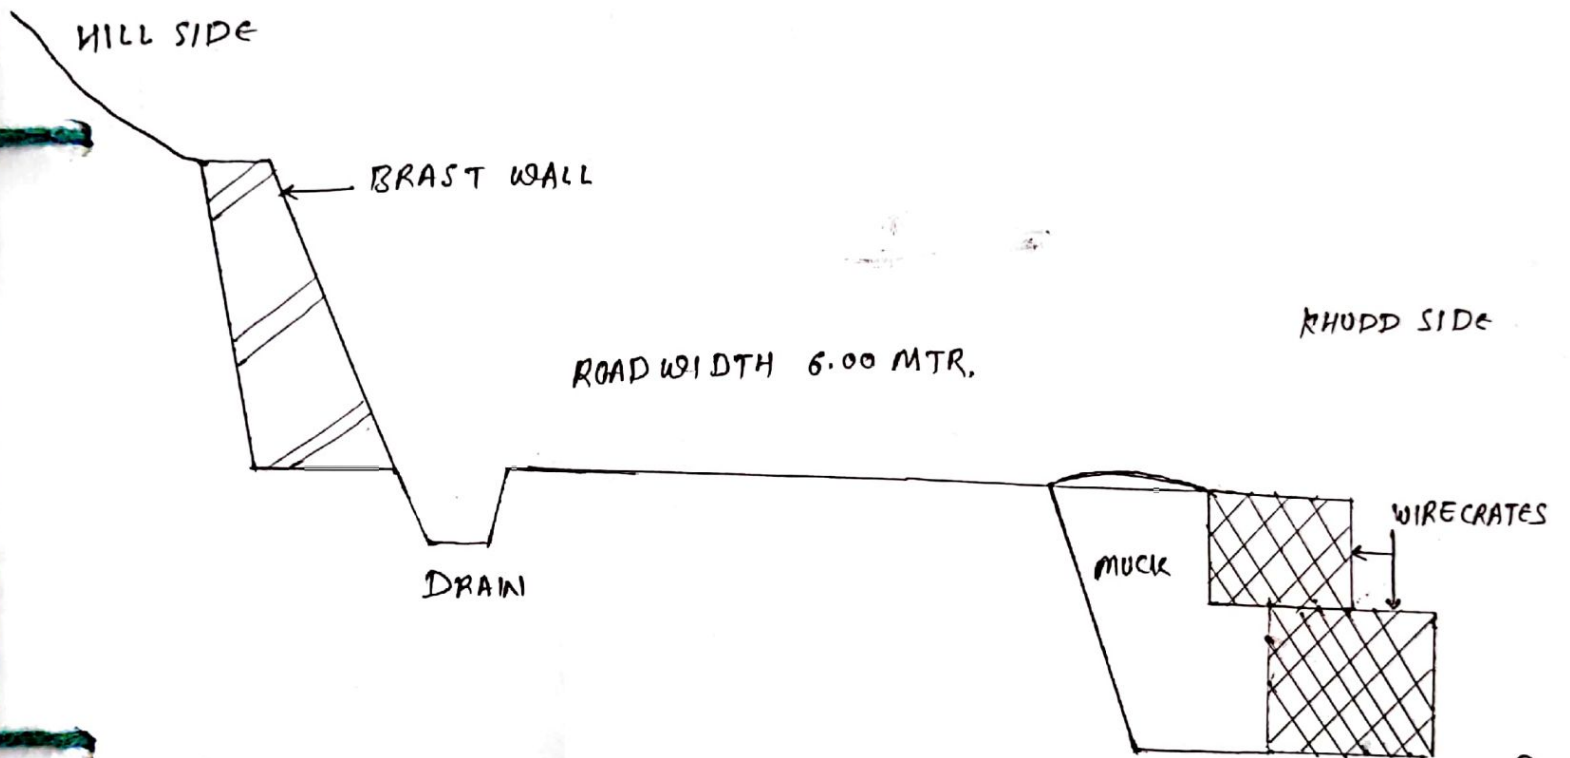

अनिल कनौजिया

1-6-2)  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० लो० नि० वि०  
बेरीनाथ (पिथौरागढ़)

मनोज सनवाल

10-6-2021  
वन क्षेत्राधिकारी  
गंगोलीहाट  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

वी० के० सिन्हा

1-6-2)  
अधीनस्थ अभियन्ता  
वस्त्राई खण्ड, लो० नि० वि०  
बेरीनाथ (पिथौरागढ़)

विनय कुमार भार्गव

25/9/2021  
प्रभाष वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

गांधी का नाम - मा० मुख्यामन्त्री लोकेश्वर शंख्या 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा क्षेत्र गंगोलीहाट के अन्तर्गत  
 रामप्रसाद से निरासी गांव प्रा० बि० ठोली सस्यौडा के लिट मोट भाग का नव निर्माण कार्य,  
 (लम्बाई 5.00 कि०मी०)

मनोज सनवाल

वन क्षेत्राधिकारी  
 गंगोलीहाट  
 दि० 10-6-2021

10-6-2021

अनिल कनोजिया

1-6-2021  
 सहायक अभियन्ता  
 अ० ए० ल० नि० वि०  
 बेरीनाग (पिथौरागढ़)

बी०के० सिन्हा  
 1-6-2021

अधिकासी अभियन्ता  
 जस्यार्ड बण्ड, बो० नि० वि०  
 बेरीनाग (पिथौरागढ़)


|                                                                                                                          |                                                                                                                            |                                                                                                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Capacity of<br>Yard - 3240.00 Cum<br>With Carriage<br>Disposal - 1620.00 Cum<br>[Yard - 1 Ch. 0/0 - 0/8]<br>(Nloop land) | Capacity of<br>Yard - 1890.00 Cum<br>With Carriage<br>Disposal - 945.00 Cum<br>[Yard - 2 Ch. 0/24 - 0/32]<br>(Nloop land)  | Capacity of<br>Yard - 4050.00 Cum<br>With Carriage<br>Disposal - 2025.00 Cum<br>[Yard - 3 Ch. 2/24 - 2/32]<br>(Nloop land) |
| Capacity of<br>Yard - 1944.00 cum<br>With Carriage disposal - 972.00 cum<br>[Yard - 4 Ch. - 3/8 - 3/16]<br>(Nloop land)  | Capacity of<br>Yard - 2916.00 Cum<br>With Carriage<br>disposal - 1458.00 Cum<br>[Yard - 5 Ch. 4/24 - 4/32]<br>(Nloop land) |                                                                                                                            |

3.E

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राम मंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली सस्पोडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (मलुवा निस्तारण क्षेत्र) (ल0 5.00 किमी0)

1:24,000

0 0.175 0.35 0.7 1.05 1.4 Miles

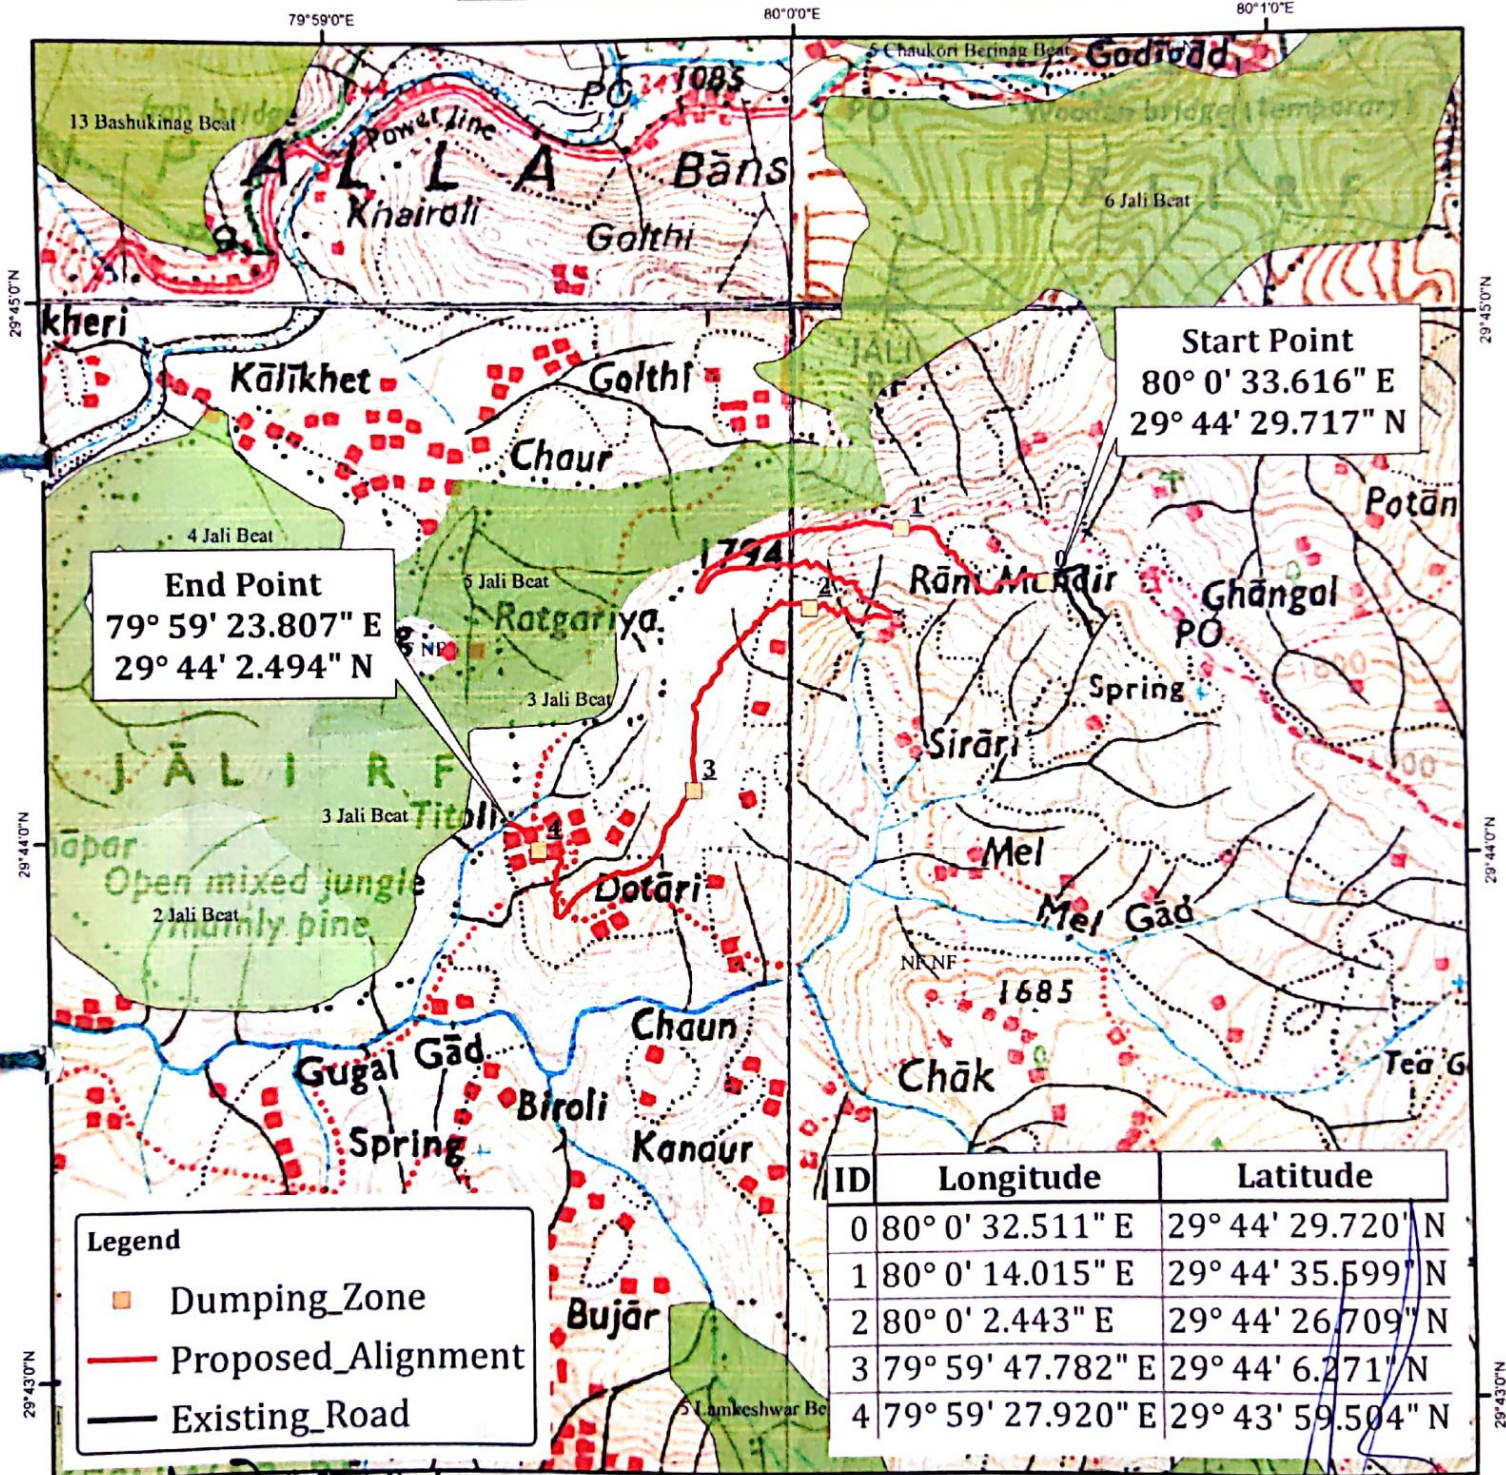

Legend

- Dumping\_Zone
- Proposed\_Alignment
- Existing\_Road

मनोज सनवाल

10-6-2021

वन क्षेत्राधिकारी  
गंगोलीहाट  
पिथौरागढ़ जिला

अनिल कनोजिया

1-6-2021  
सहायक अभियन्ता  
अ0 ख0 लो0 नि0 वि0  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

वी० के० सिन्हा

1-6-21  
बधिरासी अभियन्ता  
बत्साई बाण्ड, पो० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

विनय कुमार


25-9-21  
प्रभारी वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ के विधान सभा क्षेत्र-गंगोलीहाट के अन्तर्गत राम मंदिर से सिराडी गांव प्राथमिक विद्यालय ठठोली सस्पोडा तक मोटर मार्ग का निर्माण कार्य (मलुवा निस्तारण क्षेत्र) (ल० 5.00 किमी०)

1:24,000



0 0.0750.15 0.3 0.45 0.6 Miles

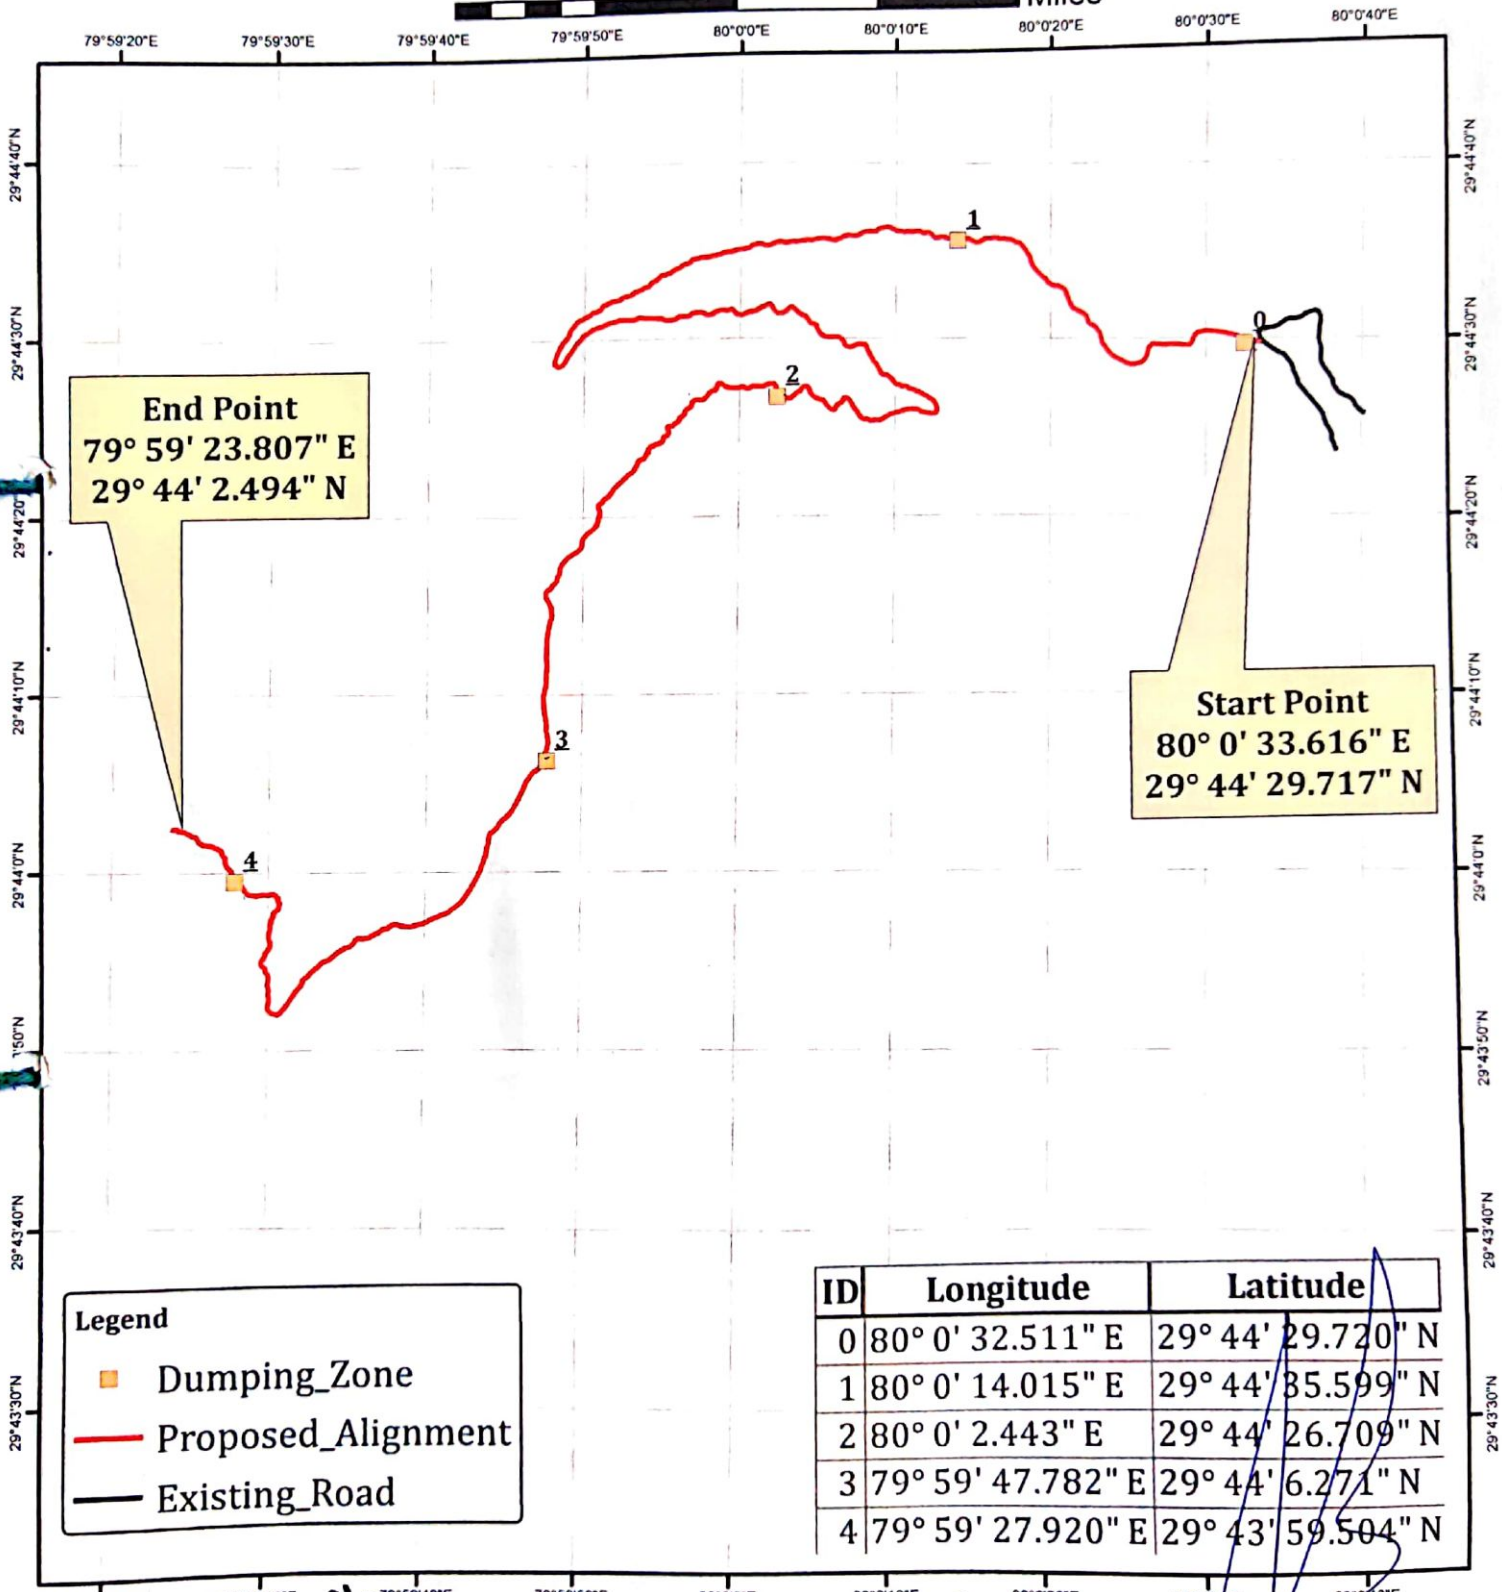

#### Legend

- Dumping\_Zone
- Proposed\_Alignment
- Existing\_Road

| ID | Longitude         | Latitude          |
|----|-------------------|-------------------|
| 0  | 80° 0' 32.511" E  | 29° 44' 29.720" N |
| 1  | 80° 0' 14.015" E  | 29° 44' 35.599" N |
| 2  | 80° 0' 2.443" E   | 29° 44' 26.709" N |
| 3  | 79° 59' 47.782" E | 29° 44' 6.271" N  |
| 4  | 79° 59' 27.920" E | 29° 43' 59.504" N |

अनिल कनौजिया

बी०के०सिन्हा

मनोजसन्वाल

विनय कुमार भागी

1-6-21  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० ल० नि० वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

1-6-2021  
अधिसारी अभियन्ता  
बल्वाई बाण्ड, लो०नि०वि०  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

1-6-2021  
वन अधिकाारी  
गंगोलीहाट  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग

25-9-2021  
प्रभागीन वन अधिकारी  
पिथौरागढ़ वन प्रभाग  
पिथौरागढ़



2.19

परियोजना विवरण : माननीय मुख्यमन्त्री धोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा० वि० ठठोली सस्पेंड्ड मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी० में पडनेवाली 1.71 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे हेतु जो भूमि चयनित की गयी है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी नाप भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम गणेश सिंह S/O शेर सिंह  
ग्राम ठठोली

कास सेक्सन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री गणेश सिंह  
.....पुत्र श्री शेर सिंह ग्राम-ठठोली, पट्टी-चौना, तहसील-गण्डा गंगोली  
जिला-पिथौरागढ़ के नाम भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

| क०सं० | खाता/खसरा नम्बर | खसरा संख्या | भूमि (हे०) |
|-------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 12              | 607         | 0.108      |
|       |                 |             |            |
|       |                 |             |            |

अनिल कनौजिया

3/6/2021  
सहायक अभियन्ता

अ०ख०लो०नि०वि०बेरीनाग  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

गणेश सिंह

भगत सिंह फोनियां

18-6-2021

उप निरीक्षक  
गंगोलीहाट

राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र-चापा-पुष्प-मिर्जापुर  
तहसील गण्डा गंगोली  
दिनांक 3/6/2021

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र-.....

जिला-पिथौरागढ़।

दिनेश कुटौला

18/6/2021  
उप निरीक्षक  
गंगोलीहाट

2019

**परियोजना विवरण :** माननीय मुख्यमंत्री धोषणा संख्या 460/2020 के अर्न्तगत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा० वि० ठठोली सस्पेंड्ड मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी० में पडनेवाली 1.71 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण पत्र :**

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे हेतु जो भूमि चयनित की गयी है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी नाप भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम.....**धर्म सिंह ५० कुँजर सिंह**  
ग्राम.....**सिराडी**.....

कास सेक्सन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री.....**धर्म सिंह** पुत्र श्री **कुँजर सिंह** ग्राम-**सिराडी**, पट्टी-**चौना**, तहसील-**गण्डा गंगोली** जिला-पिथौरागढ़ के नाम भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

| क०सं० | खाता/खसरा नम्बर | खसरा संख्या | भूमि (हे०) |
|-------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 15              | 869         | 0.0648     |
|       |                 |             |            |
|       |                 |             |            |

**अनिल कनौजिया**

**3/6/2021**  
सहायक अभियन्ता  
ज० ख० ल० वि० वि०  
अ० ख० ल० वि० वि०  
पिथौरागढ़ (पिथौरागढ़)  
**धर्म सिंह**

दीप चन्द्र पन्त  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र-**चाँदा गंगोली**  
तहसील-**गण्डा गंगोली**  
दिनांक **03/6/2021**  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र-.....  
जिला-पिथौरागढ़।  
**दिनेश कुटोला**

**भगत सिंह कनौजिया**

**18-6-2021**  
सब जिलाधिकारी  
गंगोलीहाट

**18/6/2021**  
तहसीलदार  
गंगोलीहाट

**परियोजना विवरण :** माननीय मुख्यमंत्री धोषणा संख्या 460/2020 के अन्तर्गत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा० वि० ठठोली सस्पेंडिंग मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी० में पडनेवाली 1.71 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

**व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण पत्र :**

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे हेतु जो भूमि चयनित की गयी है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी नाप भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम...किसन सिंह ९/० राम सिंह  
ग्राम...सिराडी

कास सेक्सन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री...किसन सिंह पुत्र श्री...राम सिंह ग्राम-सिराडी, पट्टी-चौना, तहसील-गण्डाई गंगोली जिला-पिथौरागढ़ के नाम भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

| क०सं० | खाता/खसरा नम्बर | बसरा संख्या | भूमि (हे०) |
|-------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 18              | 859         | 0.0972     |
|       |                 |             |            |
|       |                 |             |            |

अनिल कनौजिया

3/6/2021  
सहायक अभियन्ता  
अ० ख० ला० नि० वि०  
अ० ख० ला० नि० वि०, वरीनाग

Kush

दीप चन्द्र पन्त  
राजस्व उपनिरीक्षक  
क्षेत्र-चातक/सिराडी गंगोली  
तहसील-गण्डाई गंगोली  
दिनांक-3/6/2021  
राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र-.....  
जिला-पिथौरागढ़।

दिनेश कुटोला

भगत सिंह फौजिया

18/6/2021  
जिलाधिकारी  
गंगोलीहाट

18/6/2021  
तहसीलदार  
गंगोलीहाट

परियोजना विवरण : माननीय मुख्यमंत्री धोषणा संख्या 460/2020 के अर्न्तगत विधानसभा गंगोलीहाट में राम मन्दिर से सिराडी गांव प्रा० वि० ठठोली सस्पेंडिंग मोटर मार्ग का निर्माण लम्बाई 5.00किमी० में पडनेवाली 1.71 हे० वनभूमि का लो०नि०वि० को हस्तान्तरण।

व्यक्तिगत भूमि पर मलवा निस्तारण हेतु भू-स्वामी द्वारा दिये जाने का माडल अनापत्ति प्रमाण पत्र :

प्रस्तावित परियोजना के निर्माण से उत्सर्जित मलवे हेतु जो भूमि चयनित की गयी है, उस प्रयोजन हेतु यदि मेरी नाप भूमि अर्जित की जाती है तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। मैं विभागीय दरों पर अपनी भूमि सहर्ष देने को तैयार हूँ।

नाम.....फकीर सिंह ६/० कुँवर सिंह  
ग्राम.....ठठोली

कास सेक्सन.....पर प्रस्तावित मक डिस्पोजल हेतु काश्तकार श्री फकीर सिंह  
.....पुत्र श्री कुँवर सिंह ग्राम-ठठोली, पट्टी-चौना तहसील-गण्डाई गंगोली जिला-पिथौरागढ़ के नाम भूमि का विवरण निम्न प्रकार है-

| क०सं० | खाता/खसरा नम्बर | वसरा संख्या | भूमि (हे०) |
|-------|-----------------|-------------|------------|
| 1     | 35              | 519         | ०.135      |
|       |                 |             |            |
|       |                 |             |            |

अनिल कनौजिया

3/6/2021  
सहायक अभियन्ता  
अ०ख०लो०नि०वि० बेरीनाग  
बेरीनाग (पिथौरागढ़)

फकीर सिंह

टीव घाट पन्त  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र चाप्पा डोवा गंगोली  
तहसील गण्डाई  
जिला पिथौरागढ़  
राजस्व उप निरीक्षक  
क्षेत्र-3/6/2021  
जिला-पिथौरागढ़।

भगत सिंह कनौजिया

दिनेश कुटोला

18/6/2021  
अतिरिक्त अधिकारी  
गंगोलीहाट

18/6/2021  
अतिरिक्त अधिकारी  
गंगोलीहाट
