

प्रारूप-49

परियोजना का नाम:-

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग का निर्माण। लम्बाई 4.00 किमी०


परियोजना से उत्पादित मलवा निस्तारण योजना

--- संलग्न है ---

अभिप्रेत अभियन्ता
 प्रयोक्ता एजेन्सी नि. विभाग
 प्रो. कीर्तिनगर मु. कीर्तिनगर

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग
नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय—कीर्तिनगर

“मक डिस्पोजल प्लान प्रस्ताव”

कार्य का नाम:—

जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

अनुमानित लागत:—

Rs. 15.09 लाख


कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

मक डम्पिंग प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड देवप्रयाग में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु डम्पिंग जोनु निजी नाप भूमि पर प्रस्तावित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु चार डम्पिंग जोन प्रस्तावित किये गये हैं, चारों डम्पिंग जोन हेतु निजी नाप भूमि के भू स्वामियों द्वारा खसरा नकल प्रमाणित कर अनापत्ति प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया है जो प्रस्ताव में संलग्न है।



कनिष्ठ अभियन्ता



सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर



अधिशायी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र--वि०कोट/टकोली
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल


तहसीलदार
देवप्रयाग, टि०ग०


उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल


वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी



तहसीलदार
टिहरी गढ़वाल
नई टिहरी

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक
मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किमी० के निर्माण हेतु 1.746 हे० वन भूमि के गैर वानकी
कार्यो हेतु लो०नि०वि० को प्रत्यावर्तन

मलवा निस्तारण स्थल के कोडिनेट्स

1—	निस्तारित बिन्दु सं० 1	30°15'34.73"N 78°32'54.08"E
2—	निस्तारित बिन्दु सं० 2	30°15'37.85"N 78°32'56.05"E
3—	निस्तारित बिन्दु सं० 3	30°15'36.31"N 78°32'59.16"E
4—	निस्तारित बिन्दु सं० 4	30°15'29.72"N 78°33'27.53"E


 सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर

 अधिशासी अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर

 राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-~~मिडाकोट~~ ~~मेडोली~~
तहसील देवप्रयाग
जिला टिहरी गढ़वाल

 तहसीलदार
देवप्रयाग, टिहरी

 उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल

 वन क्षेत्राधिकारी
टिहरी राजि
नई टिहरी

 अतिरिक्त अधिकारी
टिहरी गढ़वाल
नई टिहरी

अनपारि प्रमाण-पत्र

मैं जगरन सिंह सुपुत्र स्वामी जीबू सिंह निवासी ग्राम-पौली
 फटी कनाठ तहसील देवप्रयाग जिला टिहरी जिल्ला आगे नदम करता हूँ
 कि पौली से रकोली क्षेत्रमोनी छोटे हुए भौस्वाडी मो. मार्ग के सड़क
 निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु मैं अपने जिले स्वतः आमगदना
 नमै मौक का जनाई मैं दे रहा हूँ मुझे उचित मुकामा दिये जाने पर
 मलवा निस्तारण दवान पर कोई आपसी नहीं है। मैं संलग्न रक्ता-
 खतोंनी राखस आनेसेव को नाम भूमि में मलवा निस्तारण
 दवान हेतु आवश्यक के लिए संलग्न करता हूँ

संलग्न-खाताखतौनी-प्रमाणित

जगरन सिंह

जगरन सिंह स्वामी श्री
 जीबू सिंह ग्राम-पौली
 पी. लोली नर देवप्रयाग
 बनप्रद-टिहरी गढ़

अनापति प्रमाण-पत्र

मैं स्वैम सिंह पंवार सुपुत्रलक्ष्मी प्रेम सिंह पंवार निवासी
ग्राम - चपोली पट्टी वनगढ तहसील देवपुयाग जिला टिहरी
गढ़वाल अभिनन्दन करता हूँ कि चपोली से टकोली, चमोगी होते
हुए श्रीस्वादी जी. मार्ग के सड़क निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु मैं
अपने निजी नाप खेत उठोड़ी नामक तोक के जनटित में दे रहा हूँ
मुझे उचित मुवावजा दिए जाने पर मलवा निस्तारण क्वान पर कोई
आपत्ति नहीं है। मैं संलग्न स्याता - खतौनी राजस्व आगिलेख को
नाम भूति में मलवा निस्तारण / क्वान हेतु जानकारी के लिए संलग्न
करता हूँ

संलग्न - खाला - खतौनी -
प्रमाणित -

स्वैम सिंह
स्वैम सिंह पंवार 5/1.
स्व. प्रेम सिंह पंवार
ग्राम - चपोली पो. तौली
पट्टी - वनगढ
अनपद - टिहरी

अनापत्ति प्रमाण पत्र

मैं रूपचन्द सिंह अ. स्व. श्री साव सिंह निवासी ग्राम-चपोली पट्टी वनगाह तहसील देवप्रयाग अनपद-टिहरीगढ़वाल अभिलेख करता हूँ कि चपोली सिंह कोली, चमोली होते हुए भूस्वादी मौ. मार्ग के सड़क निर्माण में मलवा निस्तारण हेतु मैं अपने निधि खेत चमोली-जामक सेक को अनपद में दे रहा हूँ मुझे उचित मुवावजा दिये जाने पर मलवा निस्तारण दवान पर कौड़ी आपसी नहीं है, मैं संलग्न खाता-खतौनी नामक अभिलेख को जाम भूमि में मलवा निस्तारण दवाय हेतु जानकारी के लिए संलग्न करता हूँ

संलग्न - खाता खतौनी
प्रमाणित



रूपचन्द सिंह

रूपचन्द सिंह अ. स्व. श्री साव सिंह
ग्राम-चपोली पट्टी वनगाह
तहसील देवप्रयाग अनपद-टिहरीगढ़वाल

नकल खसरा ग्राम-चपोली पट्टी वरगाह तहसील देवप्रयाग

103

वास्ते डाम्पिक जोन वावत

खसरा नं	रकबा	खाला सं	नाम खोतेधारक	विवरण
2052	0.029	26	जगदु आर्ड	ग्राम-चपोली
2053	0.015	26	"	"
2054	0.011	26	"	"
2055	0.013	26	"	"
2056	0.055	26	"	"
2057	0.024	26	"	"
214	0.030	37	पेमारीह	"
215	0.020	37	"	"
216	0.014	37	"	"
218	0.011	37	"	"
219	0.020	37	"	"
1890	0.023	37	"	"
1891	0.030	37	"	"
1889	0.028	37	"	"
1888	0.035	37	"	"
583	0.170	96	सावारीह	"
Total	0.528			

Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.

Kirtinagar (HQ. Devprayag)

राजस्व उप निरीक्षक

क्षेत्र-कड़कोटा/चपोली/तेली

तहसील देवप्रयाग

जिला देहरी गढ़वाल

27/08/15

222

कृष्ण गिरि मन्त्रालय
Sahel
27/6/18

राज्य उप निदेशक

कृष्ण गिरि मन्त्रालय

विभाग (अधिकांश)

105

Starting Point



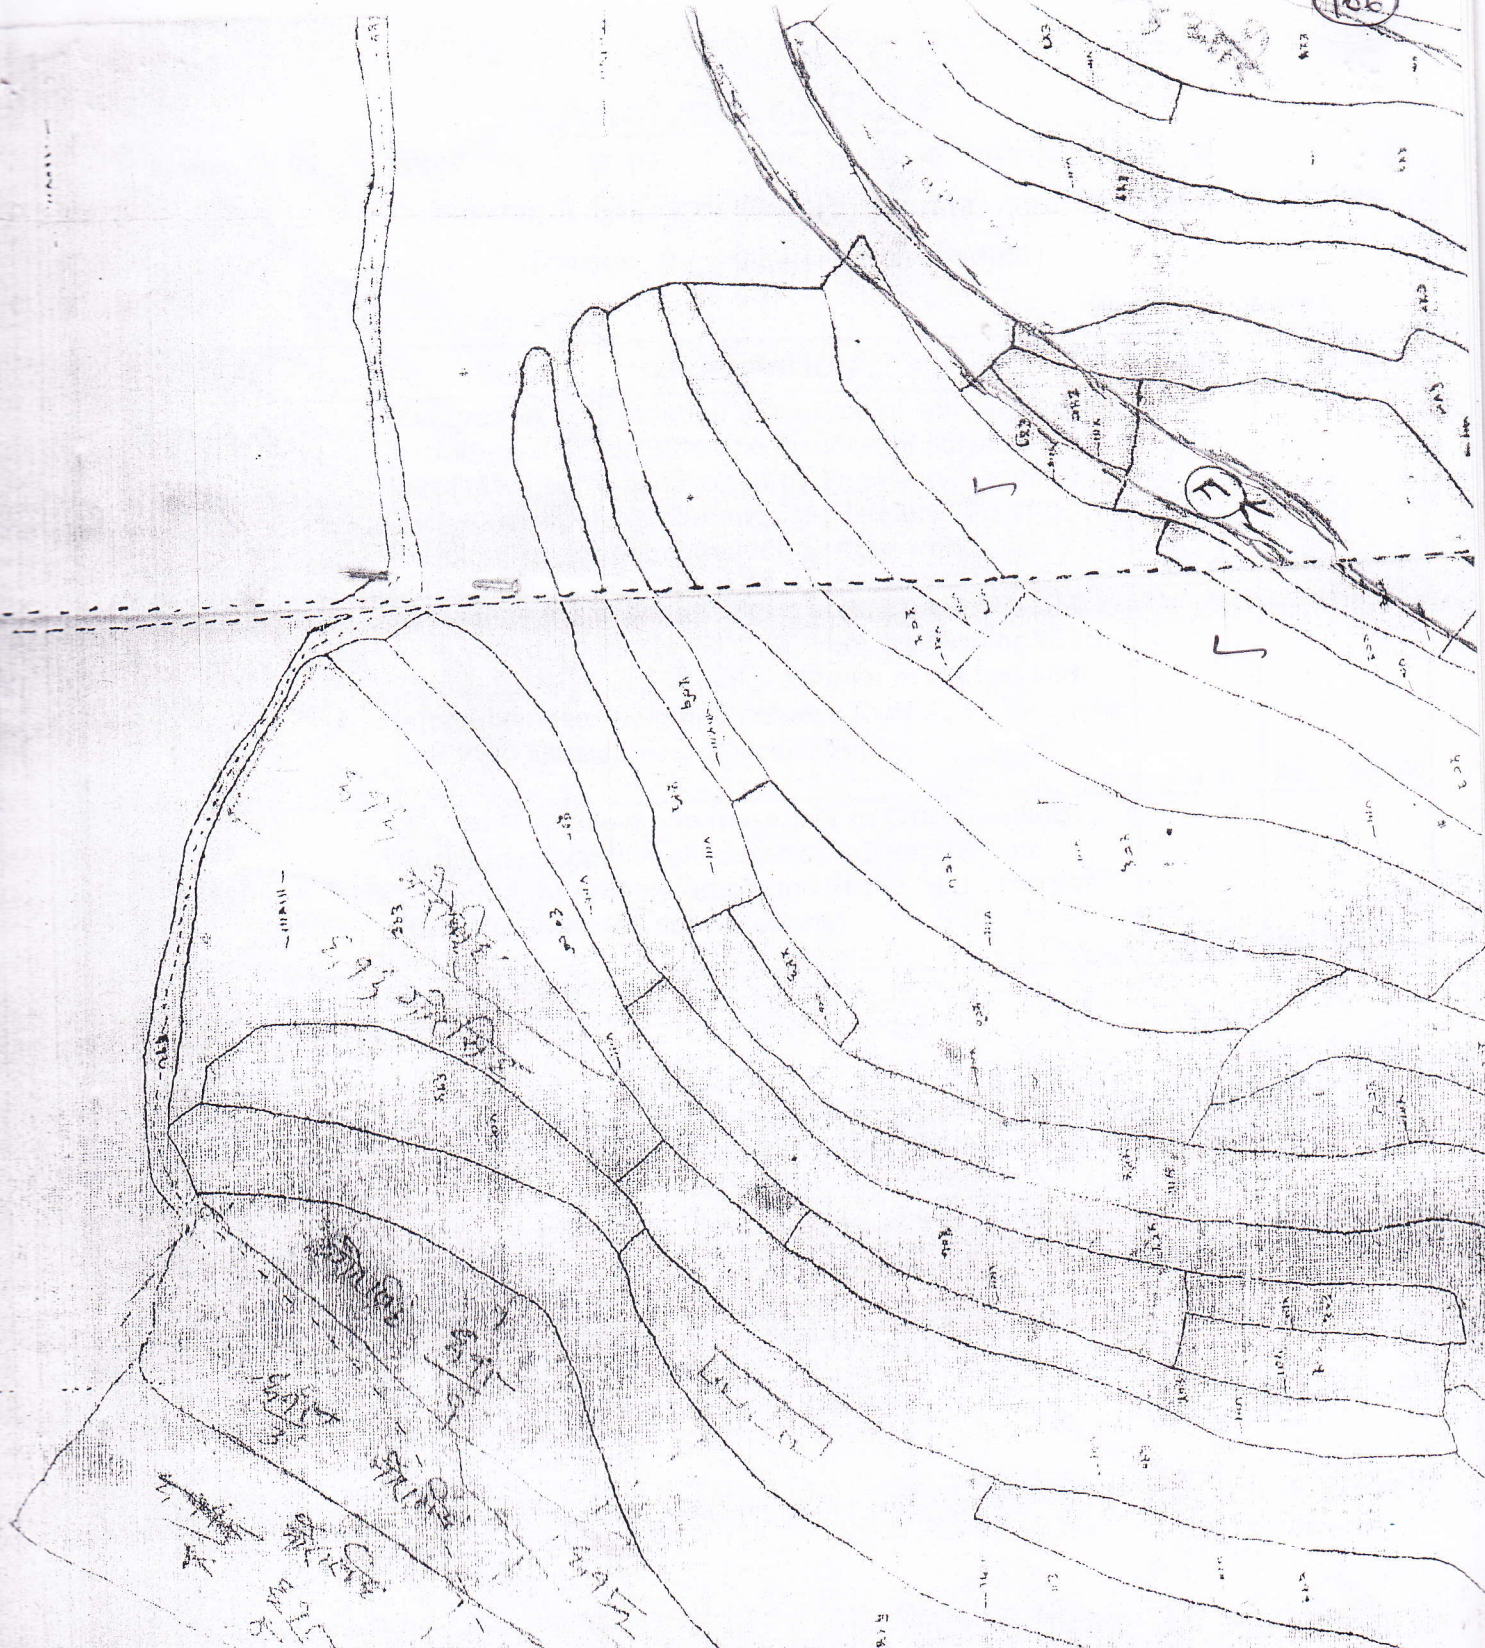
डा. राजेश कुमार

28/4/15

Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
Kirtinagar (HQ Devarayag)

Handwritten signature

राजेश कुमार निरीक्षक



दामा श्री नारायण

श्री नारायण

राजस्व उप निरीक्षक
क्षेत्र-किसावट/पंचायत/गाँव
तहसील/जिला/प्रदेश

Assistant Engineer
Temp. Div., P.W.D.
(G. Deynprava)

Analysis of Rate

Name Of Work: जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)


Block: Devprayag

Wef. Dt. 01-05-2015

SN	Description	Rate	Unit
97511 16-1	Excavation in foundation in all type of soils and rocks including all leads, lifts and disposal of surplus excavated earth as directed by Engineer-in-charge including supply of all materials, labour, T&p etc. required for proper completion of the work.	Cu.m	Rs. 261.80
97521 16-9-2-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	Cu.m	Rs. 1,247.00
97516 16-6	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	Cu.m	Rs. 1,070.40


J.E.

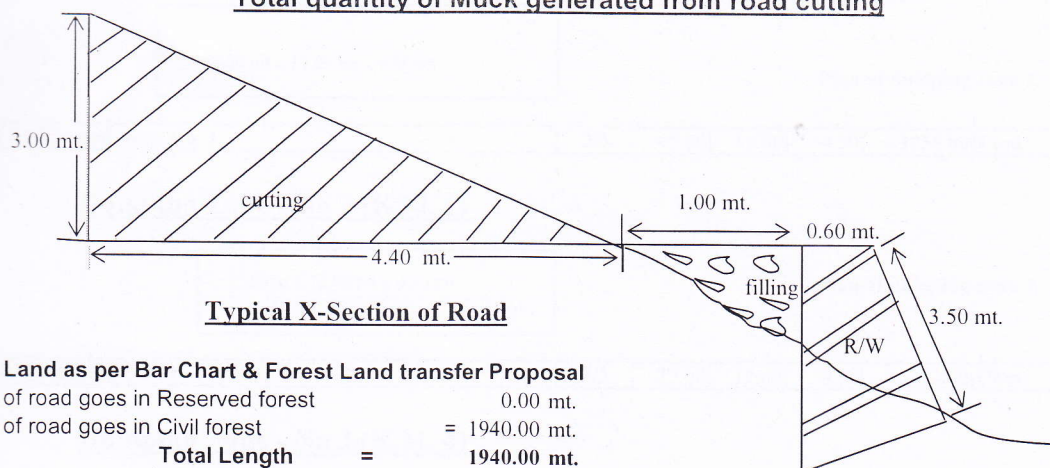

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंसाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

Total quantity of Muck generated from road cutting



Forest Land as per Bar Chart & Forest Land transfer Proposal

A	Length of road goes in Reserved forest	0.00 mt.
B	Length of road goes in Civil forest	= 1940.00 mt.
Total Length		= 1940.00 mt.

Calculation of Muck As Above Length

1	Quantity of muck generated from cutting	1	x	1/2	1940.00	4.40	3.00	12804.00	Cum.
2	Quantity of muck from scupper & catch pit								
A	Quantity of muck from scupper@ 8 Nos per Km.	8	x	1.94	4.40	3.00	2.80	573.62	Cum.
B	Quantity of muck from catch pit	8	x	1.94	(1.5x1.5+2.1x2.1)/2		2.50	129.20	Cum.
	Quantity of muck from Sl No 1. & 2 as above.						G-Total	13506.82	Cum.
3	Taking E.B, O.R & H.R @ 50%, 20%, & 30% respectively								
i.	50% E.B	13506.82	x	0.50	=			6753.41	Cum.
ii.	20% O.R.	13506.82	x	0.20	=			2701.36	Cum.
iii.	30% H.R.	13506.82	x	0.30	=			4052.05	Cum.
						Total =		13506.82	Cum
4	Quantity of muck as swell factor of (E.B. only)	1.25	x	6753.41		8441.76		Cum	
5	Quantity of total muck from point ii., iii., & 4	Sl. No (i + ii + 4) =				15195.17		Cum	
	Quantity of total muck Generated				Say	15195.17		Cum.	

Disposal & use of material

1	Quantity used for super elevation, grade improvement & patrie filling of road @ 10% of (E.B. only)	= (8441.76 x 10/100) =				844.18	Cum	
2	Quantity erodes by wind and water @ 5% of (E.B. only)	= (8441.76 x 5/100) =				422.09	Cum	
3	Quantity of muck disposed in filling (retained by R/W) in 60% length	= (1940.00 x 1.00 x 2.50)/2 x 60%				1455.00	Cum	
4	Quantity of stones used Scuppers and catch pit @ 57.00 cum. Per no.	= 57.00 x 8.00 x 1940.00 =				884.64	Cum	
5	Quantity of stones used in R/W in 60% length	= 1940 x (0.60+1.75)/2 x 3.50 x 60%				4786.95	Cum	
6	Quantity of stones used in Wire Crates for 4 dumping zones	As per details				1066.50	Cum.	
7	Quantity of stones used in side wall for 4 dumping zones	As per details				143.80	Cum.	
	Total quantity of muck used at site including weathering by nature					9603.16	Cum.	
	Quantity of muck retained	=	15195.17	-	9603.16	=	5592.01	Cum.

निस्तारित की जाने वाली मलवे की मात्रा =

5592.01 Cum अथवा 5592.00 Cum

इस प्रकार से उत्सर्जित मलवे का लगभग सम्पूर्ण उपयोग सतह की रिग्रेडिंग एवं दीवार निर्माण आदि के प्रयोग में तथा सुपर एलीवेशन व पटरी फिलिंग आदि में हो जायेगा जिससे स्थानीय वनस्पति को क्षति नहीं पहुंचेगी एवं भू-क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी।

अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु मार्ग पर ऐसी जगह चिन्हित किये जा रहे हैं जिससे वन सम्पदा आदि की क्षति नहीं होगी। निस्तारित किये जाने वाले स्थानों का प्रस्ताव संलग्न लाईन डायग्राम में दर्शाया जा रहा है।

[Signature]
J.E.

[Signature]
अधीक्षक

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.


प्रतिनिधित्व

Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.

Capacity of Dumping Yard

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंसवाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)


1. Dumping Zone - No 1 (K.M. 1)



Plan of dumping zone 1.

Capacity Of Dumping Zone No. 1	=	2/3	45.00	13.00	4.50	1755.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	---------	-----


2. Dumping Zone - No 2 (K.M. 1)



Plan of dumping zone 2.

Capacity Of Dumping Zone No. 2	=	2/3	27.00	12.00	4.50	972.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----


3. Dumping Zone - No 3 (K.M. 4)



Plan of dumping zone 3.

Capacity Of Dumping Zone No. 3	=	2/3	30.00	12.00	3.00	720.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----

4. Dumping Zone - No 4 (K.M. 5)



Plan of dumping zone 4.

Capacity Of Dumping Zone No. 4	=	2/3	60.00	12.00	4.50	2160.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	---------	-----

Total quantity of muck retained by Dumping zone 1 to 4
Total 4 Nos as Per Photograph & coordinates

= 5607.00 Cum.

J.E.

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

सब-डिविजनल इंजीनियर
टिहरी राजि
नई टिहरी


सब-डिविजनल इंजीनियर
टिहरी राजि
नई टिहरी

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंरवाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

Sl.No	Item of work	No	L	W/B	H/D	Quantity
1	Excavation in foundation in all type of soils and rocks including all leads, lifts and disposal of surplus excavated earth as directed by Engineer-in-charge including supply of all materials, labour, T&p etc. required for proper completion of the work.					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	For Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 1/2	45.00	1.50	0.80	27.00 Cum.
	Site No. 2 (K.M. 1)					
	For Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 1/2	27.00	1.50	0.80	16.20 Cum.
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	For Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 1/2	30.00	1.50	0.80	18.00 Cum.
	Site No. 4 (K.M. 3)					
	For Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 1/2	60.00	1.50	0.80	36.00 Cum.
					Total	97.20 Cum.
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	45.00	1.50	1.50	303.75 Cum.
	Quantity for Wire Crates in side	1x 2	3.00	1.50	1.50	13.50 Cum.
	Site No. 2 (K.M. 1)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	27.00	1.50	1.50	182.25 Cum.
	Quantity for Wire Crates in side	1x 2	3.00	1.50	1.50	13.50 Cum.
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 2	30.00	1.50	1.50	135.00 Cum.
	Site No. 4 (K.M. 3)					
	Quantity for Wire Crates in 3 layers	1x 3	60.00	1.50	1.50	405.00 Cum.
	Quantity for Wire Crates in side	1x 2	3.00	1.50	1.50	13.50 Cum.
					Total	1066.50 Cum.
3	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. (As per PWD Uttarakhand specifications)					
	Site No. 1 (K.M. 1)					
	Quantity for Side wall	1x 2	7.00	1.00	3.50	49.00 Cum.
	Site No. 2 (K.M. 1)					
	Quantity for Side wall	1x 2	6.00	0.80	3.50	33.60 Cum.
	Site No. 3 (K.M. 2)					
	Quantity for Side wall	1x 2	6.00	0.80	2.00	19.20 Cum.
	Site No. 4 (K.M. 3)					
	Quantity for Side wall	1x 2	6.00	1.00	3.50	42.00 Cum.
					Total	143.80 Cum.
4	Land required area of Dumping point SI No 1 to 4					
	Site No. 1 (K.M. 1)	1x 1	45.00	13.00		585.00 Sqm
	Site No. 2 (K.M. 1)	1x 1	27.00	12.00		324.00 "
	Site No. 3 (K.M. 2)	1x 1	30.00	12.00		360.00 "
	Site No. 4 (K.M. 3)	1x 1	60.00	12.00		720.00 "
					Total	1989.00 Sqm
					Say	0.1989 Hct.



J.E.


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.


BILL OF QUANTITY

Name of Work:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

Sl.No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavation in foundation in all type of soils and rocks including all leads, lifts and disposal of surplus excavated earth as directed by Engineer-in-charge including supply of all materials, labour, T&p etc. required for proper completion of the work.	97.20	Cum.	261.80	Cum.	25446.96
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	1066.50	Cum.	1247.00	Cum.	1329925.50
3	Random Rubble stone masonry in Coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work. (As per PWD Uttarakhand specifications)	143.80	Cum.	1070.40	Cum.	153923.52
				Total		1509295.98


J.E.


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


आगणन की लागत का सारांश

कार्य का नाम:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)

क्रम संख्या	विवरण	लागत (रु०में)
1	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैंस्वाड़ी तक मोटर मार्ग के निर्माण से उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु योजना। (4.00 कि०मी०)	Rs.1,509,295.98
	योग	Rs.1,509,295.98
	अर्थात् लाख रु० में	Rs.15.09


कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


अधिशासी अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


जनपद अधिकारी
टिहरी राज
नई टिहरी


प्रमाणित
टिहरी राज प्रचार
नई टिहरी

जनपद टिहरी गढ़वाल के अन्तर्गत चपोली से टकोली-चमोगी होते हुये भैँस्वाड़ी तक
मोटर मार्ग लम्बाई 4.00 किमी० के निर्माण हेतु डम्पिंग स्थल फोटोग्राफ



DUMPING ZONE NO 1



DUMPING ZONE NO 2



DUMPING ZONE NO 3



DUMPING ZONE NO 4

सहायक अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर

राजस्व सहायक निरीक्षक
चपोली से टकोली

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर

अधिशाली अभियन्ता
अस्थाई खण्ड लो०नि०वि०
कीर्तिनगर
