


परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


मक डम्पिक प्लान प्रमाण -पत्र

प्रस्तुत प्राक्कलन सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु दिनांक/...../2014 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मार्ग में सिविल सोयम भूमि में चैनेज सं. 0/0, 1/4, 1/40, 2/19, 3/20, 4/18, 5/3, 6/12, 7/40 पर स्थलों का चयन किया गया है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड् साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है। सिविल सोयम भूमि को प्रस्ताव में (लैन्ड रोडयूल प्रपत्र 10) गठित किया गया है


अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रु 53.50 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कही भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।



कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़



सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़



अधीक्षारी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

Muck Disposal Plan

परियोजना का नाम:- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Summary of Results

1 The Quantity of material received from hill side cutting=		83015.6 Cum
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
2 The Quantity of material used in various items=		57080.29 Cum
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
3 The remaining Quantity of muck for dumping i/c swell factor=		29171.17 Cum
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
4 Numbers of dumping yards needed for the dumping of muck =		
(i) In Civil Soyam Land =	9	Nos
(ii) In Nap Land =	-	Nos
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
5 Carrying capacity of dumping yards with dimensions & coordinates		
	Area in hect.	Quantity
(i) In Civil Soyam Land =	0.54	29250.00 Cum
(ii) In Nap Land =	-	- Cum
Total=	0.54	Total= 29250.00 Cum
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
6 Land ownership Reports (Nap Land)		
N.A.		
7 Amount for C of Dumping Yards		
(i) In Civil Soyam Land =	Rs.	27.31 Lacs
(ii) In Nap Land =	Rs.	-
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
8 Cost of Vegetation Plantation in Civil Soyam Land = Rs.		5.15 Lacs
(Sheet attachad on page no.	Of Muck disposal estimate)	
9 Total Amount in Civil Soyam Land =		
(i) Cost of Construction of Dumping Yards=	27.31	Lacs
(ii) Cost of Vegetation Plantation =	5.15	Lacs
Total=	32.46	Lacs
Add 2 % incidental Charges=	0.65	Lacs
Total=	33.11	Lacs

जनपदीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ वन विभाग

ajesh
J.E.

Quany
सहायक अभियन्ता
सिंचाई एवं वन विभाग
पिथौरागढ़

ajesh
अधीक्षक अभियन्ता
सिंचाई एवं वन विभाग
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डिस्पोजल हेतु वनीकरण एवं अभियांत्रिकी कार्यों में जो भी व्यय होगा उसे ग्राम्य विकास विभाग द्वारा वन विभाग की मांग के अनुसार उपलब्ध करा दिया जायेगा।

Sajesh Law

कनिष्ठ अभियन्ता,
सि०ख०, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

Amey

सहायक अभियन्ता,
सि०ख०, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

8

अधिकांशी अभियन्ता,
सि०ख०, लो०नि०वि०,
पिथौरागढ़।

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


DSR REPORT


Name MORD Year 2014-2015

Rate Card Block 56 Munakot (PITHORAGARH) Effective Date 16/05/2014

SUMMARY OF RATE

S.No.	Chapter		Description of Items	Unit	Rate in	Per
1	77749	11-1-1-1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks cu.m including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge	Cum	237.30	Cum
2	75487	16-9-2-1	16-9 Wire Crates As per PWD Uttarakhand Specifications Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	Cu.m	1,483.20	Cu.m
3	77430	3-7	Removal of Unsuitable Soil with Disposal cu.m Removal of unsuitable soil including excavation, loading and disposal upto 1000m lead but excluding compaction ground supporting embankment subgrade replacement by suitable soil, which shall be paid separately as per Clause 303.5.2 as per Technical Specification Clause 302.3.11	Cum	46.70	Cum


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड- मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी0) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Detail of Measurements for Civil Soyam Land

1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in charge.										
Sl. No.	Location of wire crate			No.		L	B	H/D	Qty.	Unit	
	X- Section's										
1	0/0 - 0/2			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
2	1/14-1/16			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
3	1/40-2/2			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
4	2/19-2/21			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
5	3/20-3/22			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
6	4/18-4/20			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
7	5/3-5/5			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
8	6/12-6/14			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
9	7/40-8/2			1	x	1	30.00	1.50	0.30	13.50	Cum
TOTAL						270.00			121.50	Cum	
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)										
Sl. No.	Item of Work			No.		L	B	H/D	Qty.	Unit	
	X- Section's										
1	0/0 - 0/2			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
2	1/14-1/16			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
3	1/40-2/2			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
4	2/19-2/21			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
5	3/20-3/22			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
6	4/18-4/20			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
7	5/3-5/5			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
8	6/12-6/14			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
9	7/40-8/2			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	2nd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
	3rd			1	x	1	30.00	1.50	1.50	67.50	Cum
TOTAL									1822.50	Cum	

ajesh
कनिष्ठ अभियन्ता

Shrey
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

Shrey
अधिशाली अभियन्ता
अधिशाली अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो0नि0वि0
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड— मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Bill of Quantity for Civil Soyam Land

Sl. No.	Item of Work	Unit	Qty	Rate in l	Amount in l
1	Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks cu.m including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in -charge	Cum	121.50	237.30	28831.95
2	16-9 Wire Crates As per PWD Uttarakhand Specifications Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	Cum	1822.50	1483.20	2703132.00
				Total	2731963.95

Say = l 27.31 Lacs

1 Cost of Vegetation Plantation in Civil Soyam Land = Rs. 5.15 Lacs

Total

= Rs. 32.46 Lacs


Add 2 % Incidental Charges


= Rs. 0.65 Lacs

Total

= Rs. 33.11 Lacs

प्रभागीय वन अधिकारी
पिथौरागढ़ नव निर्माण
पिथौरागढ़


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिसूची अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड— मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


Vegetation Plantation

1- Cost of Vegetation Plantation in Civil Soyam Land =

5.15

Lacs


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधियासी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड— मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Quantity of Material for Dumping Yard

Sl. No.	Description of work	Quantity	Unit
1	Material received form hill side cutting as per DPR	83015.55	cum

Disposal and use of Material

1	Earth and Boulder filling for Super elevation (10 % of hill side cutting soil)	8301.56	cum
2	Construction of Coolie Walling (8.050*500*0.6*0.6)	1449.00	cum
3	R.R. Stone Masonry laid in Cement Mortar (484.45+155.24+128.79)	768.48	cum
4	R.R. Stone Masonry laid in Dry	5123.23	cum
5	Hand Packed Stone Filling for R/wall	3121.87	cum
6	Construction of Wire Crates (918.65+5915.68)	6834.33	cum
7	Construction of Parapets (245 nos @ 1.01 cum/each)	247.45	cum
8	Construction of Edge Stones (8050 mx1.575 cum/45 m)	281.75	cum
9	Construction of Pillars (8.050 Km @ 4.896 cum/Km)	44.06	cum
10	Construction of Scuppers (312.00 rm @ 5.29 cum/m)	1650.48	cum
11	Material to be disposed along the road side (25% of hill side cutting soil)	20753.89	cum
12	Granular sub base	7814.19	cum
13	Material used for Hill Side C.C. Drain (1500 m @ 0.46 cum/m)	690.00	cum
Total		57080.29	cum


Total used material = 57080.29 Cum


Quantity of material to be disposed to dumping yard = (Material received -Total used Material) =


83015.55 - 57080.29 25935.26 Cum

Add Swell factor (Bulkage) @12.50 % Extra 3241.90 Cum

Total Quantity of material to be disposed to the dumping yard = 29177.17 Cum


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिशामी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत जनपद पिथौरागढ़ के विकास खण्ड— मूनाकोट, सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) तक का नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

Quantity of Material for Dumping Yard

Sl. No.	Description of work	Quantity	Unit
1	Material received form hill side cutting as per DPR	83015.55	cum

Disposal and use of Material

1	Earth and Boulder filling for Super elevation (10 % of hill side cutting soil)	8301.56	cum
2	Construction of Coolie Walling (8.050*500*0.6*0.6)	1449.00	cum
3	R.R. Stone Masonry laid in Cement Mortar (484.45+155.24+128.79)	768.48	cum
4	R.R. Stone Masonry laid in Dry	5123.23	cum
5	Hand Packed Stone Filling for R/wall	3121.87	cum
6	Construction of Wire Crates (918.65+5915.68)	6834.33	cum
7	Construction of Parapets (245 nos @ 1.01 cum/each)	247.45	cum
8	Construction of Edge Stones (8050 mx1.575 cum/45 m)	281.75	cum
9	Construction of Pillars (8.050 Km @ 4.896 cum/Km)	44.06	cum
10	Construction of Scuppers (312.00 rm @ 5.29 cum/m)	1650.48	cum
11	Material to be disposed along the road side (25% of hill side cutting soil)	20753.89	cum
12	Granular sub base	7814.19	cum
13	Material used for Hill Side C.C. Drain (1500 m @ 0.46 cum/m)	690.00	cum
Total		57080.29	cum


Total used material = 57080.29 Cum


Quantity of material to be disposed to dumping yard = (Material received -Total used Material) =


83015.55 - 57080.29 25935.26 Cum

Add Swell factor (Bulkage) @12.50 % Extra 3241.90 Cum

Total Quantity of material to be disposed to the dumping yard = 29177.17 Cum


कनिष्ठ अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


सहायक अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़


अधिशामी अभियन्ता
पी०एम०जी०एस०वाई,
सिंचाई खण्ड, लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव ।

CARRYING CAPACITY OF DUMPING YARD

SN	Location of Dumping Yard			Type of Land	No	Size of Catchment Area of Wire Crate			Quantity (CuM)
	Chainage	Latitude (N)	Longitude (E)			Length in M	Width in M	Height in M	
1	0/0 to 0/2	29°27'13.79"N	80°14'47.92"E	Civil	1	30.00	20.00	4.60	2760.00
2	1/4 to 1/6	29°27'17.33"N	80°14'48.64"E	Civil	1	30.00	20.00	4.50	2700.00
3	1/40 to 2/2	29°27'31.24"N	80°14'30.64"E	Civil	1	30.00	20.00	5.50	3300.00
4	2/19 to 2/21	29°27'32.85"N	80°14'40.95"E	Civil	1	30.00	20.00	6.00	3600.00
5	3/20 to 3/22	29°27'27.53"N	80°15'4.90"E	Civil	1	30.00	20.00	5.55	3330.00
6	4/18 to 4/20	29°27'26.05"N	80°15'19.42"E	Civil	1	30.00	20.00	6.00	3600.00
7	5/3 to 5/5	29°27'34.58"N	80°15'33.36"E	Civil	1	30.00	20.00	5.35	3210.00
8	6/12 to 6/14	29°27'28.52"N	80°15'59.65"E	Civil	1	30.00	20.00	5.75	3450.00
9	7/40 to 8/2	29°27'12.20"N	80°15'52.86"E	Civil	1	30.00	20.00	5.50	3300.00

Total = 29250.00

Carrying Capacity of Dumping Yard = 29250.00 CuM

Total Quantity of Material to be disposed to the Dumping Yard = 29177.17 CuM

Signature
J.E.

Signature
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

Signature
अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम : जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग (8.050 किमी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

CARRYING CAPACITY OF DUMPING YARD

SN	Location of Dumping Yard			Type of Land	No	Size of Catchment Area of Wire Crate		Quantity (SqM)
	Chainage	Latitude (N)	Longitude (E)			Length in M	Width in M	
1	0/0 to 0/2	29°27'13.79" N	80°14'47.92" E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
2	1/4 to 1/6	29°27'17.33" N	80°14'48.64" E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
3	1/40 to 2/2	29°27'31.24"N	80°14'30.64"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
4	2/19 to 2/21	29°27'32.85"N	80°14'40.95"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
5	3/20 to 3/22	29°27'27.53"N	80°15'4.90"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
6	4/18 to 4/20	29°27'26.05"N	80°15'19.42"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
7	5/3 to 5/5	29°27'34.58"N	80°15'33.36"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
8	6/12 to 6/14	29°27'28.52"N	80°15'59.65"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00
9	7/40 to 8/2	29°27'12.20"N	80°15'52.86"E	Civil	1	30.00	20.00	600.00

5400.00

मोटर मार्ग निर्माण के दौरान उत्सर्जित मलवा के निस्तारण हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि

= 0.54 Hect.

मोटर मार्ग हेतु आवश्यक सिविल सोयम भूमि

= 6.25 Hect.

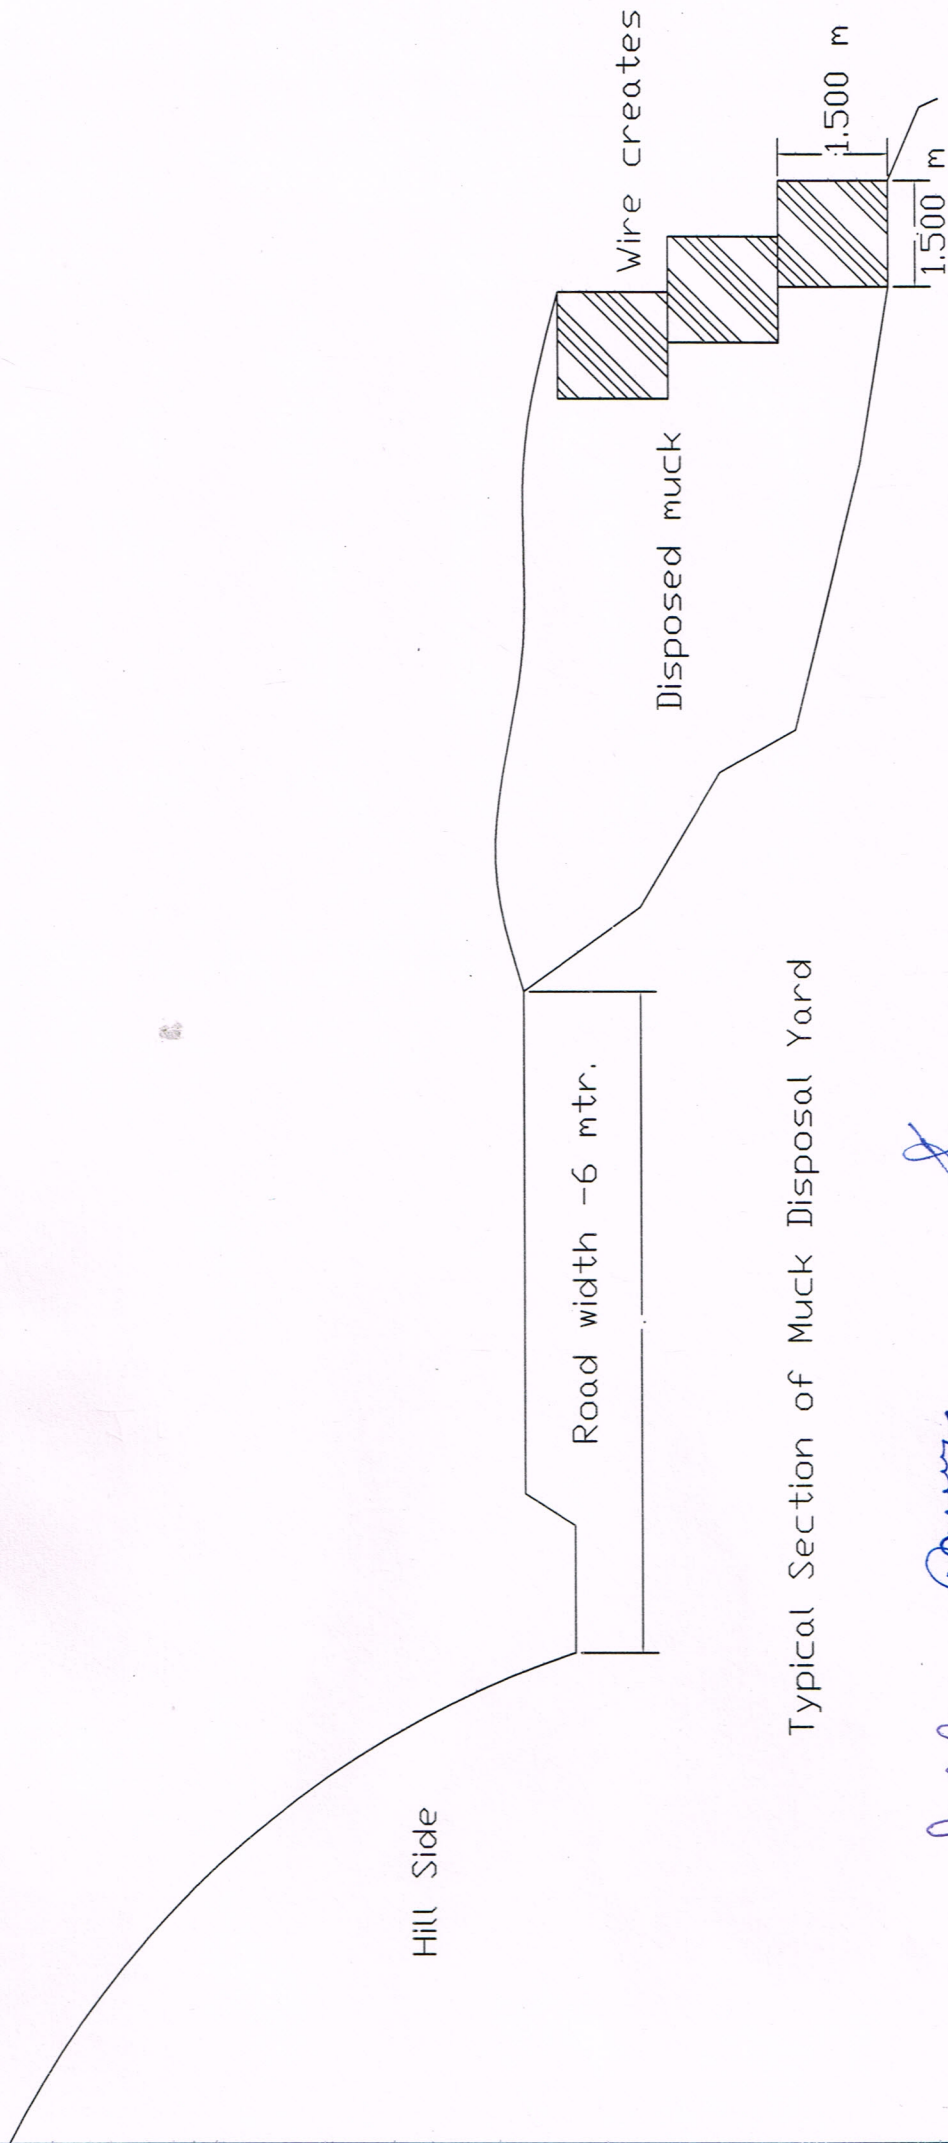
मोटर मार्ग हेतु आवश्यक कुल सिविल सोयम भूमि

= 6.79 Hect.

fajesh law
J.E.

Amey
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

f
अधिसूची अभियन्ता
वाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़



J. E.

सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोननिविड
पिथौरागढ़

अधिक्षेत्री अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लोननिविड
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



START POINT

0/0 to 0/2



1/4 to 1/6

Sajeshwar
J.E.

Ram
सहायक अभियंता
सिंचाई खण्ड लो०नि०
पिथौरागढ़

S
अधिशार
सिंचाई खण्ड लो०नि०
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



1/40 to 2/2



2/19 to 2/21

ajesh kumar
J.E.

Ramy
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

[Signature]
अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई ख० लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से
रौतगढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



1/40 to 2/2



2/19 to 2/21

Fajesh Law
J.E.

Dany
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

[Signature]
अधिसासी अभियन्ता
सिंचाई ख० लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से रौतगड़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



3/20 to 3/22



4/18 to 4/20

Fajesh Law
J.E.

Ram
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

J
अधिशामी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



5/3 to 5/5



6/12 to 6/14

rajesh law

J.E.

Ramy

सहायक ज.

सिद्धार्थ खण्ड लोणमण्डल-नाई खण्ड लोणमण्डल-0
पिथौरागढ़

f

अधिसारी अभियन्ता

पिथौरागढ़

जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत सल्ला सेल से रौतगढ़ा मोटर मार्ग के निर्माण हेतु (लम्बाई 8.050 किमी०)



END POINT
7/40 to 8/2

ajesh fm
J.E.

Amey
सहायक अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़

S
अध्यासी अभियन्ता
सिंचाई खण्ड लो०नि०वि०
पिथौरागढ़
