



परियोजना का नाम— जनपद चमोली में विधान सभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अर्न्तगत उमट्टा—बरसाली—मौणा मोटर मार्ग का बैरफाला—काण्डा तक विस्तारीकरण का निर्माण कार्य।


परियोजना से उत्पादित मलवें के निस्तारण की समानचित्र योजना


प्रमाणित किया जाता है कि उक्त परियोजना में मलवे निस्तारण का समानचित्र योजना संलग्न की गयी है।

  
अमीन  
लो.नि.वि.

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

  
सहायक अभियन्ता  
लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग

  
अधिशासी अभियन्ता  
प्रान्तीय खण्ड लो.नि.वि.  
कर्णप्रयाग


  
उप वहा/सरक्षक  
समूह/आगीय वनाधिकारी  
गोपेश्वर (चमोली)

  
वन क्षेत्राधिकारी  
नन्दप्रयाग रेंज  
बदीनाथ वन प्रभाग गोपेश्वर


### Detail of Muck Disposal Sites

कार्य का नाम:- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा-बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12.00 मीटर स्पान सेतु का निर्माण कार्य।

1	2	3	5	6	7	8	9	10	11
SL NO	Location of Dumping yard	Type of Land	Khasra No.	Length (in M)	Width (in M)	Hight of the Dumping Zone (in M)	Volume of the Dumping Zone (in M)	Latitude (N)	Longitude (E)
	xs 6/8 to 6/10	नाप भूमि		25	20	6	3000	30°15'52.6"	79°14'24.6"
	xs 6/29	नाप भूमि		20	15	6	1800	30°15'52.3"	79°14'41.5"
	xs 7/21	नाप भूमि		30	20	6	3600	30°16'14"	79°14'48.6"
	xs 9/25	नाप भूमि		30	30	6	5400	30°16'29.00"	79°15'17.7"
	xs 10/2	नाप भूमि		30	28	6	5040	30°16'14.1"	79°15'22.8"
Total				135	113		18840		

  
Junior Engineer  
Pro. Div. P.W.D.  
Karanprayag

  
Assistant Engineer  
Pro. Div. P.W.D.  
Karanprayag

  
Executive Engineer  
Pro. Div. P.W.D.  
Karanprayag

### Detail of Muck Disposal at Site

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमदटा बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12 मीटर स्पान सेतु का निर्माण कार्य।

Material Received Due to Hill side Cutting  $7 \times 3 / 2 \times 5000.00 = 52500.00$  Cum  
 Add Swell Factor @ 40% = 21000.00 Cum  
**Total = 73500.00 Cum**

**Use of Material-**

SI.N.	Length of Road	Item for Which Material is to used	Quantity of Material Consumed (in cum)
1	2	3	4
1	5.000	Stone masonry in cement sand mortar	800.00
2	5.000	Stone masonry in laid dry	4000.00
3	5.000	Hand packed stone filling	900.00
4	5.000	Construction of wire crates	900.00
5	5.000	Construction of Parapets	1825.00
6	5.000	Construction of road side Drain	1000.00
7	5.000	Construction of scuppers	350.00
8	5.000	Concreting works	900.00
9	5.000	Construction of coolie walling	4000.00
10	5.000	Construction of Edge Stone	500.00
11	5.000	Construction of Causeway	300.00
12	5.000	Granular Sub-base (GSB)	17718.75
13	5.000	G2 works	9843.75
14	5.000	G3 (Grading to be done using granulator at site)	4000.00
15	5.000	Super Elevation and patri filling	3500.00
<b>Total</b>			<b>50537.50</b>


<b>Material Left for Disposal (73500.00 - 50537.50= 22962.50)</b>	<b>22962.50 Cu.m</b>
<b>As per the attached Detail, the capacity</b>	<b>24240.00 Cu.m</b>
<b>Area Of the dumping zone</b>	<b>27380.00 Sq.m</b>

  
**Junior Engineer**  
 Provincial Division, PWD  
 Karanprayag

  
**Assistant Engineer**  
 Provincial Division, PWD  
 Karanprayag

  
**Executive Engineer**  
 Provincial Division, PWD  
 Karanprayag

कार्य का नाम :- जनपद चमोली के विधानसभा क्षेत्र कर्णप्रयाग के अन्तर्गत उमट्टा बरसाली मोटर मार्ग का बैरफाला-काण्डा तक विस्तारीकरण एवं 12 मीटर स्पान सेतु का निर्माण कार्य।

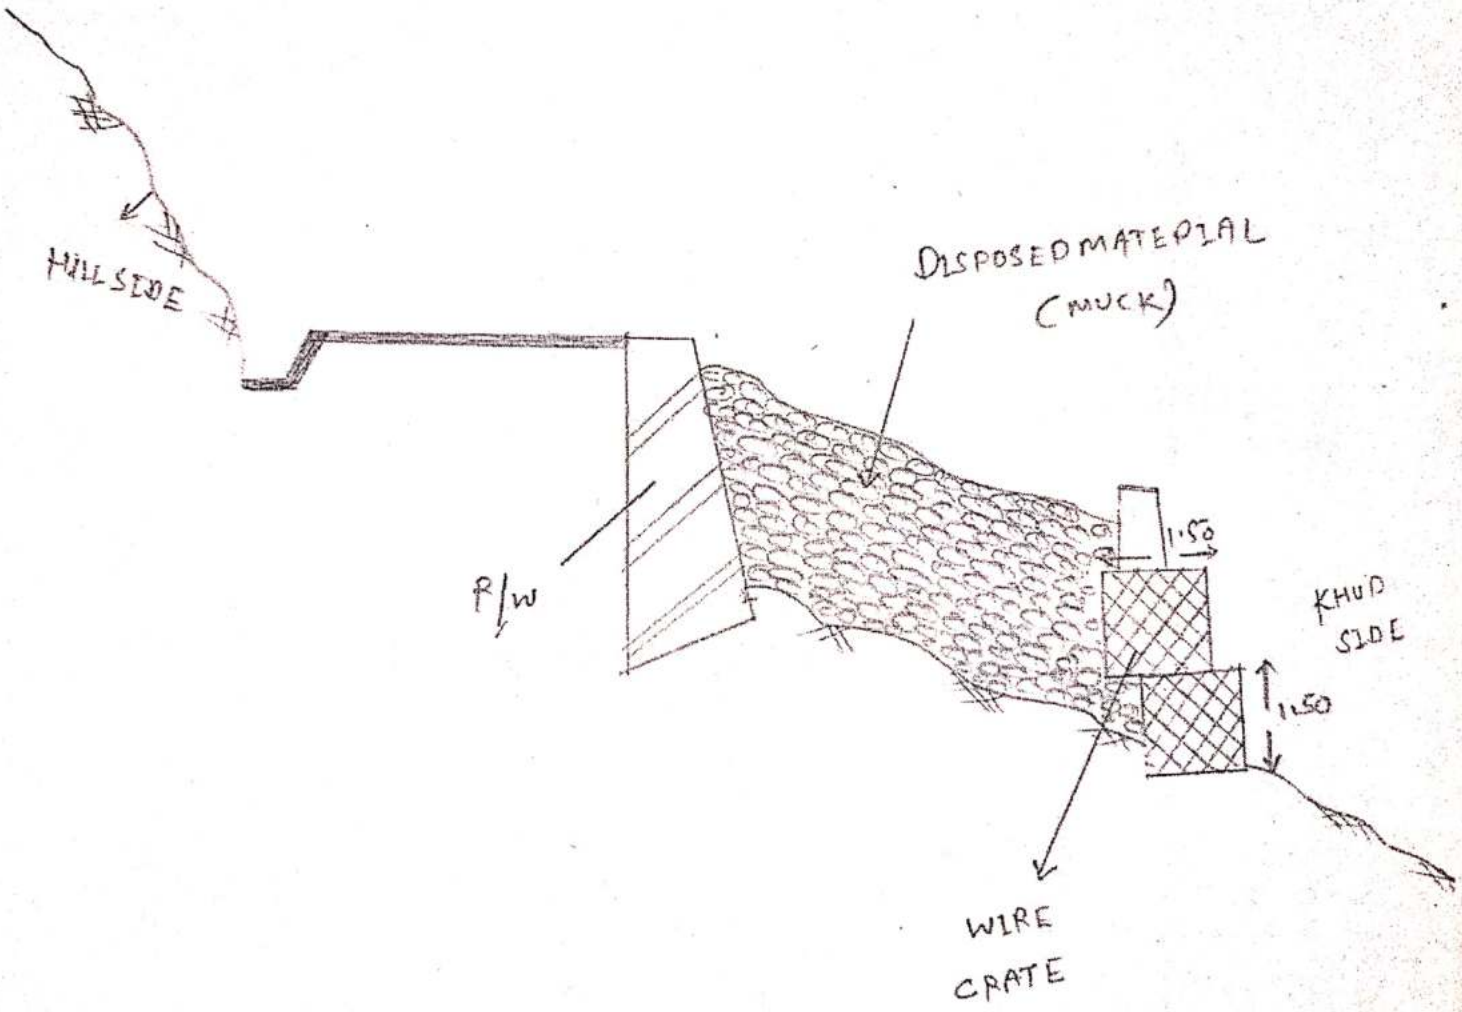

*[Handwritten signature]*

सहायक अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 कर्णप्रयाग

अधिशासी अभियन्ता  
 प्रान्तीय खण्ड लो०नि०वि०  
 कर्णप्रयाग

DRAWING OF MUCK DISPOSAL
