

उत्तराखण्ड शासन

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

8वां वृत्त, लोक निर्माण विभाग
नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर

मलवा निस्तारण प्रस्ताव

Name Of Work:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

अनुमानित लागत

Rs. 4.80



लाख

INDEX

Name Of Work:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

Sl. No.	Detail	Page
1	Title Page	1
2	Index	2
3	List Of Officers	—
4	Report	3
5	Annexures	—
6	Specifications	4
7	Analysis Of Rates	5
8	Detail Of Measurement	6-8
9	Bill Of Quantity	9
10	Summary of Estimated Cost	10

List of Names of Concerned Engineers Associated With The Estimating & Costing

Sl. No.	Name of Officials	Designation	Signature With Date
1	Er. B. P. Nautiyal	Executive Engineer	
2	Er. P.S.Bartwal	Assistant Engineer	 15/3/16
3	Er. Arvind Dyundi	Junior Engineer (Technical)	
4	Er. Ajay Panwar	Junior Engineer	

प्रतिवेदन


कार्य का नाम:— जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य।
(लम्बाई 4.500 कि०मी०)।


जनपद टिहरी गढ़वाल के विकासखण्ड देवप्रयाग में जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य शासनादेश 1144/111(2)/14-72(प्र०आ०)/2013 दिनांक 04.03.2014 द्वारा कुल लम्बाई 4.500 कि०मी०, लागत 62.24 लाख प्रथम चरण स्वीकृत है। उपरोक्त मोटर मार्ग पर वन भूमि पड़ने के कारण वन भूमि हस्तान्तरण पत्रावली गठन की कार्यवाही की जा रही है।

अतः उक्त के क्रम में मलवा निस्तारण प्रस्ताव गठित किया जा रहा है।

इस विस्तृत प्रस्ताव में मलवा निस्तारण हेतु तीन डम्पिंग जोन बनाये गये हैं। जिनमें मलवा निस्तारण करने हेतु रिटेनिंग वॉल का निर्माण किया जायेगा।

उपरोक्त वर्णित कार्यो हेतु कुल लागत रु० 4.80 लाख का प्रस्ताव गठित कर स्वीकृति हेतु प्रस्तुत है।


SE (PWA)


सहायक अभियन्ता


अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर,
मुख्यालय-कीर्तिनगर

SPECIFICATIONS

Name Of Work:- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

ALL THE WORKS SHALL BE EXECUTED STRICTLY AS PER THE APPROVED SPECIFICATIONS OF UTTARANCHAL PUBLIC WORKS DEPARTMENT AND ISSUED CIRCULARS / DIRECTIONS BY CHIEF ENGINEER


Assistant Engineer
Temp. Div. PWD Srinagar
Headquarter: Kirtinagar




Executive Engineer
Temp. Div. PWD Srinagar
Headquarter: Kirtinagar


(4)
106

Analysis of Rate

Name Of Work: जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

Block: Devprayag

SN	Description	Rate	Unit
66837 11-1-1-1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in-charge	Cu.m	Rs. 193.00
72239 16-9-2-1	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each. (As per PWD Uttarakhand Specification)	Cu.m	Rs. 1,088.70


J.E.



Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar



Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

Item of work	No	L	W/B	H/D	Quantity
2	3	4	5	6	7
earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & breast walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in-charge					
Site No. 1 (K.M. 3)					
(1st part)	1x 1/2	30.00	1.50	0.75	16.88 Cum.
(2nd part)	1x 1/2	25.00	1.50	0.75	14.06 Cum.
Site No. 2 (K.M. 4)					
	1x 1/2	21.00	1.50	0.75	11.31 Cum.
Site No. 3 (K.M. 5)					
(1st part)	1x 1/2	20.00	1.50	0.75	11.25 Cum.
(2nd part)	1x 1/2	21.00	1.50	0.75	11.81 Cum.
				Total	65.81 Cum.
Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & S:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Specification)					
Site No. 1 (K.M. 3)					
Quantity for Wire Crates in 2 layer (1st part)	1x 2	30.00	1.50	1.50	135.00 Cum.
Quantity for Wire Crates in 2 layer (2nd part)	1x 2	25.00	1.50	1.50	112.50 Cum.
Site No. 2 (K.M. 4)					
Quantity for Wire Crates in 1 layers	1x 1	21.00	1.50	1.50	47.25 Cum.
Site No. 3 (K.M. 5)					
Quantity for Wire Crates in 1 layers (1st part)	1x 1	20.00	1.50	1.50	45.00 Cum.
Quantity for Wire Crates in 1 layers (2nd part)	1x 1	21.00	1.50	1.50	47.25 Cum.
				Total	387.00 Cum.
Required area of Nap Land					
Site No. 1 (K.M. 3)					
Area of Nap Land for Dumping-1 Part-1	1x 1	30.00	12.00	-	360.00 Sqm
Area of Nap Land for Dumping-1 Part-2	1x 1	25.00	10.00	-	250.00 Sqm
Site No. 2 (K.M. 4)					
Area of Nap Land for Dumping-2	1x 1	21.00	9.00	-	189.00 Sqm
Site No. 3 (K.M. 5)					
Area of Nap Land for Dumping-3 Part-1	1x 1	20.00	10.00	-	200.00 Sqm
Area of Nap Land for Dumping-3 Part-2	1x 1	21.00	12.00	-	252.00 Sqm
Total Area of Naap Land				Total	1251.00 Sqm
10000 Sqm = One Hect.					0.125 Hec
Area of dumping vard					0.13 Hec


C.E.

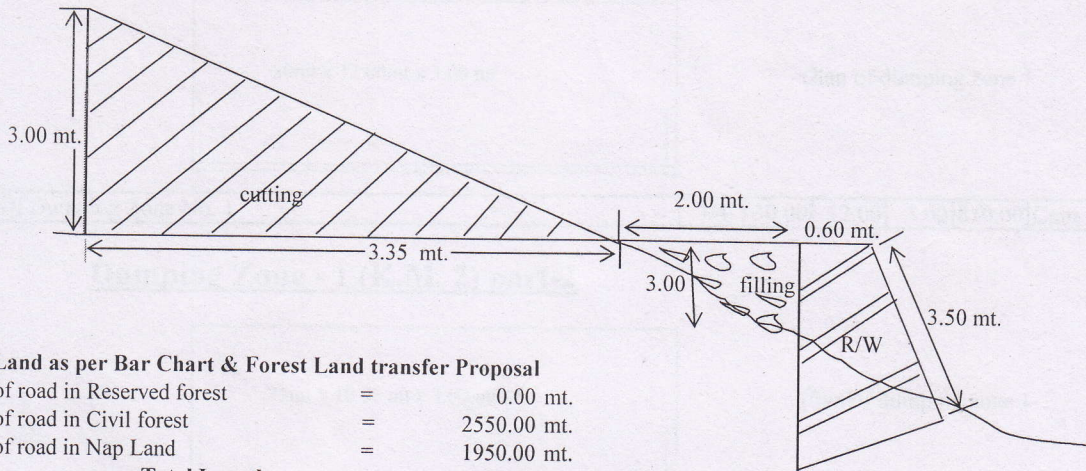

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

Total quantity of Muck generated from road cutting

Typical X-Section of Road



Forest Land as per Bar Chart & Forest Land transfer Proposal

A	Length of road in Reserved forest	=	0.00 mt.
B	Length of road in Civil forest	=	2550.00 mt.
C	Length of road in Nap Land	=	1950.00 mt.
	Total Length	=	4500.00 mt.
	Total Forest Length	=	2550.00 mt.

Calculation of Muck As Above Length

1	Quantity of muck generated from cutting		1	x	1/2	2550.00	3.35	3.00	12813.75	Cum.
2	Quantity of muck from scupper & catch pit									
A	Quantity of muck from scupper in civil land	4.50	x	3.00	3.35	3.00	3.00		407.03	Cum.
B	Quantity of muck from catch pit in civil land	4.50	x	3.00	(1.5x1.5+2.1x2.1)/2		2.50		133.20	Cum.
	Quantity of muck from Sl No 1. & 2 as above.							G-Total	13353.98	Cum.
3	Taking E.B, O.R & H.R @ 50%, 20%, & 30% respectively									
i.	30% E.B	13353.98	x	0.30	=				4006.19	Cum.
ii.	40% O.R.	13353.98	x	0.40	=				5341.59	Cum.
iii.	30% H.R.	13353.98	x	0.30	=				4006.19	Cum.
					Total =				13353.97	Cum
4	Quantity of muck as swell factor of (E.B. only)	1.25	x	4006.19				5007.74		Cum
5	Quantity of total muck from point ii., iii., & 4			Sl. No (i + ii + 4) =				14355.52		Cum
	Quantity of total muck Generated				Say			14355.52	Cum	

Disposal & use of material

1	Quantity used for super elevation, grade improvement & patrie filling of road @ 10%	= (14355.52 x 10/100) =		1435.55	Cum		
2	Quantity erodes by wind and water @ 20% of (E.B. only)	= (5007.74 x20/100) =		1001.55	Cum		
3	Quantity of muck disposed in filling (retained by R/W) in 40% length	= (2550.00 x 2.00 x 3.00)/2 x 0.40		3060.00	Cum		
4	Quantity of stones usedScuppers and catch pit @ 57.00 cum. Per no.	= 57.00 x 8.00 x4.35		1983.60	Cum		
5	Quantity of stones used in R/W in 40% length	= 2550 x (0.60+1.77)/2 x 3.50 x 0.40		4230.45	Cum		
6	Quantity of stones used in Wire Crates for 3 dumping zones	As per details		387.00	Cum		
	Total quantity of muck used at site including weathering by nature			12098.15	Cum		
Quantity of muck retained		=	14355.52	-	12098.15	=	2257.37 Cum.

निस्तारित की जाने वाली मलवे की मात्रा =

2257.37 Cum अथवा 2257.00 Cum

इस प्रकार से उत्सर्जित मलवे का लगभग सम्पूर्ण उपयोग सतह की रिग्रेडिंग एवं दीवार निर्माण आदि के प्रयोग में तथा सुपर एलीवेशन व पटरी फिलिंग आदि में हो जायेगा जिससे स्थानीय वनस्पति को क्षति नहीं पहुंचेगी एवं भू-क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी।

अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु मार्ग पर ऐसी जगह चिन्हित किये जा रहे हैं जिससे वन सम्पदा आदि की क्षति नहीं होगी। निस्तारित किये जाने वाले स्थानों का प्रस्ताव संलग्न लाईन डायग्राम में दर्शाया जा रहा है।

(Signature)

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

109 (8)

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।


Dumping Zone - 1 (K.M. 3) part-1



Plan of dumping zone 1

Capacity Of Dumping Zone No. 1	=	3/4	30.00	12.00	3.00	810.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----


Dumping Zone - 1 (K.M. 2) part-2



Plan of dumping zone 1

Capacity Of Dumping Zone No. 1	=	3/4	25.00	10.00	3.00	562.50	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----


Dumping Zone - 2 (K.M. 4)



Plan of dumping zone 2

Capacity Of Dumping Zone No. 2	=	3/4	21.00	9.00	1.50	212.63	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	------	------	--------	-----


Dumping Zone - 3 (K.M. 5) part-1



Plan of dumping zone 3

Capacity Of Dumping Zone No. 3	=	3/4	20.00	10.00	2.00	300.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----

Dumping Zone - 3 (K.M. 5) part-2



Plan of dumping zone 3

Capacity Of Dumping Zone No. 3	=	3/4	21.00	12.00	2.00	378.00	Cum
--------------------------------	---	-----	-------	-------	------	--------	-----

Total quantity of muck retained by Dumping zone 1 (part 1 & part 2),

Dumping zone 2 & Dumping zone 3

= 2263.13 Cum.


[Signature]
J.E.


[Signature]
Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


BILL OF QUANTITY

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

Sl. No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Earthwork in excavation for structures as per drawing and technical specifications Clause 305.1 including setting out, construction of shoring and bracing, removal of stumps and other deleterious material and disposal upto a lead of 50 m, dressing of sides and bottom and backfilling in trenches with excavated suitable material. Excavation in foundation for retaining & brest walls in all types of soils and rocks including lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer-in-charge	65.81	Cum.	193.00	Cum.	12701.81
2	Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 10 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)	387.00	Cum.	1088.70	Cum.	421326.90
4	Total Area of Naap Land	0.125	Hec	370000.00	Hec	46287.00
				Total		480315.71


J.E.


Assistant Engineer
Prov. Div. P.W.D.
New Tehri


Executive Engineer
Prov. Div. P.W.D.
New Tehri

आगणन की लागत का सारांश


Name of Work :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।


क्रम संख्या	विवरण	लागत (लाख में)
1	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।	Rs.480,315.71
	योग	Rs.480,315.71
	अर्थात् लाख रू० में	Rs.4.80


आगणन की लागत का सारांश

Name of Work :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।

क्रम संख्या	विवरण	लागत (लाख में)
1	जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से बारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग निर्माण कार्य। (लम्बाई 4.500 कि०मी०)।	Rs.480,315.71
	योग	Rs.480,315.71
	अर्थात् लाख रू० में	Rs.4.80


कनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


सहायक अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर


अधिशाली अभियन्ता
अ०ख०, लो०नि०वि० श्रीनगर
मुख्यालय-कीर्तिनगर

Photos Of Dumping Zone

कार्य का नाम :- जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अंतर्गत जामणीखाल से चौड़ियों से वारगुरु से भैंसकोट मोटर मार्ग का निर्माण।

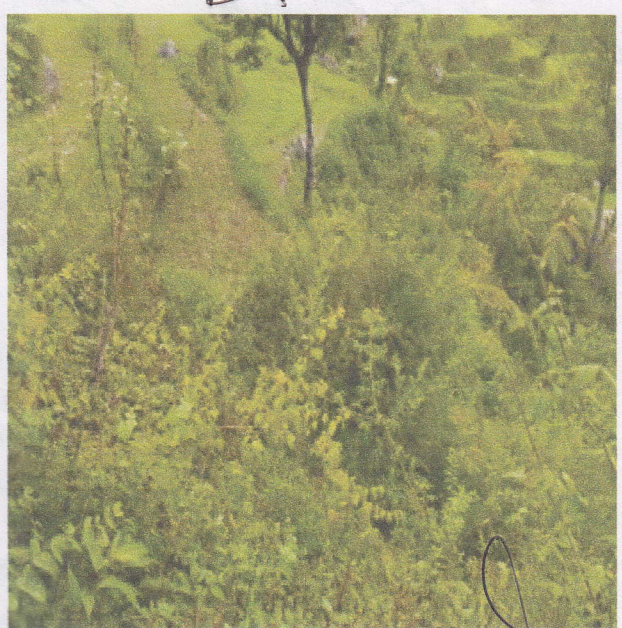
D. ZONE-1



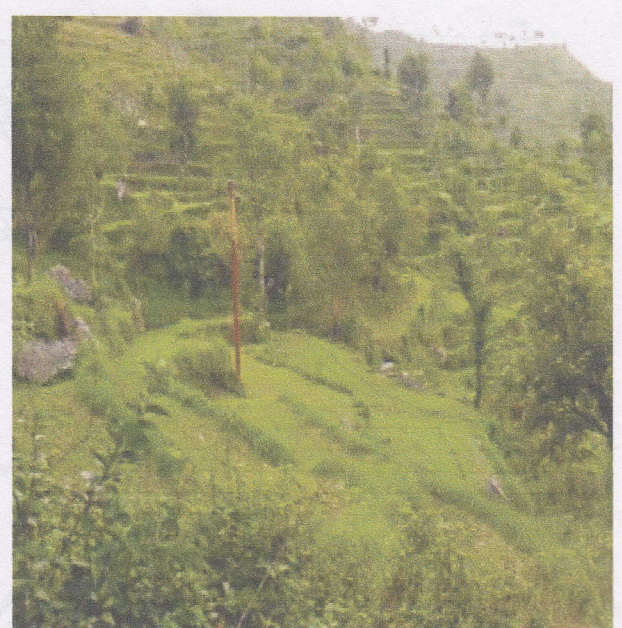
D. ZONE-1



D. ZONE-2



D. ZONE-2



(Signature)

बटवारा-नामस
बहुसीम-देवप्रयाग
विशुद्ध गढ़वाल

उप जिलाधिकारी
कीर्तिनगर, दि. १०

(Signature)

(Signature)
सहायक अभियन्ता
उप जिलाधिकारी
मुख्य कीर्तिनगर
Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirinagar

(Signature)

Executive Engineer
T.D. P.W.D. Srinagar
H.Q. Kirinagar

तहसीलदार
देवप्रयाग, टिहरी
५/५
२५/०४/१६
SDM

सेवा में

अधीन आधीन प्रहरीय सर्वजनिक निर्माण विभाग कोटिनिगर
नैटरी गढ़वाल।

विषय :- जामनीखाल में चौड़िया, बारगुर होटल भू-मालिक प्रो. प्रग के
निर्माण में होनेवाले भवन उत्सर्जन के सम्बन्ध में।

भू-मालिक

उपरोक्त के काम में आपके के अवाग काता है कि ग्राम (भा)
की सन्धीमिट प्रो. प्रग में होने वाली भूमि, जो निर्माण में प्रयोगात्म-
क होगी, इसका भवन उत्सर्जन में ग्राम (भा) को कोई आपत्ती
नहीं होगी। मात्र व्यापक गत भूमि जो वन में आयेगी, प्रावधानों के
तहत इसका ही भू-आवना प्रदत्त करने को कहा जायेगा।

इस पर भी अवाग काता-वाइते है कि उक्त
प्रो. प्रग में कोई भी वन भूमि, आदि वाली भूमि अज्ञातियों
की भूमि इस ग्राम (भा) के अन्तर्गत नहीं आती है।

अतः उक्त अनापत्ती प्रमाण पत्र स्वीकार में
प्रेषित है।

भू-मालिक :-



विशाला देवी
सदस्य

क्षेत्र पंचायत-रुमघाट
दि. 05. 07. 2016


उद्धरण खतौनी

ग्राम क्रमांक : 54070102004 ग्राम का नाम : भैंसकोट

तहसील : देवप्रयाग जनापद : तिहरी गढ़वाल

परगना : देवप्रयाग भाग : 1 USU/28/1/2015 फसली वर्ष : 1418-1423

खता खतौनी क्रम संख्या	खातेदार का नाम	पिता/पति/संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या (हे.)	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल	खातेदार द्वारा देय मालपुजारी या सयान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा वैधानिक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7-12	13		
श्रेणी:	1-क - भूमि जो संक्रमणीय भूमिधरो के अधिकार में हो।								
00012	जगत सिंह दर्शियान सिंह दलेब सिंह जगमोहन सिंह आनन्द सिंह कलपत सिंह मोर सिंह किर्ति सिंह कुबेर सिंह जगतसिंह सत्ये सिंह गुलाबसिंह दलेबसिंह औतार सिंह	गोकल सिंह 1/2हि0 मदन सिंह मदन सिंह मदन सिंह मदन सिंह वचन सिंह कमल सिंह कमल सिंह हुकूमसिंह हुकूमसिंह हुकूमसिंह मकानसिंह मकान सिंह 1/2हि0	नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम नि.ग्राम	1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म् 1377म्	49 50 53 55 56 57 81 86 87 88 89 90 91 92 93 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116	0.0400 0.0490 0.0240 0.0280 0.0290 0.0290 0.0210 0.0210 0.0160 0.0190 0.0460 0.0350 0.0410 0.0960 0.0260 0.0190 0.0130 0.0240 0.0230 0.0380 0.0110 0.0290 0.0210 0.0060 0.0200 0.0240 0.0280 0.0080 0.0200 0.0410 0.0310 0.0490 0.0160 0.0350		**टिप्पणी** बाद सं०-156/08, ता० २०-28-07-08 के खसरा नं०-93म्, 10/२म्, 103म्, 104म्, 164म्, 165, 166 रकबा क्रमशः 0.004, 0.015, 0.005, 0.004, 0.010, 0.010, 0.04॥ हे० भूमि, भूरा० ०-80 को विक्रेता जगतसिंह पुणमकुलसिंह के नाम/अंश से खारिज कर ले० नि० वि० कीर्तिनगर के नाम ।	



हस्ताक्षर
सहायक अभियन्ता
५० ख०. लो० नि० वि० श्रीनगर
मु. कीर्तिनगर

102004

ग्राम का नाम : सैसकोट

जतपद : विहरी गडवाल

परगना : देवप्रयाग

भाग : 1

फसली वर्ष : 1418-1423

USU/28/1/2015

ग्राम का नाम	पिता/पति/संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौतिक अधिकार प्राप्त होने का फसली वर्ष	खाले के प्रत्येक गेटे की खसरा संख्या (हे.)	खाले के प्रत्येक गेटे का क्षेत्रफल (हे.)	खालेदार द्वारा देय मासखुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद	टिप्पणी
			3	4	5	6	7-12	13
			1377प्	117	0.0350			
			1377प्	118	0.0340			
			1377प्	119	0.0230			
			1377प्	160	0.0460			
			1377प्	161	0.0250			
			1377प्	162	0.0400			
			1377प्	164	0.0500			
			1377प्	165	0.0100			
			1377प्	166	0.0490			
			1377प्	167	0.0400			
			1377प्	168	0.0480			
			1377प्	306	0.0060			
			1377प्	307	0.0080			
			1377प्	473	0.0040			
			1377प्	474	0.0240			
			1377प्	475	0.0090			
			1377प्	477	0.0060			
			1377प्	478	0.0030			
			1377प्	479	0.0060			
			1377प्	480	0.0050			
			1377प्	546	0.0090			
			1377प्	1426	0.0010			
			1377प्	1465	0.0110			
			1377प्	1494	0.0100			
			1377प्	1495	0.0060			
			1377प्	1496	0.0060			
			1377प्	2278	0.0350			
योग :			61	1.5250	13.30			

व्यक्ति

हस्ताक्षर प्रमाणित

सहायक अभियंता
श्री. खो. लो. नि. वि. श्रीनगर
मु. कीर्तिनगररजिस्ट्रार
हिसार-देवप्रयाग
दिनांक 28/1/2015

116

निवास:-

सूरत सिंह राणा

प्रधान

वायत जोग्याणा-भलडियाणा

ग्राम- भलडियाणा, पोस्ट- जामणीखाल
जिला-टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)
मो. 7895272365, 9639128856

दिनांक 12/02/2016

अनापति प्रमाण पत्र

हमके निवासी आप पचायत जोग्याणा - भलडियाणा, पट्टी चन्द्रबदनी, तहसिल - देवप्रयाग जिला टिहरी गढ़वाल यह अनापति प्रमाण पत्र इस आधार से अपने घर छोड़, बिना किसी नक्का किए, बिना किसी के बहाने एवं सदी, हज्जत रूप से लिये कर देते हैं कि जनपद टिहरी गढ़वाल में राज्य योजना के अन्तर्गत जामणीखाल से चोखीयाँ से बागुहा से अलेकोट मोटर मार्ग पर निर्माण कार्य पर जानेवाली भूखि, खिर्कल मोचन व भूखि, कशन, इनम हौन पर कोई आपति नहीं है। यह भूखि किसी आदिवासी व गैर आदिवासी का मकान स्थान भूखि कार्य प्रयोग के नहीं है। इस कारण आप पचायत वार्ड प्रमाण 231 पर अपने हस्ताक्षर से अनापति प्रमाण पत्र प्रस्तुत करते हैं तनउ हे वक्त पर काय आवे।





כ"ו

10/1/20

118

26

1

2

पिता/पति/संरक्षक का नाम	निवास स्थान	भौमिक अधिकार प्रारम्भ होने का फसली वर्ष	खाते के प्रत्येक गाटे की खसरा संख्या (हे.)	प्रत्येक गाटे का क्षेत्रफल (हे.)	खातेदार द्वारा देय मालगुजारी या लगान	परिवर्तन सम्बन्धी आज्ञा या उसका सारांश, उनकी संख्या तथा दिनांक सहित और आज्ञा देने वाले अधिकारी का पद
		3	4	5	6	7-12
		1377प्	621	0.0040		
		1377प्	622	0.0980		
		1377प्	623	0.0310		
		1377प्	624	0.0300		
		1377प्	626	0.0200		
		1377प्	627	0.0310		
		1377प्	628	0.0100		
		1377प्	629	0.0040		
		1377प्	630	0.0130		
		1377प्	631	0.0260		
		1377प्	632	0.0240		
		1377प्	633	0.0050		
		1377प्	635	0.0180		
		1377प्	636	0.0040		
		1377प्	638	0.0180		
		1377प्	639	0.0260		
		1377प्	640	0.0230		
		1377प्	641	0.0260		
		1377प्	642	0.0190		
		1377प्	643	0.0510		
		1377प्	645	0.0050		
		1377प्	649	0.0260		
		1377प्	652	0.0130		
		1377प्	653	0.0250		
		1377प्	654	0.0380		
		1377प्	1961	0.0060		
		1377प्	1963	0.0160		
		1377प्	1964	0.0150		
		1377प्	2064	0.0400		
		1377प्	2065	0.0210		
		1377प्	2066	0.0550		
		1377प्	2260	0.0110		



योग : 66 1.4750 12.40

पतिलिपि

रजिस्ट्रार-देवप्रयाग
हसील-देवप्रयाग
देवप्रयाग
