

A- 2.19 (80)
(73)


MUCK DISPOSAL PLAN


MUCK DISPOSAL PLAN

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में थराली से पैनगड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 हे० सिविल / आरक्षित पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
लम्बाई 8.725किमी०।

S.NO	Item of Work	No.	Length	Width	Height	Quantity	Unit
MUCK THAT EXPECTED TO GENERAT FROM							
i)	From hill side cutting .Taking average .Width of road $(6.85+5.95)/2 = 6.40$ m Assuming 3 m hight and width $6.40/2$ i.e. 3.20 m	1x1/2	8725.00	3.20	3.00	41880.00	CUM
ii)	From Construction of scupper. (Dimensions as per standard drawing .8 Nos scuppers per Km)	8.725X8	6.00	3.00	2.50	3141.00	CUM
TOTAL MUCK RECEIVED						45021.00	CUM
						A	
MUCK THAT PROPOSED TO CONSUME IN							
1	Earth and boulder filling in super - elevation. Total nos of curves in 1km =24 Nos 12 of them are convex curve.	1x12	40.00	7.00	$(0+0.70)/2$	1176.00	CUM
2	Construction of coolie walling	1x1	350.00	0.60	$(1.00+0.50)/2$	157.50	CUM
3	Construction of B/W	1x1	100.00	$(0.90+0.60)/2$	1.800	135.00	CUM
4	Construction of R/Wall	1x1	300.00	$(1.60+0.60)/2$	4.5	1485.00	CUM
5	Construction of wire create at places.	1x50	3.00	1.50	1.50	337.50	CUM
6	Hand Packed stone filling	1x1/2	400.00	1.00	2.00	400.00	CUM
7	Making of Edge stone	1x450	0.70	0.20	0.10	6.30	CUM
8	Construction of parapet	1x40	2.00	0.60	0.45	21.60	CUM
9	Construction of Pucca K.e drain	1x1	200.00	0.60	0.10	12.00	CUM
10	Construction of Scupper	8x8.725	$(7+7.50)/2$	1.00	2.00	1012.10	CUM
11	Construction of Causeway	1x3	10.00	7.00	0.50	105.00	CUM
TOTAL MUCK COSUMED						4848.00	CUM
BALANCE MUCK I.e (CUM).SHALL BE DISPOSED AT DUMPING YARDS.						B	
						40173.00	CUM


J.E


R.W.D. (P.M.G.S.Y.)
kpg


Executive Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y.
Division-Karanprayag

परियोजना का नाम :- जनपद चमोली के विकासखण्ड थराली में थराली से पैनगड़ लिंक मोटर मार्ग के निर्माण हेतु 4.812 हे० सिविल / आरक्षित पंचायत भूमि का ग्राम्य विकास विभाग को हस्तान्तरण प्रस्ताव।
लम्बाई 8.725किमी०।

BLOCK:- Tharali					DISTRICT:-CHAMOLI			
S.No.	Location of Dumping Yard(Km.)	Area in Sqm (Lenth x Width)	Area of Dumping Yard	Height of the Dumping Zone	Type of Land	Capacity of Dumping Yard CUM	Latitude N	Longitude E
1	0/2 to 0/07	125x3	375.00	3.00	Reserve	1125.00	30°5'19.830"N	79°29'0.336"E
2	1/03 to 1/08	125x3	375.00	3.00	Reserve	1125.00	30°5'24.706"N	79°28'57.250"E
3	1/18 to 1/36	450x5	2250.00	3.00	Civil	6750.00	30°5'23.736"N	79°28'23.598"E
4	2/20 to 2/32	300x5	1500.00	3.00	NAP	4500.00	30°5'24.661"N	79°27'41.482"E
5	3/15 to 3/25	250x5	750.00	3.00	NAP	2250.00	30°5'43.847"N	79°27'7.390"E
6	3/32 to 4/02	250x5	750.00	3.00	Civil	2250.00	30°5'44.955"N	79°26'49.774"E
7	4/15 to 4/35	500x5	2500.00	3.00	NAP	7500.00	30°5'49.239"N	79°26'45.675"E
8	5/15 to 6/10	875x5	4375.00	3.00	Civil	13125.00	30°5'52.880"N	79°26'31.031"E
9	6/17 to 6/30	325x3	975.00	3.00	Civil	2925.00	30°6'11.589"N	79°26'28.279"E
10	7/01 to 7/15	350x4	1400.00	3.00	NAP	4200.00	30°6'2.427"N	79°26'7.360"E
11	8/01 to 8/21	500x3	1500.00	3.00	Civil	4500.00	30°5'58.584"N	79°26'7.218"E
TOTAL						50250.00		

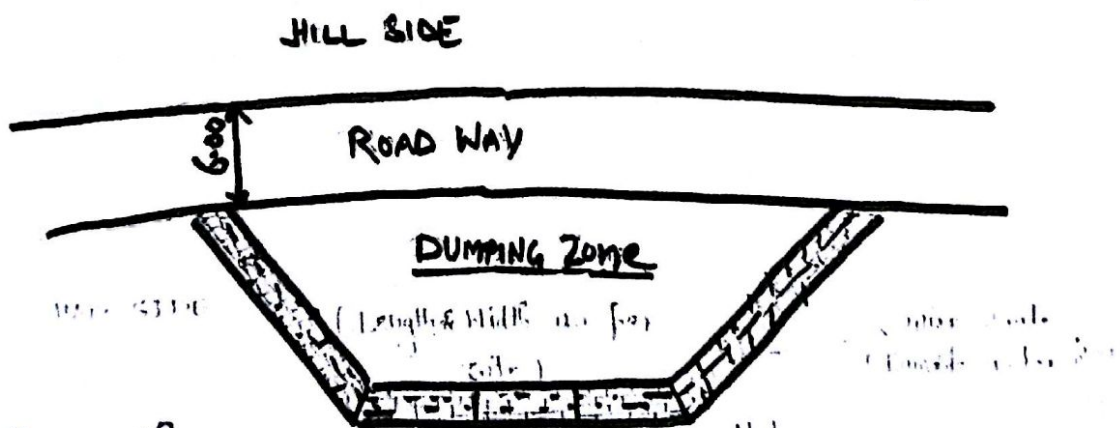
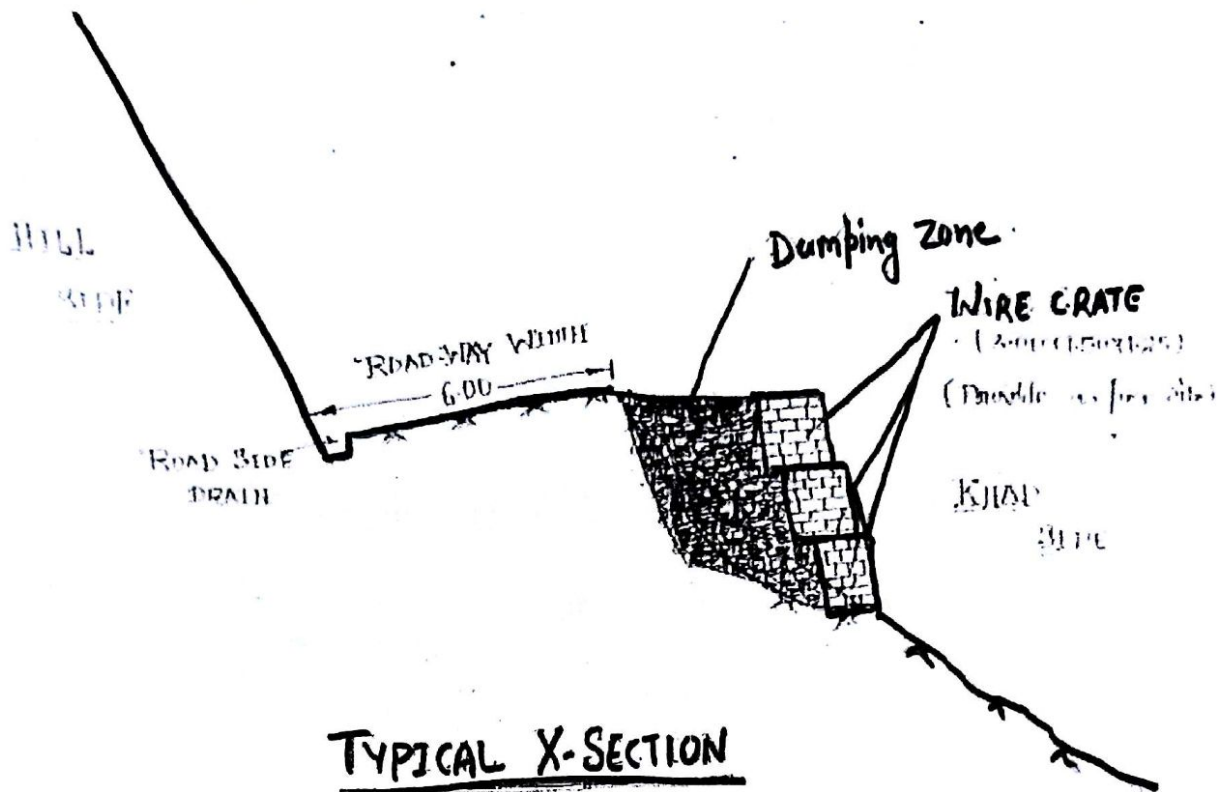
Summry of Debris Disposal					
S.No.	Total Debries	Disposal during construction	Re-Used material for Road Construction	Total Capacity of Dumping	Balance Debris
1	45021.00	40173.00	4848.00	50250.00	0.00

JE

AE
R.W.D. P.M.G.S.Y.
kpo

Executive Engineer
Rural Works Department
P.M.G.S.Y.
Division-Karanprayag

Name of Work & Muck disposal plan & Cross Section



Assistant Engineer
RWD. PMGSY
Karanprayag-1

Assistant Engineer
RWD. PMGSY
Karanprayag-1

मक डिस्पोजल की धनराशि वहन किये जाने हेतु प्रमाण पत्र

परियोजना का नाम:—जनपद चमोली के पी०एम०जी०एस०वाई० (आर०डब्लू०डी०) के अन्तर्गत थराली से पैनगढ मोटर मार्ग का निर्माण ।

प्रमाणित किया जाता है कि उक्त प्रकरण में मक डिस्पोजल हेतु समस्त धनराशि ग्राम्य विकास विभाग, उत्तराखण्ड द्वारा वहन की जायेगी ।




Executive Engineer
R.W.D. P.M.G.S.Y
Karanprava



AE

मक डिस्पोजल की योजना के सम्बन्ध में

परियोजना का नाम:-जनपद चमोली के पी0एम0जी0एस0वाई0 के अन्तर्गत थराली से पैनगढ मोटर मार्ग का निर्माण ।

उक्त मार्ग निर्माण हेतु प्रयोक्ता एजेन्सी द्वारा उत्पादित होने वाले मलवे के निस्तारण की योजना का अध्ययन किया गया तथा सन्तोषप्रद पाते हुए इससे सहमति प्रदान की गयी ।


बन क्षेत्राधिकारी
मध्य विण्डर वन क्षेत्र, थराली
बद्रीनारायण वन प्रभाग मोघेश्वर


उप वन संरक्षक
बद्रीनारायण वन प्रभाग मोघेश्वर


Executive Engr.
RWD, PMGSY
Karanprayag
