


## प्रपत्र

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडिहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## प्रमाण—पत्र


प्रामाणित किया जाता है कि—


- 1—स्वीकृत मक डिस्पोजल प्लान के अनुसार ही मक डिस्पोजल का कार्य कराया जायेगा।
- 2— प्रस्तावित डम्पिंग साइट नदी/स्ट्रीम/नाले से दूर स्थित है।

  
कनिष्ट अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
अधिशासी अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत हुनैरा  
वि0ख0—डीडीहाट  
पिथौरागढ़


  
अध्यक्ष/ सरपंच  
ग्राम दन समिति -हुनैरा  
डांडाहाट (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित, डीडिहाट - आदिचौरा पी० डब्लू० डी० मोटर मार्ग से हुनेरा मोटर मार्ग (लम्बाई 9.000 कि०मी०) के नव निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


मलवे निस्तारण हेतु लाइन डायग्राम

निस्तारित बिन्दु


| ID | Longitude     | Latitude      |
|----|---------------|---------------|
| A  | 80°14'26.84"E | 29°51'7.84"N  |
| B  | 80°14'33.25"E | 29°51'0.41"N  |
| C  | 80°14'38.61"E | 29°50'51.95"N |
| D  | 80°14'39.81"E | 29°51'4.55"N  |
| E  | 80°14'45.25"E | 29°51'13.44"N |
| F  | 80°15'20.69"E | 29°51'9.63"N  |
| G  | 80°15'3.44"E  | 29°51'14.61"N |
| H  | 80°15'16.78"E | 29°51'0.69"N  |
| I  | 80°15'39.94"E | 29°50'42.3"N  |

  
कनिष्ठ अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
अधिशोषी अभियन्ता,  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी०आई०यू०, पी०एम०जी०एस०वाई०,  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत हुनेरा  
वि०ख०-डीडीहाट  
पिथौरागढ़

  
अध्यक्ष/ सरपंच  
ग्राम दल समिति -हुनेरा  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

परियोजना का नाम- जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित  
डीडीहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग  
किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।


## प्रमाण पत्र


- 1- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में दरों का प्राविधान लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड के वर्तमान पैड्यूल पर आधारित है।
- 2- प्रमाणित किया जाता है कि जिन मदों के लिये लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड में कोई पैड्यूल ऑफ रेट नहीं है उनके लिये जिन दरों का प्राविधान किया गया है वह वर्तमान बाजार भाव मजदूरी सामग्री एवं ढुलान पर आधारित है जिनका सत्यापन मेरे द्वारा कर लिया गया है।
- 3- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में दरों का विप्लेशन लोक निर्माण विभाग द्वारा संशोधित मोर्ड के मानक दर विप्लेशन पर आधारित है।
- 4- प्रमाणित किया जाता है कि प्राक्कलन में जो ब्लाक दर ली गयी हैं वे मेरी जानकारी में सही हैं।

  
कनिष्ठ अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

  
सहायक अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

  
अधिशाली अभियन्ता  
ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत  
वि0ख0-डीडीहाट  
पिथौरागढ़

  
अध्यक्ष/ सरपंच  
ग्राम दन समिति-हुनैरा  
डीडीहाट(पिथौरागढ़)

## प्रपत्र

परियोजना का नाम— जनपद पिथौरागढ़ में प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अन्तर्गत प्रस्तावित,  
डीडीहाट आदिचौरा पी0डब्लू0डी0 मोटर मार्ग से हुनैरा मोटर मार्ग  
किमी0 0.00 से 9.00 तक निर्माण हेतु वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

## Specifications

All the work shall be carried out as per NRRDA/URRDA/PMGSY/  
PWD detaied specifications or as per direction of engineer in-  
charge.

  
कनिष्ठ अभियन्ता


ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)


  
सहायक अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

  
अधिशास्त्री अभियन्ता

ग्रामीण निर्माण विभाग,  
पी0आई0यू0, पी0एम0जी0एस0वाई0  
डीडीहाट( पिथौरागढ़)

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत  
वि0ख0-डीडीहाट  
पिथौरागढ़


  
अध्यक्ष/ सरपंच  
ग्राम दन समिति -हुनैरा  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)


परियोजना का नाम :- जनपद पिथौरागढ़, डीडीहाट-आदीचौरा पी0डब्लू0डी0 मो0रोड से हुनेरा, ग्रामीण मोटर मार्ग (लम्बाई 9.000 कि0मी0) के नव निर्माण हेतु हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मक डम्पिंक प्लान प्रमाण-पत्र


प्रस्तुत प्राक्कलन आदीचौरा-हुनेरा तक ग्रामीण मोटर मार्ग मोटर मार्ग के निर्माण के समय उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु गठित किया गया है। उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु स्थल चयन हेतु दिनांक 11/6/2016 को संयुक्त निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय मोटर मार्ग के सिविल सोयम भूमि भूमि में कुल 9 स्थलों का चयन किया गया है। उक्त स्थल मार्ग के किनारे स्थित है। मलवा निस्तारण हेतु खड़ साइड में मार्ग के समान्तर वायर क्रेट लगाये जाने का प्रावधान है।

अतः उक्तानुसार उत्सर्जित मलवे के निस्तारण हेतु रु012.77 लाख का प्राक्कलन गठित किया गया है। उक्त प्राक्कलन के अनुसार ही मार्ग निर्माण के समय उक्त कार्य भी कराये जायेंगे। मलवा कहीं भी वृक्ष आछादित एवं जल स्रोतों में नहीं डाला जायेगा।


  
कनिष्ठ अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई,-II  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
डीडीहाट, पिथौरागढ़


  
सहायक अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई,-II  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
डीडीहाट, पिथौरागढ़

  
अधिशाली अभियन्ता  
पी0एम0जी0एस0वाई,-II  
ग्रामीण निर्माण विभाग  
डीडीहाट, पिथौरागढ़

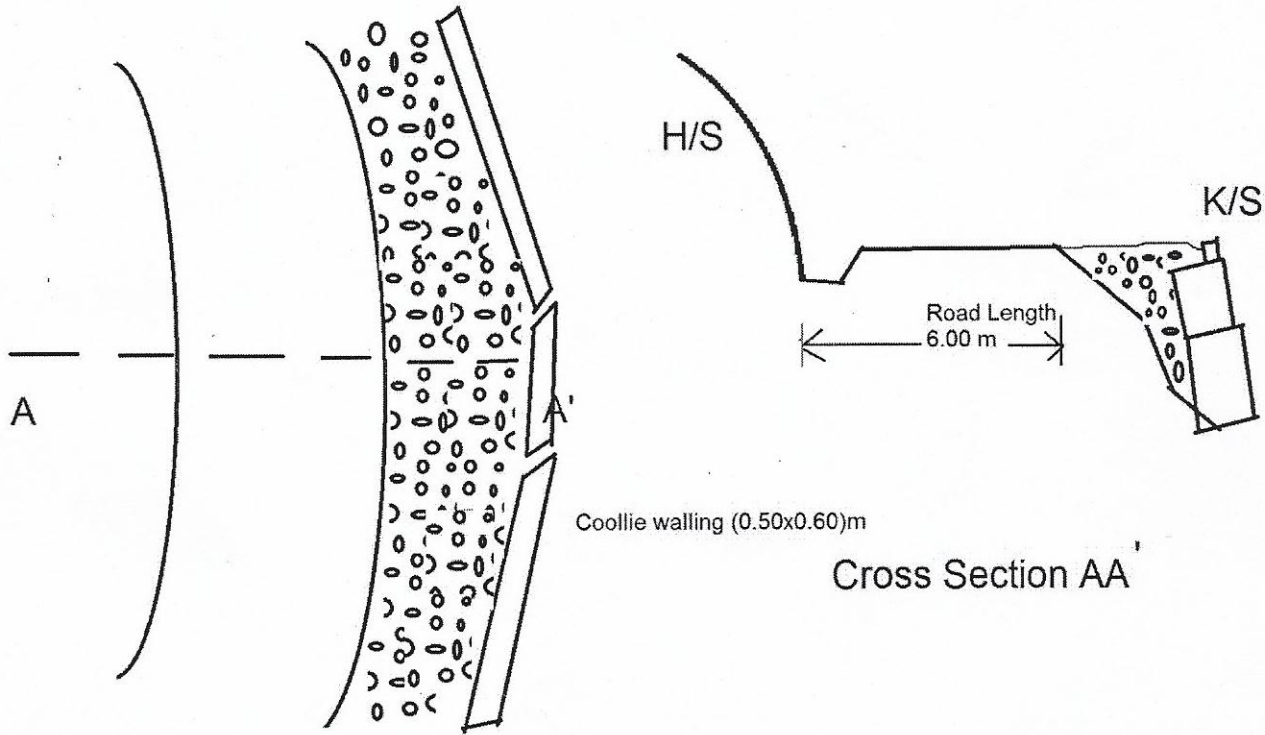
  
वन क्षेत्राधिकारी  
अस्काट - (पिथौरागढ़)

प्रभागीय वनाधिकारी

  
प्रधान  
ग्राम पंचायत हुनेरा  
वि0ख0-डीडीहाट  
पिथौरागढ़

  
अध्यक्ष / सरपंच  
ग्राम दन समिति - हुनेरा  
डीडीहाट (पिथौरागढ़)

# Typical Drawing Dumping Zone



Plan

Cross Section AA'

JE

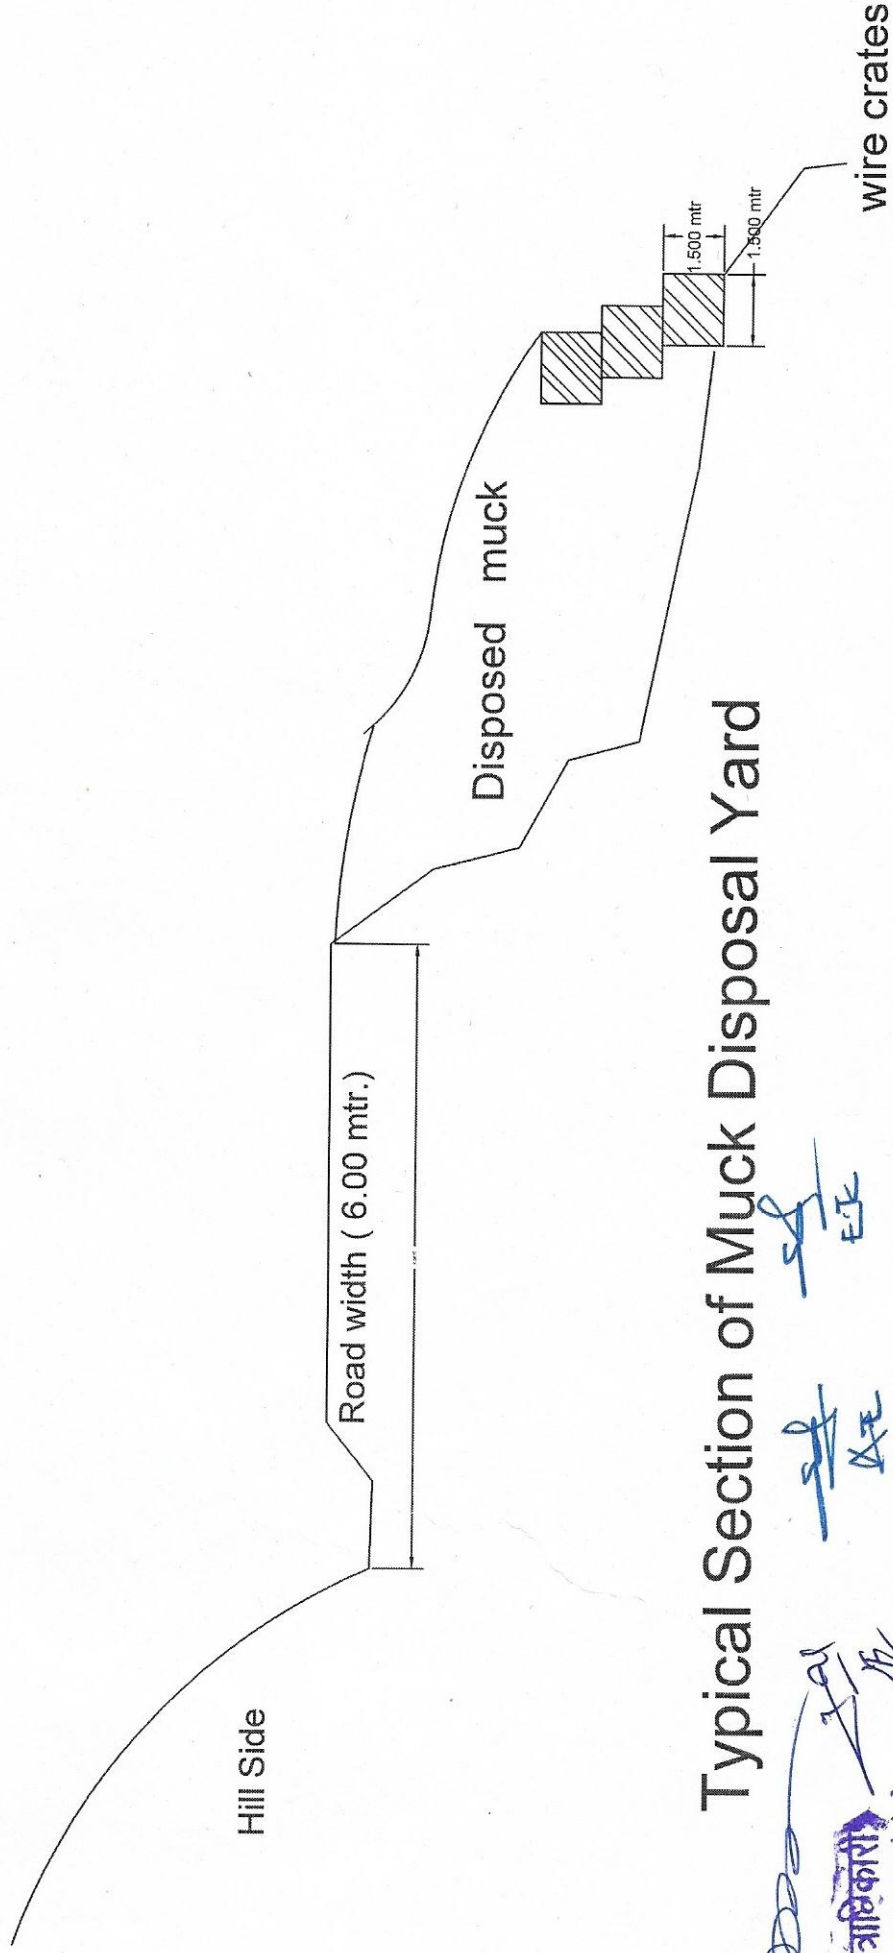
AE

EE

मुख्यादेवी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत हुनेश  
वि०ख०-डीडाहाट  
पिथौरागढ़

अध्यक्ष/ सरपंच  
ग्राम दम समिति - हुनेश  
डीडाहाट (पिथौरागढ़)

वन क्षेत्राधिकारी  
अस्कोट - (पिथौरागढ़)



## Typical Section of Muck Disposal Yard

वन क्षेत्राधिकारी  
प्रस्ताव - (पिथौरागढ़)

सह  
अ.स.

सह  
अ.स.

मुख्याधी  
प्रधान  
ग्राम पंचायत, दुर्गेश  
वि०ख०-डीडाहाट  
पिथौरागढ़

मुख्याधी  
अध्यक्ष / सरपंच  
ग्राम वन समिति - दुर्गेश  
डीडाहाट (पिथौरागढ़)

Name of Work : Construction of Didihat - Adichaura PWD motor road to Hunera motor road (Stage - I) in Km. 9.000 under PMGSY.

Name of Block: Didihat (Pithoragarh)

Length: 9.000 KM

PART A ENVOIRNMENTAL PROTECTION WORK

Bill Of Quantity

| Sr.No. | SOR No          | Item Of Work                                                                                                                                                                                                                                  | Quantity                     | Unit | Rate                                     | Amount                                            |
|--------|-----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------|------|------------------------------------------|---------------------------------------------------|
| 1).    | 10977,8-4-1,8   | Excavation in foundation for structures in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as directed by Engineer-in-charge and MORD Specification for Rural Roads 2014.                              | <del>675.00</del><br>337.50  | Cum  | 293.00                                   | <del>197775.00</del><br>98887.50                  |
|        | 11257, 9-2-2, 2 | Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification) | <del>2025.00</del><br>762.75 | Cum  | <del>2162.60</del><br>4675.40<br>1675.40 | <del>4379265.00</del><br>3392685.00<br>1277911.35 |
| 3).    | 11256, 6, 2     | Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work.(As per PWD Uttarakhand specifications)                                                                          | <del>877.50</del><br>147.82  | Cum  | 1182.20                                  | <del>4037380.50</del><br>174752.00                |
|        | 10980,8-11,8    | Preparation of seed bed on previously laid top soil, furnishing and placing of seeds, fertilizer, mulching material, applying bituminous emulsion at the rate of 0.23 per sqm and laying and fixing jute netting, including watering          | <del>460.50</del><br>0.00    | Sqm  | <del>143.60</del><br>0.00                | <del>66127.80</del><br>0.00                       |
|        |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |                                          | 4693968.30                                        |
| Say    |                 |                                                                                                                                                                                                                                               |                              |      |                                          | <del>56.80 Lac</del><br>46.94 Lac                 |

A.A.E

A.E.R.E.S.  
P.I.U.-P.M.G.S.Y.  
Didihat

Say ₹ 15.51 Lac

प्रमाणित कर अधिकारी  
प्रमाणित बनाधिकारी  
पिथौरागढ़

Didihat - Adichaura PWD motor road to Hunera motor road ( Stage - I) motor road

Block : Didihat District : Pithoragarh

PART A ENVOIRNMENTAL PROTECTION WORK

Detail Of Measurment

| Sr. | Location | Item Of Work                                                                                                                                                                                                                                                                               | No.     | Length | Width | Height | Quantity                  | Unit |
|-----|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------|--------|-------|--------|---------------------------|------|
| 1). | Km 1-9   | Excavation in foundation for structures in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as directed by Engineer-in-charge and MORD Specification for Rural Roads 2014.                                                                           | 1 x 300 | 3.00   | 1.50  | 0.50   | <del>675.00</del> 337.50  | cum  |
| 2). | Km 1-9   | Providing and laying of wire crates 3.00x1.50x1.50 in size with a 8 gauge BWG GI wire conforming to IS: 280 & IS:4826 in 150mm x 150mm mesh laid with stone boulders weighing not less than 25 kg each.(As per PWD Uttarakhand Specification)                                              | 1 x 300 | 3.00   | 1.50  | 1.50   | <del>2025.00</del> 762.75 | cum  |
| 3). | Km 1-9   | Construction of coolie walling including supply of all material, labour, T&P etc. required for proper completion of the work.(As per PWD Uttarakhand specifications)                                                                                                                       | 1 x 9   | 325.00 | 0.50  | 0.50   | <del>877.50</del> 147.82  | cum  |
| 4). |          | Preparation of seed bed on previously laid top soil, furnishing and placing of seeds, fertilizer, mulching material, applying bituminous emulsion at the rate of 0.23 per sqm and laying and fixing jute netting, including watering for 3 months all as per specification 8.11,1600 & 300 |         |        |       |        |                           |      |
|     | Km-1     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 12.00  |       | 4.00   | 48.00                     | Sqm  |
|     | Km-2     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 15.00  |       | 3.50   | 52.50                     | Sqm  |
|     | Km-3     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 20.00  |       | 3.25   | 65.00                     | Sqm  |
|     | Km-4     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 18.00  |       | 4.25   | 76.50                     | Sqm  |
|     | Km-5     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 14.00  |       | 4.50   | 63.00                     | Sqm  |
|     | Km-6     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 10.00  |       | 4.00   | 40.00                     | Sqm  |
|     | Km-7     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 8.00   |       | 3.75   | 30.00                     | Sqm  |
|     | Km-8     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 16.00  |       | 3.00   | 48.00                     | Sqm  |
|     | Km-9     |                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 1 x 1   | 10.00  |       | 3.75   | 37.50                     | Sqm  |
|     |          |                                                                                                                                                                                                                                                                                            |         |        |       |        | 460.50                    | Sqm  |

*[Signature]*

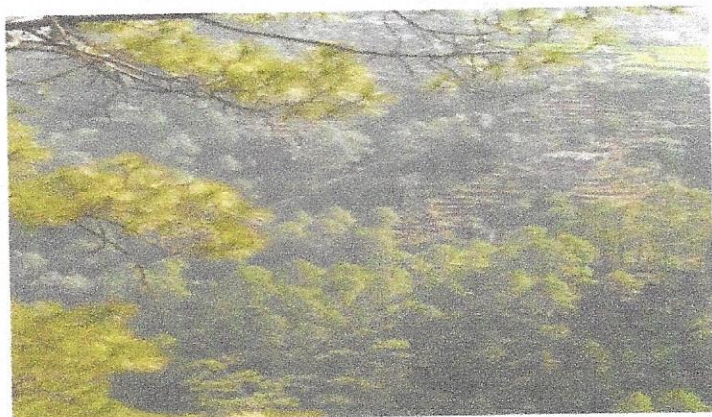
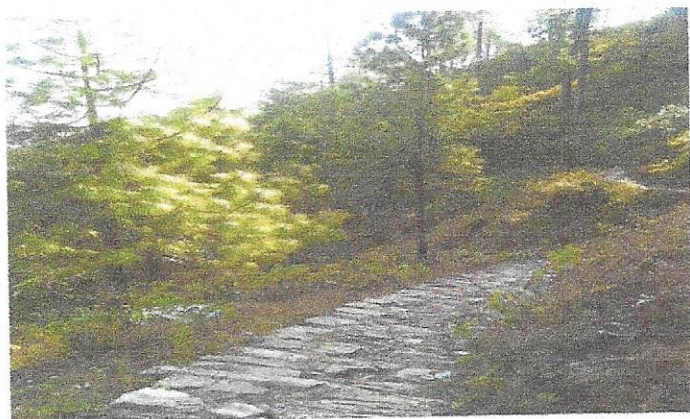
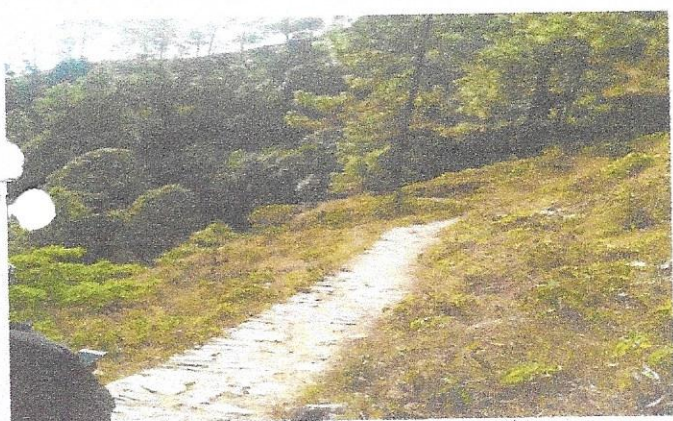
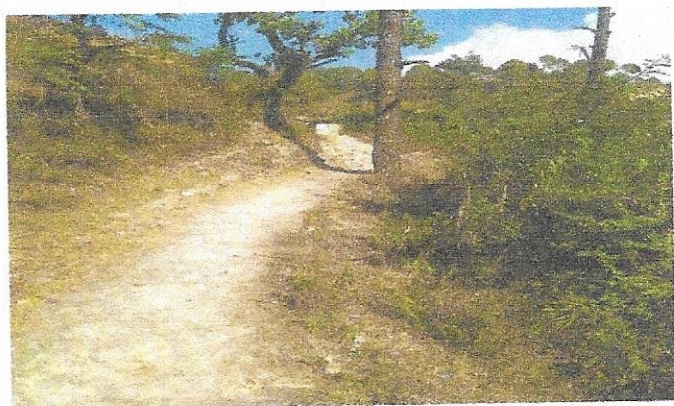
*[Signature]*  
A.A.E

*[Signature]*  
E.E

A.E.R.E.S.  
P.L.U.-AE  
Didihat

*[Signature]*  
प्रमाणित कर अधिकारी  
प्रमाणित वनाधिकारी  
पिथौरागढ़

परियोजना का नाम- डीडिहाट - आदिचौरा पी०डब्लू०डी० मोटर मार्ग से हुनेरा मोटर मार्ग ( लम्बाई 9.00 कि०मी०)



JB

AE

E.E

Starting trail Adichara to Huera M-R



SA  
FE

SA  
FE
