

MUCK DISPOSAL EXERCISE INDEX

परियोजना का नाम:— जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो 0 मार्ग का निर्माण

1. construction of Bhandari Gaon Garhsera Motor Road from Km. 14 of Dehalchori-Pauri Motor Road in Pauri distirct, Block Pauri
2. Details of Muck Diposal yards with Land Owner Annexure II

सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]
I.E.

[Signature]
अधिसायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

मलवे के निस्तारण हेतु योजना का प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है किया जाता है, कि जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी मे देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी० 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो० मार्ग का निर्माण कार्य से प्राप्त मलवे के निस्तारण हेतु निम्नलिखित योजनायें है।

कुल उत्सर्जित मलवा की मात्रा	—	107100.00 घन मी०
निस्तारित मलवा घटाइये		
1. मार्ग के खड्ड साइड की तरफ रिटेंनिंग वाल/ब्रेस्टवाल निर्माण में तथा रिटेंनिंग वाल एवं मार्ग के बीच पत्थर भरान करके।	—	6000.00 घन मी०
2. स्कपर निर्माण में पत्थर भरान करके।	—	4000.00 घन मी०
3. सुपर एलिवेशन के निर्माण में भरान करके।	—	16000.00 घन मी०
4. मार्ग को समतल करने के लिये पत्थर का भरान करके।	—	20000.00 घन मी०
5. मार्ग के दलदल वाले भाग पर सोलिंग को (12 सेमी० लूज) हेतु पत्थर का उपयोग करके।	—	4500.00 घन मी०
6. कॉजवे के निर्माण में पत्थर/बोल्डर का उपयोग किया जायेगा।	—	4500.00 घन मी०
7. मार्ग के ग्रेडिएन्ट को मलेव से भरान करके ठीक किया जायेगा।	—	35225.00 घन मी०
कुल मलवा	—	90225.00 घन मी०
डम्पिंग हेतु कुल शेष मलवा	—	16875.00 घन मी०

उपरोक्त योजनाओं द्वारा पहाड़ कटान से प्राप्त मलवे का उपयोग मार्ग निर्माण में कर लिया जायेगा, तथा अवशेष मलवे को नाप भूमि में बने डम्पिंग जोन 01 से 04 में डम्प कर दिया जायेगा।


जिला अभियन्ता


श्रीनगर राज (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता,
निर्माण खण्ड, लो० निर्माण
धीनवर (गढ़वाल)


अधिसायी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० निर्माण
श्रीनगर (गढ़वाल)


जिला अभियन्ता
श्रीनगर राज (गढ़वाल)


जिला अभियन्ता


जिला अभियन्ता

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी० 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो० मार्ग का निर्माण।

Location and Quantity of Debries disposed

क्र० सं०	कि०मी० नं० जहां मक डिस्पोजल किया जाना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थान का चैनेज	प्रस्तावित स्थान का साईज मी० में	भूमि का प्रकार	प्रस्तावित स्थान की मक डिस्पोजल क्षमता घन मी० में
1	Km-01	X-S 0/30 to 0/36	150.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4050.00 घन मी०
2	Km-02	X-S 1/26 to 1/30	150.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4050.00 घन मी०
3	Km-04	X-S 3/16 to 3/22	150.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4050.00 घन मी०
4	Km-05	X-S 4/35 to 4/39	175.00 x 9.00x3.00	नाप भूमि	4725.00 घन मी०
			Total		16875.00 घन मी०

Summary of Muck/debries disposal

S. No.	Total Debries obtain from Road Cutting	Material disposal by cartage	Material used for raod construction work	Total disposal in Dumping Zone	Balance Debries
1	107100.00 Cum	16875.00 Cum	90225.00 Cum	16875.00 Cum	Nil

[Signature]

वन क्षेत्राधिकारी
विनयपुर शाखा (पौड़ी)

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]
J.E.

[Signature]
असिस्टेन्ट अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]

हरीश चन्द्र पाण्डेय

राजस्व उप निरीक्षक

राजस्व वृत्ति सनराखण्ड

पौड़ी गढ़वाल

तहसील

तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल

कार्य का नाम :-जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी मे देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी० 14 से भण्डारीगांव गढसेरा मो० मार्ग का निर्माण।

क्र०सं०	कि०मी० नं० जिनका मक डिस्पोजल किया जाना है।	डिस्पोजल हेतु प्रस्तावित स्थान कि०मी०	लम्बाई-चौड़ाई मी० में	क्षेत्रफल घन मी० में
1	Km-01	X-S 0/30 to 0/36	150.00 x 9.00x3.00	4050.00 घन मी०
2	Km-02	X-S 1/26 to 1/30	150.00 x 9.00x3.00	4050.00 घन मी०
3	Km-04	X-S 3/16 to 3/22	150.00 x 9.00x3.00	4050.00 घन मी०
4	Km-05	X-S 4/35 to 4/39	175.00 x 9.00x3.00	4725.00 घन मी०
		Total		16875.00 घन मी०

सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर शाख (गढ़वाल)

J.E.

कार्य का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी 0 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो 0 मार्ग का निर्माण।

Details of Muck Disposal Yards with Land Owner Detail

S. N o.	Cainager	Name of land owner & village	Land in Hec	Land in Sqm	Land area being used for dumping yard (sqm)	North	East
1	Km-01 X-S 0/30 to 0/36	श्री गिरधारी प्रसाद ग्राम घौलडी	0.298	2980.00	2980.00	30°10'49.65" N	78°44'18.82" E
2	Km-02 X-S 1/26 to 1/30	श्री देवी प्रसाद ग्राम कण्डारी गांव	0.100	1000.00	1000.00	30°10'33.58" N	78°44'15.23" E
3	Km-04 X-S 3/16 to 3/22	श्री नवीन चन्द ग्राम गढ़सेरा	0.160	1600.00	1600.00	30°10'25.87" N	78°44'01.50" E
4	Km-05 X-S 4/35 to 4/39	श्री सुरेन्द्र मोहन ग्राम नौगांव	0.081	810.00	810.00	30°10'47.27" N	78°43'44.88" E


जन. क्षेत्राधिकारी
श्रीनगर राज (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


अधिसारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)

तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल


श्रीराम चन्द्र पण्डित
राजस्थान राज्य निर्माण
राजस्थान पुलिस जलखण्ड
पौड़ी गढ़वाल
तहसीलदार

मार्ग :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो 0 मार्ग का निर्माण।

मलवा निस्तारण हेतु राजस्व भू-धारकों का सहमति प्रमाण-पत्र

क्र०सं०	राजस्व ग्राम, पट्टी, तहसील	खाता सं०	खेत नं०	रकबा हे० में	भूमि धारकों का नाम	सहमति के हस्ताक्षर
1	2	3	4	5	6	
1	ग्राम घौल्डी, पट्टी इडवालस्यू, तहसील पौड़ी	2	210	0.145	श्री गिरधारी प्रसाद	गिरधारी प्रसाद
			211	0.153		
	योग		2	0.298		
2	ग्राम कण्डारीगांव, पट्टी इडवालस्यू, तहसील पौड़ी	4	190	0.090	श्री देवीप्रसाद	देवी प्रसाद
			191	0.010		
	योग		2	0.100		
3	ग्राम गढ़सेरा, पट्टी इडवालस्यू, तहसील पौड़ी	14	573	0.090	श्री नवीन चन्द	Naveen chand
			574	0.070		
	योग		2	0.160		
4	ग्राम नौगांव, पट्टी इडवालस्यू, तहसील पौड़ी	5	24	0.033	श्री सुरेन्द्र मोहन	Surender Mohan
			26	0.025		
			27	0.023		
	योग		3	0.081		
	महायोग		9	0.639		


अधिसूची अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


सहायक अभियन्ता
निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


तहसीलदार
पौड़ी गढ़वाल



निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
श्रीनगर (गढ़वाल)


कृते जिलाधिकारी
गढ़वाल



परगना मजिस्ट्रेट
गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल

गार्ग- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकास खाण्ड पौड़ी से देहरादून
 पौड़ी गढ़वाल गार्ग के कि०मी० १५ से गढ़वाल
 गांव गढ़वाल से गार्ग का निर्माण

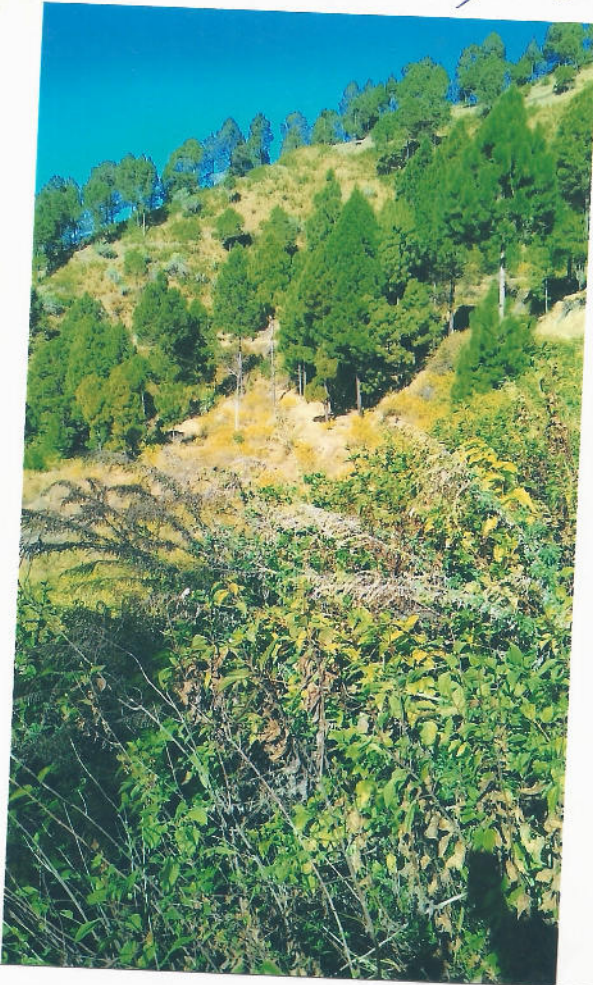

K.m. 01 X-S-0/30 to 0/36

[Signature]
 वन क्षेत्राधिकारी
 श्रीनगर राज (गढ़वाल)

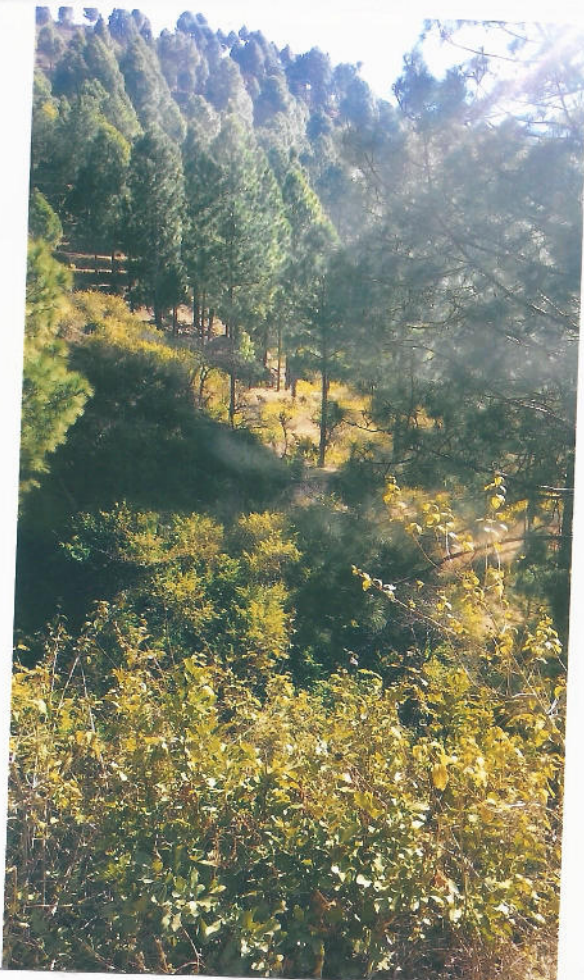

K.m. 02 X-S 1/26 to 1/30

[Signature]
 वन क्षेत्राधिकारी
 श्रीनगर राज (गढ़वाल)

सहायक अभियन्ता,
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)



[Signature]
 S.E.

[Signature]
 अभियन्ता अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)


श्रीग - जनपद पौडी गढ़वाल के विकासखण्ड पौडी में देहलवाँस
पौडी जोवर नदी के किनारे परसे गढ़वाँस गाँव
गढ़वाल जोवनार्जिका निर्माण।



K.M.04 X-S 3/16 to 3/22

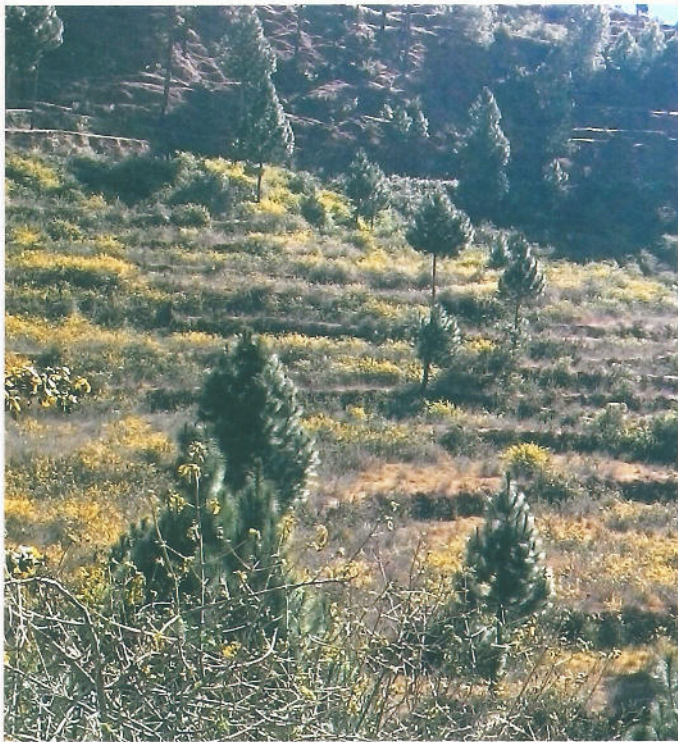

Kim.05 X-S 4/35 to 4/39



सहायक अभियन्ता
(निर्माण खण्ड, लो.नि.वि.)
श्रीनगर (गढ़वाल)

Janam
5/2

अधिकारी अभियन्ता
निर्माण खण्ड लो. नि. वि.
श्रीनगर (गढ़वाल)

मक डिस्पोजल योजना के सापेक्ष वृक्षारोपण

परियोजना का नाम :- जनपद पौड़ी गढ़वाल के विकासखण्ड पौड़ी में देहलचौरी-पौड़ी मोटर मार्ग के किमी 14 से भण्डारीगांव गढ़सेरा मो 0 मार्ग का निर्माण।

- वृक्षारोपण स्थल का नाम :- मक डिस्पोजल हेतु चिह्नित प्लान के अनुसार क्षेत्रफल
- वृक्षारोपण स्थल का कुल क्षेत्रफल :- 1.485 है०
- रोपित किये गये जाने वाले कुल पौधों की संख्या (कुल क्षेत्रफल X 2000) = 2970.00
- रोपित की जाने वाली प्रजातियां :- तुन, बांज, बुरांस, देवदार आदि

क्र० सं०	कार्य का नाम	मात्र	इकाई	इकाई दर (रु०)	योग
1	2	3		4	5
(1)	प्रथम चरण अग्रिम मृदा कार्य :-				
1	सर्वे एवं सीमांकन	1.485	है०	71.000	105.45
2	स्थल सफाई कार्य	1.485	है०	2315.000	3437.77
3	दीवालबन्दी कार्य/फनिसंग (150 मी० प्रति है०=81 घ०मी० @ 172/घ०मी०	1.485	है०	13932.000	1978.02
4	गड़ढा खुदान कार्य (0.30x0.30x0.45) रेखांकन चूना सहित	2970	गड़ढे	4.930	14642.00
5	डी०ए०पी० खाद की लागत 25 ग्राम प्रति गड़ढा	33.20	किग्रा	11.000	365.20
6	निरीक्षण बटिया बनाना (400 रु० प्रति है०)	1.485	है०	400.000	594.00
7	पौधे की कीमत (प्रथम वर्ष)	2970	पौधे	4.000	11880.00
8	भूमि संरक्षण एवं जल संरक्षण कार्य (10 है०) के आधार मानते हुये				
	1. वानस्पतिक/स्टोन चैकडैम 8x4175.00= 33400.00	1.485	है०	56800.000	84348.00
	2. वाटर हरवेस्टिंग टैंक (3x2.50x10)5x4680= 23400.00				
	योग :- 56800.00				
	योग- प्रथम चरण				117350.44
(2)	द्वितीय चरण, रोपण कार्य				
1	झाड़िया कटान (लैन्टाना गाजर घास/काला बांस)	1.485	है०	1172.00	1740.42
2	गड़ढा भरान कार्य (0.30x0.30x0.450)	2970	गड़ढे	0.88	2613.60
3	पौध दुलान कार्य	2970	पौधे	6.00	18720.00
4	पौध रोपण व थालाबन्दी कार्य	2970	पौधे	1.72	5108.40
5	पौधों की प्रथम निराई-गुड़ाई व मलचिंग कार्य	2970	पौधे	1.18	3504.60
6	पौधों की द्वितीय निराई-गुड़ाई व मलचिंग कार्य	2970	पौधे	1.01	2999.70
7	पौधों की कीमत द्वितीय वर्ष	2970	पौधे	1.00	2970.00
8	प्रथम वर्ष में देख-रेख व रखरखाव पर व्यय (कम से कम 9 माह)	1.485	है०	1278 प्रतिमाह/न्यूनतम मजदूरी	11502.00
9	अन्य कार्य	1.485	है०	500.00	742.50
	योग- द्वितीय चरण				49901.22
	योग- प्रथम चरण + द्वितीय चरण				167251.66

(3)	तृतीय वर्ष 10 प्रतिशत क्षतिपूर्ति (बीटिंग अप) प्रति है0				
1	पौध की लागत	2970	पौधे	5.00	14850.00
2	पौध डुलान कार्य	2970	पौधे	6.00	17820.00
3	पुनः गड़ढे खोदना एवं रोपण कार्य	2970	पौधे	3.00	8910.00
4	गड़ढों में गोबर खाद डालना लागत सहित	2970	पौधे	1.21	3593.70
5	पौधों की शीतकालीन मलचिंग	2970	पौधे	1.01	2999.70
6	वनीकरण चौकीदार (12माह) 1 वर्ष	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
7	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	1.485	है0	500.00	742.50
	योग तृतीय चरण				64251.90
(4)	चतुर्थ चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	1.485	है0	500.00	742.50
	योग चतुर्थ चरण				16078.50
(5)	पंचम चरण (रख-रखाव कार्य)				
1	वनीकरण चौकीदार का पारिश्रमिक (12 माह)	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य	1.485	है0	500.00	742.50
	योग पंचम चरण				16078.50
(6)	छठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.485	है0	500.00	742.50
	योग छठवां चरण				16078.50
(7)	सातवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.485	है0	500.00	742.50
	योग सातवां चरण				16078.50
(8)	आठवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.485	है0	500.00	742.50
	योग आठवां चरण				16078.50

(9)	नवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.485	है0	500.00	742.50
	योग नवां चरण				16078.50
(10)	दसवां चरण				
1	रोपण वर्ष के बाद तृतीय वर्ष का रखरखाव व अनुरक्षण कार्य 12 माह	1.485	है0	1278 प्रतिमाह / न्यूनतम मजदूरी	15336.00
2	अन्य कार्य (अग्नि सम्बन्धी सुरक्षा कार्य)	1.485	है0	500.00	742.50
	योग दसवें चरण				16078.50
	कुल धनराशि	प्रथम चरण			117350.44
		द्वितीय चरण			49901.22
		तृतीय चरण			64251.90
		चतुर्थ चरण			16078.50
		पंचम चरण			16078.50
		षष्ठम चरण			16078.50
		सप्तम चरण			16078.50
		अष्टम चरण			16078.50
		नवम चरण			16078.50
		दशम चरण			16078.50
		कुल योग			344053.06

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)

[Signature]
 सहायक अभियन्ता
 निर्माण खण्ड, लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)
[Signature]
 S.E.

[Signature]
 अधिशासी अभियन्ता
 निर्माण खण्ड लो० नि० वि०
 श्रीनगर (गढ़वाल)
