

काद को नाम- जनपद सम्पादन के अन्तर्गत विनवाज राँव कलियायूरा मोटर मार्ग का निर्माण कार्य

लम्बाई 15.200 किमी

(A) Material received due to hill side cutting
Say 0.5x15200x6.00x2.50=114000.00Cum
114000.00 Cum

(B) Utilisation of Material Obtain from hill cutting.

S No	Item for which material is to be used	Quantity (Cum./Nos.)	Index at which the material will be consumed per unit	Quantity of material consumed (Cum.)
1	Stone masonry in cement sand mortar	12635.00	1.15	14530.25
2	Stone masonry in lai dry	12445.00	1.15	14311.75
3	Hand packed stone filling	8360.00	1.00	8360.00
4	Construction of wire crates	6935.00	1.00	6935.00
5	Granular-sub-base (GSB)	1805.00	1.00	1805.00
6	Construction of parapets	1368.00	1.00	1368.00
7	Construction of road side drain	2422.50	1.00	2422.50
8	Construction of R.C.C. scuppers	6080.00	1.00	6080.00
9	Concreting works	427.50	0.96	410.40
Material to be stored for carrying out stage-II works				
10	GSB (grading-I) works	27360.00	1.21	33105.60
11	GSB (grading-II) works			
12	G3 (grading to be done using granulator at site)			
13	Super elevation and patri	475.00	1.00	475.00
Total material consumed in cum				89803.50
Say in cum				89803.00
Balance material left for disposal		114000.00	-89803.00	
			24197.00	
Add 40% for swell factor			9678.80	
Total			33875.80	

आविष्कृत की जायेगी
प्रतीक खण्ड, लोनिरोड
0 सम्पादन, पृष्ठ 1

आविष्कृत की जायेगी
प्रतीक खण्ड, लोनिरोड
0 सम्पादन, पृष्ठ 1

Location and quantity of debris disposal



Ch.	Size of Dumping site	Type of land	Capacity of the site (Cum)
0.350	100.00x3.5x4.50M	Civil Land	1575.00
1.400	180.00x4.00x5.50M	Civil Land	3960.00
2.550	120.00x3.50x4.50M	Civil Land	1890.00
3.300	145.00x4.50x5.00M	Van panchayat	3262.50
3.900	100.00x3.50x5.50M	Civil Land	1925.00
5.300	140.00x4.50x6.00M	Reserve forest Land	3780.00
7.000	160.00x5.00x4.50M	Civil Land	3600.00
8.900	100.00x3.50x5.00M	Civil Land	1750.00
11.300	150.00x4.00x5.50M	Reserve forest Land	3300.00
12.600	140.00x4.50x4.50M	Reserve forest Land	2835.00
13.800	160.00x5.00x5.00M	Civil Land	4000.00
14.800	100.00x4.00x5.00M	Civil Land	2000.00
		Total-	33877.50

APR 2019
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिसासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (प्रान्तीय खण्ड)

सिन्नालगांव - कलियाधुरा - हीडारवाग मोटर मार्ग

MUCK DISPOSAL PLAN AND CROSS SECTION

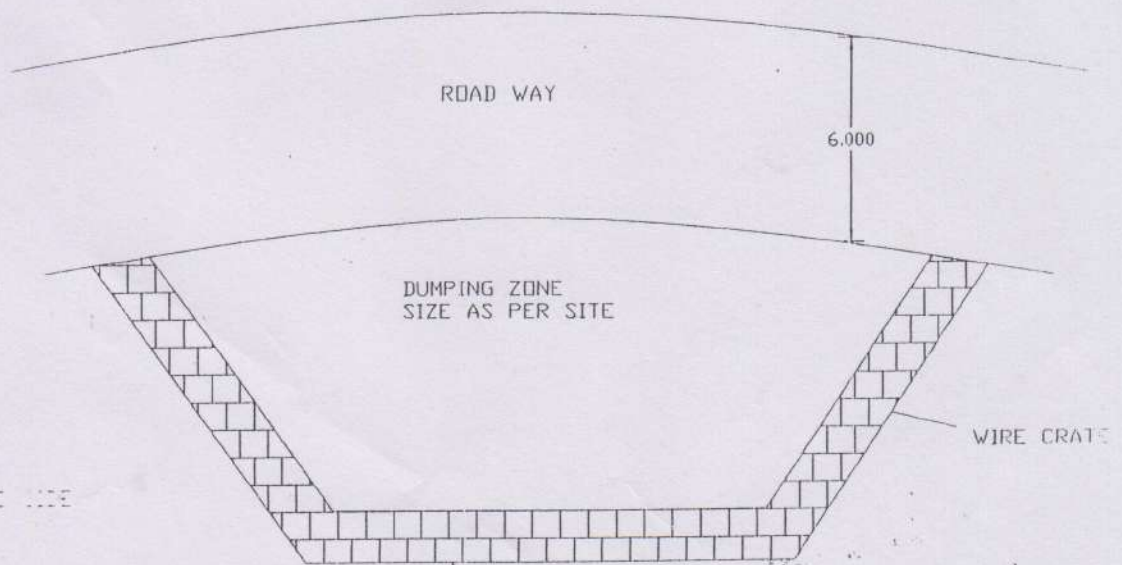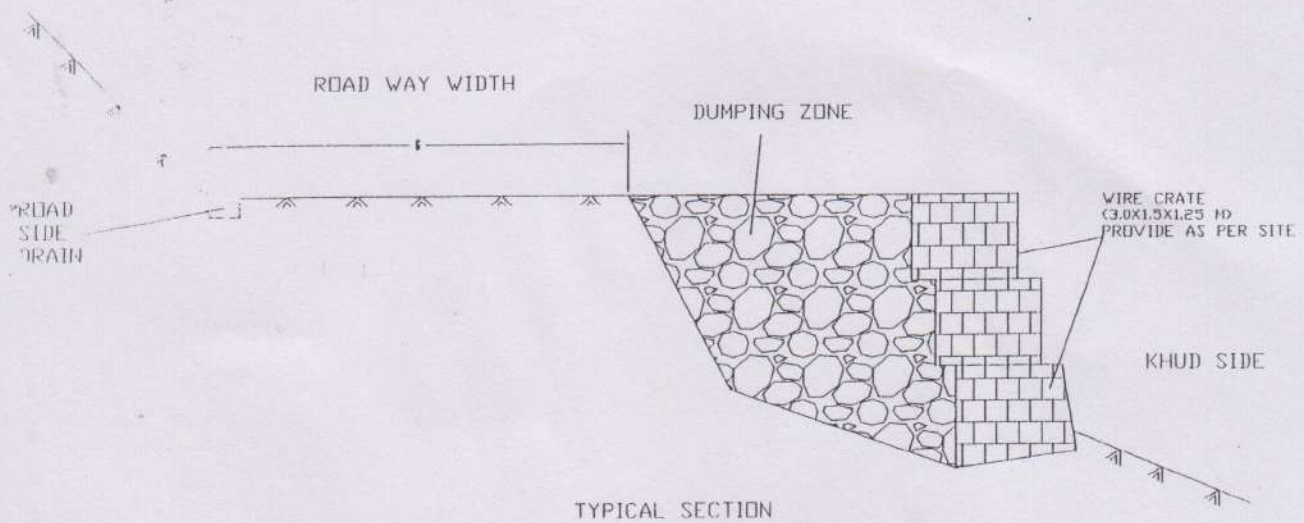

APadhy
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

अधिशाली अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

परियोजना का नाम :- जनपद चम्पावत में स्वीकृत बिनवालगोंव-कलियाधूरा (छीड़ाखान) मोटर मार्ग लम्बाई 15.200 कि०मी० के वन भूमि हस्तान्तरण प्रस्ताव।

मलुवा निस्तारण योजना सहमत प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि प्रान्तीय खण्ड, लोक निर्माण विभाग, द्वारा प्रस्तावित मलुवा निस्तारण प्रस्ताव से सहमत हूँ।

वन क्षेत्राधिकारी

उपप्रभागीय वनाधिकारी

प्रति हस्ताक्षरित

[Signature]
प्रभागीय वनाधिकारी
चम्पावत वन प्रभाग चम्पावत।

[Signature]
अधिशाली अभियन्ता,
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत (सहायक।)

[Signature]
वन क्षेत्राधिकारी
भिगाराडा वनक्षेत्र
चम्पावत

[Signature]
सहायक अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड, लो०नि०वि०
चम्पावत

[Signature]
उप प्रभागीय वनाधिकारी
लोहाघाट
