


प्रारूप-49


परियोजना विवरण:-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत थाती डागर रैंतासी मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

मलवा निस्तारण योजना मार्गदर्शिका के परिशिष्ट में दिये माडल अनुसार तैयार कर संलग्न किया जा रहा है।



वनिष्ठ अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



सहायक अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर



अधिशासी अभियन्ता
अ०ख० लो०नि०वि० श्रीनगर
मु० कीर्तिनगर

(मलवा निस्तारण प्रस्ताव)

लोक निर्माण विभाग



उत्तराखण्ड सरकार

8 वाँ वृत्त, लोक निर्माण विभाग,
नई टिहरी

अस्थाई खण्ड, लोक निर्माण विभाग,
श्रीनगर, मु0-कीर्तिनगर

विधान सभा क्षेत्र - देवप्रयाग

लोक सभा क्षेत्र - टिहरी

(मलवा निस्तारण प्रस्ताव)

कार्य का नाम-

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

अनुमानित लागत:

14.75 लाख


Analysis of Rate


Name Of Work: राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

Rate Effected From 01/05/2019

Block 21 Devprayag (TEHRI)

S. No.	Item Description	Unit	Rate
1-2	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	Cum	₹ 374.70
1-9	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions of galvanized steel, of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 3 mm for gabions, edge/selvedge wire diameter 3.9 mm and lacing wire diameter 2.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	No.	₹ 9,353.70


Add. Asst. Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar



Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

Sl.No.	Item of work	No	L	W/B	H/D	Quantity
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification					
	Dumping Zone - 1					
	Quantity for Wire Crates	1x 1/2	25.00	10.00	0.50	62.50 Cum.
	Dumping Zone - 2					
	Quantity for Wire Crates	1x 1/2	25.00	10.00	0.50	62.50 Cum.
	Quantity for Wire Crates	1x 1/2	30.00	8.00	0.50	60.00 Cum.
					Total	185.00 Cum.
2	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions of galvanized steel, of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 3 mm for gabions, edge/selvedge wire diameter 3.9 mm and lacing wire diameter 2.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).					
	Dumping Zone - 1					
	Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 2	25.00			50.00 Nos.
	Dumping Zone - 2					
	Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 2	25.00			50.00 Nos.
	Quantity for Wire Crates in 2 layers	1x 2	30.00			60.00 Nos.
					Total	160.00 Nos.


Addl. Asst. Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

BILL OF QUANTITY


कार्य का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

Sl. No.	Item of work	Quantity	Unit	Rate	Per	Amount
1	2	3	4	5	6	7
1	Excavation in foundation for retaining, breast walls etc, in all types of soils and rocks including all lead, lift and disposal of surplus material as per direction of engineer - in - charge, as per drawing and technical specifications Clause 305.1 of MORD Specification	185.00	Cum.	374.70	Cum.	69319.50
2	Providing and Laying of Mechanically Woven Double Twisted Hexagonal shaped Gabions of galvanized steel, of size 3mX1mX1m with two diaphragms at 1m interval, having mesh opening 100mmx120 mm, mesh wire diameter 3 mm for gabions, edge/selvedge wire diameter 3.9 mm and lacing wire diameter 2.2 mm. (The work includes filling boulders in the gabions).	160.00	Nos.	9353.70	Nos	1496592.00
				Total		1565911.50


A.E.


A.E.



E.E.



वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर राजि
जुरेन्द्र नगर वन प्रभाग

Summary of Estimated cost


कार्य का नाम— राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी मे मोटर मार्ग का नवनिर्माण काय (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

S.No.	ITEM OF WORK	AMOUNT
1	राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी मे मोटर मार्ग का नवनिर्माण काय (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।	1565911.50
	GST Extra @ 12% (6%SGST+6%CGST)	187909.38
	Total	1753820.88
	Say	17.54


Addl. Asst. Engineer
T.D. PWD Srinagar
H.Q.- Kirtinagar


Assistant Engineer
T.D. PWD Srinagar
H.Q.- Kirtinagar


Executive Engineer
T.D. PWD Srinagar
H.Q.- Kirtinagar



कीर्तिनगर राजी
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग


प्रभागीय वनाधिकारी
(देवप्रयाग)
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग

प्रभागीय वनाधिकारी
नरेन्द्रनगर वन प्रभाग
मुनि-की-रेती


DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गहड में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 2.250 कि०मी०)।

Dumping Zone No.- 1 at KM-1

Plan of dumping zone 1.

Capacity of Dumping Zone No. 1	=	1x2/3	15.00	10.00	3.00	300.00	Cum
--------------------------------	---	-------	-------	-------	------	--------	-----


Dumping Zone No.- 2 at KM-2,

Plan of dumping zone 2


Total quantity of muck retained by Dumping zone 1 to 5 = 500+300 =600.00

600.00 Cum


Addl. Asst. Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

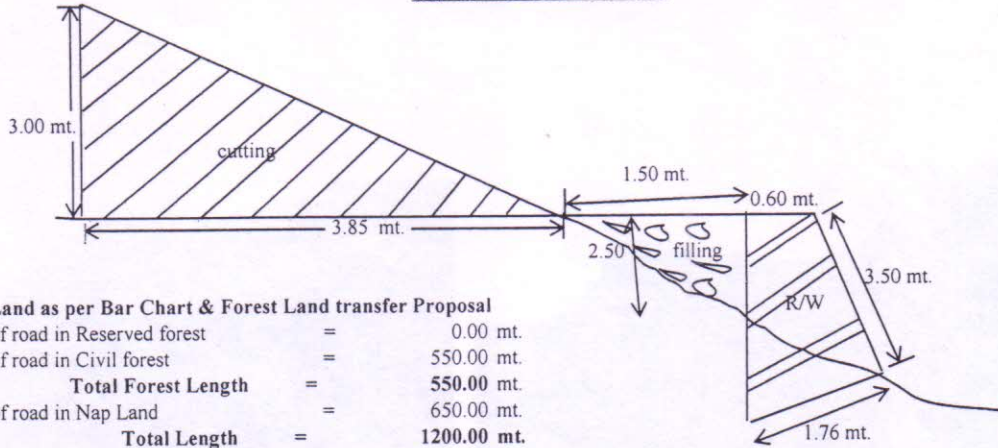

वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर राजि
नरेंद्र नगर वन प्रभाग

DETAILS OF MEASUREMENT

कार्य का नाम :- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रयाग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत ग्राम पंचायत थाती डागर रैंतासी में मोटर मार्ग का नवनिर्माण कार्य (लम्बाई 1.050 कि०मी०)।

Total quantity of Muck generated from road cutting

Typical X-Section of Road



Forest Land as per Bar Chart & Forest Land transfer Proposal

A	Length of road in Reserved forest	=	0.00 mt.
B	Length of road in Civil forest	=	550.00 mt.
	Total Forest Length	=	550.00 mt.
	Length of road in Nap Land	=	650.00 mt.
	Total Length	=	1200.00 mt.

Calculation of Muck As Above Length

1	Quantity of muck generated from cutting	1	x	1/2	550.00	3.85	3.00	3176.25	Cum.
2	Quantity of muck from scupper & catch pit								
A	Quantity of muck from scupper	2.250	x	8.00	3.85	3.00	3.00	623.70	Cum.
B	Quantity of muck from catch pit	2.250	x	8.00	(1.5x1.5+2.1x2.1)/2	2.50		149.85	Cum.
	Quantity of muck from Sl No 1. & 2 as above.						G-Total	3949.80	Cum.
3	Taking E.B, O.R & H.R @ 50%, 20%, & 30% respectively								
i.	80% E.B	3949.80	x	0.80	=			3159.84	Cum.
ii.	10% O.R.	3949.80	x	0.10	=			394.98	Cum.
iii.	10% H.R.	3949.80	x	0.10	=			394.98	Cum.
						Total =		3949.80	Cu
4	Quantity of muck as swell factor of (E.B. only)	1.25	x	3159.84				3949.80	Cum
5	Quantity of total muck from point 3(ii), 3(iii) & 4			Sl. No [3(ii) + 3(iii) + 4] =				4739.76	Cum
	Quantity of total muck Generated				Say			4739.76	Cum

Disposal & use of material

1	Quantity used for super elevation, grade improvement & patrie filling of road @ 10% of E.B. Only	= (3737.34 x 10/100) =		373.34	Cum
2	Quantity eroded by wind and water @ 5% of E.B. only	= (3737.34 x 5/100) =		186.86	Cum
3	Quantity of muck disposed in filling (retained by R/W) in 60% length	= (675.00 x 1.50 x 2.50)/2 x 60%		618.75	Cum
4	Quantity of stones used Scuppers and catch pit @ 57.00 cum. Per no.	= 57.00 x 8.00 x 2.250		1026.00	Cum
5	Quantity of stones used in R/W in 60% length	= 1350.0 x (0.60+1.76)/2 x 3.50 x 60%		1362.90	Cum
6	Quantity of stones used in Wire Crates for 3 dumping zones	As per details		160.00	Cum
7	Quantity of stones used in RR Dry for 4 dumping zones	As per details		0.00	Cum
	Total quantity of muck used at site including weathering by nature			3727.85	Cum

Quantity of muck retained = 4739.76 - 3727.85 = 1011.91 Cu
 निस्तारित की जाने वाली मलवे की मात्रा = 1011.91 Cum अथवा 1012.00 Cum

इस प्रकार से उत्सर्जित मलवे का लगभग सम्पूर्ण उपयोग सतह की रिग्रेडिंग एवं दीवार निर्माण आदि के प्रयोग में तथा सुपर एलीवेशन व पटरी फिलिंग आदि में हो जायेगा जिससे स्थानीय वनस्पति को क्षति नहीं पहुँचेगी एवं भू-क्षरण की सम्भावना भी नहीं होगी।

अवशेष मलवे के निस्तारण हेतु मार्ग पर ऐसी जगह चिन्हित किये गये हैं जिससे वन सम्पदा आदि की क्षति नहीं होगी। निस्तारित किये जाने वाले स्थानों का प्रस्ताव संलग्न लाईन डायग्राम में दर्शाया जा रहा है।

Addl. Asst. Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


वन क्षेत्राधिकारी
कीर्तिनगर राजी
नरेन्द्र नगर वन प्रभाग

Photograph

कार्य का नाम: राज्य योजना के अन्तर्गत जलपट्ट रिहरी गडवाल के विधान सभा क्षेत्र देवप्रसाद के विकासखण्ड कीर्तिनगर के अन्तर्गत घाटी जगह रैताली नीचे मार्ग का नवनिर्माण कार्य। (MUCK JUMPING ZONE)




J.E.


Assistant Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar


Executive Engineer
Temp. Div. P.W.D.
Kirtinagar

अनापत्ति प्रमाणपत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा देवप्रायग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के थाती डागर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.050 कि०मी०) की हिलसाइड कटिंग से जो मलवा उत्सर्जित होगा, उसके निस्तारण हेतु मैं पूरनसिंह पूत्र श्री रामसिंह ग्राम रैताली तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल अपने ग्राम रैताली के निजी नाप सुदा खेतों में मलवा निस्तारण हेतु तैयार हूँ इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तथा मैं निस्तारित किये जाने वाले मलवे का भविष्य में कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं करूँगा। मेरी भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम स०	खातेदार का नाम	खाता स०	खसरा न०	कुल रकबा
01-	<u>पूरनसिंह डागरे पू०</u> <u>रामसिंह नि० ग०</u>	31	533 535	0.004 हे० 0.016 हे०
	योग		02 खेत	0.020 हे०

(हस्ताक्षर भूस्वामी)
भूस्वामी का नाम पूरनसिंह

J. S. Rana



भूस्वामित्व का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री पूरन सिंह पूत्र श्री
रामसिंह ग्राम रैतांसी तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल के नाम ग्राम..
रैतांसी तहसील कीर्तिनगर...मे स्थित निजी नाप भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खाता सं०	खसरा न०	कुल रकबा
01-	<u>पूरन सिंह आदि</u> <u>पु० राम सिंह</u> <u>नि० ग्रा०</u>	31	533 535	0.004 हे० 0.016 हे०
	योग		02 रकत	0.020 हे०

हस्ताक्षर 21-12-21
 राजस्व उपनिरीक्षक प्याली डांगर
 क्षेत्र रैतांसी
 तहसील कीर्तिनगर
 जिला टिहरी गढ़वाल



प्रधान-ग्राम पंचायत, रैतासी

विकासखण्ड कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल (उत्तराखण्ड)

दिनांक.....

मक डमिंग अन्यापति प्रमाण पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि डागर से रैतासी मैटर मर्ल
लम्बाई - 1.050 किलोमीटर है - चयनित मक डमिंग
प्लॉट रकत नम्बर 31/533, 535 व रकत नं 31/531, 532
पर किसी भी ग्रामवासियों की आपत्ति नहीं है;
तथा भविष्य में मक डमिंग प्लॉट का व्यापारिक
उपयोग नहीं किया जायेगा।

हस्ताक्षर ग्रामवासी - चन्दमणि

बलदेव सिंह राणा चन्दमणि

पूरा सिंह राणा PRRana

कामना सिंह राणा Sumit

उर्मिला देवी श्री/0000 रमेश प्रसाद उर्मिला

लाखीराम अहिर Sumit

सूर्य प्रसाद प्रसाद


सुमा देवी श्री/0000 चन्दमणि

मिलानन्द मिलानन्द

चन्दमणि



वस
अधिसासी अभियन्ता
अ० ख०, लो० नि० वि०
श्रीनगर मु० कीर्तिनगर



प्रारूप-48
समझौता ज्ञापन

परियोजना विवरण:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा देवप्रायग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के थाती डागर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.050 कि०मी०)

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में श्री पूरनसिंह पूत्र श्री
रायदेवग्राम.....थाती तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल भूमिधर
(जिसकी भूमि उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु उपयोग में लायी जानी है) के मध्य आज दिनांक 21/12/21
..... को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग का समस्त कार्य निष्पादित करेगी। तथा यह सहमति हो गयी है कि भूस्वामी की भूमि पर मार्ग का निर्माण/ मक डिस्पोजल ग्राम्य विकास हेतु किया जायेगा। तथा निस्तारित किये जाने वाले मलवे का भविष्य मे कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

2. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्रतिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लेखित दिनांक माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगायी हैं।

(हस्ताक्षर भूस्वामी)

भूस्वामी का नाम पूरनसिंह
श्री राम

अधिशासी अभियन्ता

अ०ख०लो०नि०वि०

कीर्तिनगर



अनापत्ति प्रमाणपत्र

राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा देवप्रायग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के थाती डागर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.050 कि०मी०) की हिलसाइड कटिंग से जो मलवा उत्सर्जित होगा, उसके निस्तारण हेतु मैं वलदेवसिंह पुत्र श्री रामसिंहग्राम रतासी तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल अपने ग्राम.....के निजी नाप सुदा खेतों में मलवा निस्तारण हेतु तैयार हूँ इसमें मुझे कोई भी आपत्ति नहीं है। तथा मैं निस्तारित किये जाने वाले मलवे का भविष्य मे कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं करूँगा। मेरी भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम स०	खातेदार का नाम	खाता स०	खसरा न०	कुल रकवा
01	<u>वलदेवसिंह भाद्वि</u> <u>पुत्र रामसिंह</u> <u>नि० ५१३</u>	31	531 532	0.004 0.005
	योग		02 खेत	0.009 हे०



(हस्ताक्षर भूस्वामी) वलदेवसिंह
भूस्वामी का नाम वलदेवसिंह

वलदेवसिंह

भूस्वामित्व का प्रमाणपत्र

प्रमाणित किया जाता है कि श्री बलदेव सिंह पुत्र श्री
राम सिंह ग्राम रैतासी तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल के नाम ग्राम..
रैतासी तहसील कीर्तिनगर...मे स्थित निजी नाप भूमि का विवरण निम्नानुसार है-

क्रम सं०	खातेदार का नाम	खाता सं०	खसरा न०	कुल रकबा
०१	<u>बलदेव सिंह आदि</u> <u>पु० राम सिंह</u> <u>निवासी</u>	<u>३१</u>	<u>५३१</u> <u>५३२</u>	<u>०.००४</u> <u>०.००५</u>
	योग		<u>०२ रकबा</u>	<u>०.००९ हे०</u>



निर्वाह २१-१२-२१
हस्ताक्षर
राजस्व उपनिरीक्षक व्यक्ति
क्षेत्र कीर्तिनगर
तहसील कीर्तिनगर
जिला टिहरी गढ़वाल

प्रारूप-48
समझौता ज्ञापन

परियोजना विवरण:- राज्य योजना के अन्तर्गत जनपद टिहरी गढ़वाल के विधान सभा देवप्रायग के विकासखण्ड कीर्तिनगर के थाती डागर मोटर मार्ग का नव निर्माण कार्य। (लम्बाई 1.050 कि०मी०)

यह समझौता ज्ञापन एक पक्षकार के रूप में अधिशासी अभियन्ता अस्थाई खण्ड लो०नि०वि० कीर्तिनगर (कार्यदायी संस्था)

तथा

दूसरे पक्षकार के रूप में श्री कनैव सिंह पूत्र श्री
राम सिंह ग्राम रैतासी तहसील कीर्तिनगर, जिला- टिहरी गढ़वाल भूमिधर
(जिसकी भूमि उपरोक्त मोटर मार्ग हेतु उपयोग में लायी जानी है) के मध्य आज दिनांक
21-12-21 को निष्पादित किया गया है।

1. यह सहमति हो गयी है कि कार्यदायी संस्था मार्ग का समस्त कार्य निष्पादित करेगी। तथा यह सहमति हो गयी है कि भूस्वामी की भूमि पर मार्ग का निर्माण/ मक डिस्पोजल ग्राम्य विकास हेतु किया जायेगा। तथा निस्तारित किये जाने वाले मलवे का भविष्य में कोई भी वाणिज्यिक उपयोग नहीं किया जायेगा।

2. यदि कोई विवाद होता है तो उसका निवारण तहसील स्तर से किया जायेगा। जिसका निर्णय दोनों पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

इसके साक्ष्य स्वरूप पक्षकारों ने अपने प्रतिकृत प्रतिनिधियों के माध्यम से इस विलेख पर ऊपर सर्वप्रथम उल्लेखित दिनांक माह और वर्ष के हस्ताक्षर किये और अपनी मोहर लगायी हैं।

(हस्ताक्षर भूस्वामी)

भूस्वामी का नाम कनैव सिंह

कनैव सिंह

अधिशासी अभियन्ता

अ०ख०लो०नि०वि०

कीर्तिनगर

